


ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2019				2020				2021				2022		
						Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3
1	Fremdriftsplan nye Fjelltun skole	800 dager	ma 27.05.19	fr 17.06.22																
2	Forprosjekt	23 ukr	ma 27.05.19	fr 01.11.19	7SA-20 dager															
3	Kontruksjon låst	0 dager	sø 01.09.19	sø 01.09.19																
4	Ferdigstilt innspill fra alle fag	0 dager	ti 01.10.19	ti 01.10.19																
5	Tegninger ferdig	0 dager	lø 19.10.19	lø 19.10.19																
6	Rapport inkl. kalkyle	0 dager	fr 01.11.19	fr 01.11.19																
7	Politisk behandling av forprosjektrapport	16 dager	on 20.11.19	on 11.12.19																
8	Detaljprosjektering	29 ukr	fr 13.12.19	to 02.07.20	7															
9	Anbudsgrunnlag grunnarbeider - tverrfagligkontroll	2 ukr	to 23.04.20	on 06.05.20																
10	Anbudsgrunnlag resterende entrepriser - tverrfagligkontroll	0,55 mndr	to 18.06.20	to 02.07.20																
11	Anbudsgrunnlag - Ferdig	0 dager	to 02.07.20	to 02.07.20	8;10															
12	Anskaffelse av entreprenører	6 mndr	to 07.05.20	on 21.10.20	9															
13	Riving av eksisterende bygg	2 mndr	ma 22.06.20	fr 14.08.20																
14	Byggeperiode	24 mndr	ma 17.08.20	fr 17.06.22	13															
15	Ferdigstillelse	0 dager	fr 17.06.22	fr 17.06.22	14															

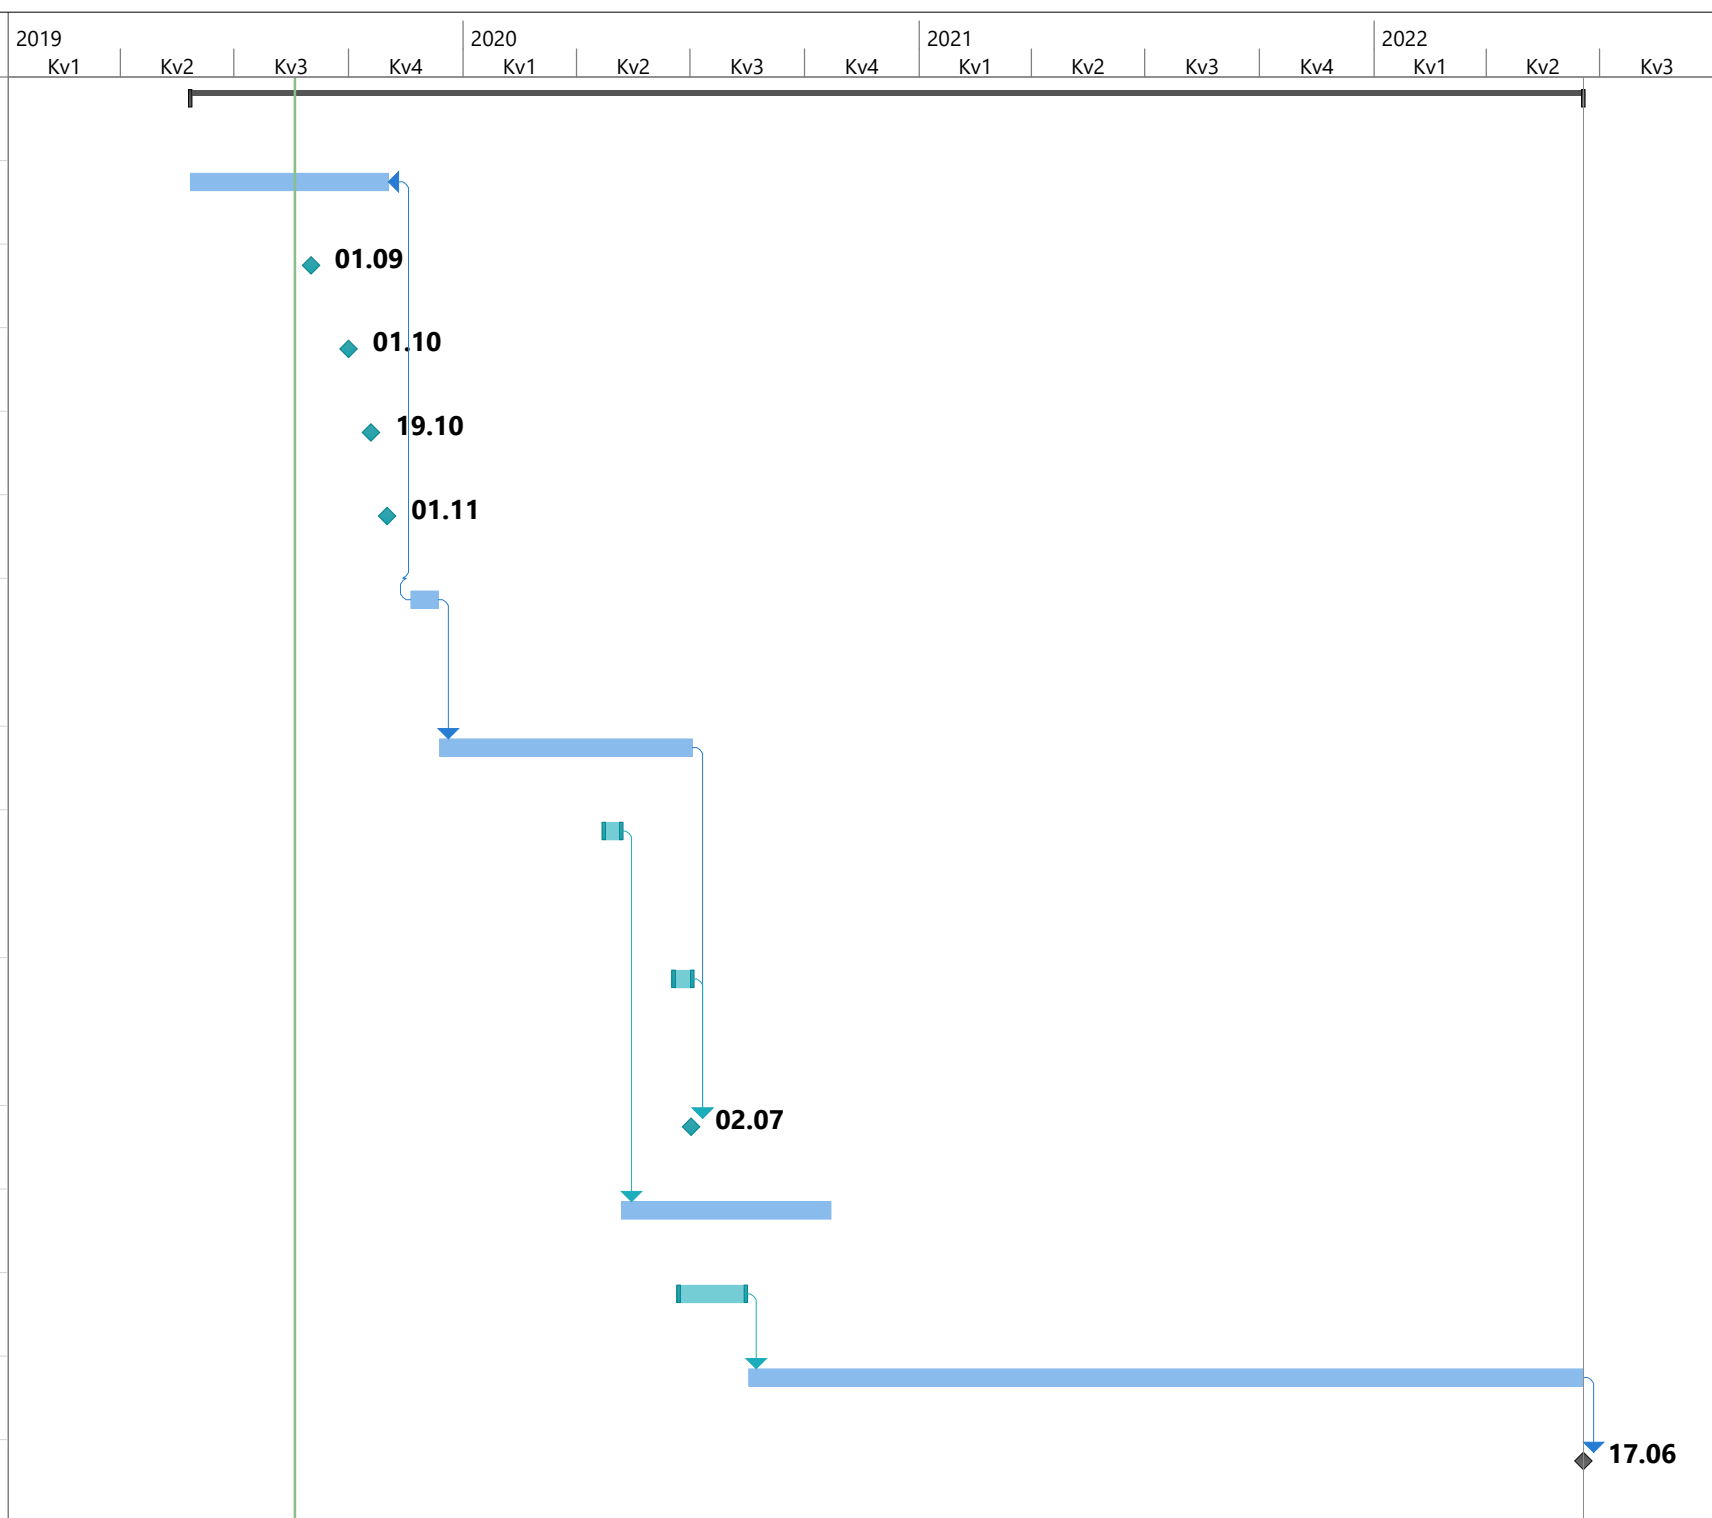

Prosjekt: Fremdriftsplan nye Fje
Dato: ma 19.08.19

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendrag		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
