


ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser	2022												Halvdel 1, 2023			Halvdel 2, 2023			Halvdel 1, 2024			Halvdel 2, 2024		
								s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a
1		Entrepri 2 Fv. 828 Herøysundbrua	443 dager	ma 17.10.22	fr 13.09.24																										
2		Anleggsvirksomhet	443 dager	ma 17.10.22	fr 13.09.24																										
3		Bygging av bru	360 dager	ma 17.10.22	fr 26.04.24																										
4		Oppstart	0 dager	ma 17.10.22	ma 17.10.22																										
5		Fase 1 av byggingen	220 dager	ma 17.10.22	on 27.09.23																										
6		Bygge landkar akse 1 og 4, fundamenter akse 2 og 3	200 dager	ma 17.10.22	on 30.08.23	4																									
7		Fabrikasjon av stålmoduler	220 dager	ma 17.10.22	on 27.09.23	4																									
8		Fase 2 Montasje stål	70 dager	to 28.09.23	to 11.01.24	5																									
9		Montasje stål i senter	30 dager	to 28.09.23	on 08.11.23	7																									
10		Montasje stål endespenn	20 dager	to 09.11.23	on 06.12.23	9																									
11		Montasje stål i midtspenn	20 dager	to 07.12.23	to 11.01.24	10																									
12		Fase 3 støy av brudekke	70 dager	fr 12.01.24	fr 26.04.24	8																									
13		Støy av brudekke	50 dager	fr 12.01.24	to 21.03.24	11																									
14		Kantbjelke, rekkverk	20 dager	fr 22.03.24	fr 26.04.24	13																									
15		Veganlegg syd	215 dager	ma 19.06.23	to 23.05.24																										
16		Bygge midlertidig vei	20 dager	ma 19.06.23	to 03.08.23	4;17SA																									
17		Omlagging VA	20 dager	to 03.08.23	to 31.08.23	18SA																									
18		Bygge vegfylling og midlertidige støttekonstruksjoner	60 dager	to 31.08.23	on 22.11.23	6																									
19		Bygge nytt kryss	10 dager	to 23.11.23	on 06.12.23	18																									
20		Veglys, rekkverk	15 dager	ma 29.04.24	to 23.05.24	19;14																									
21		Veganlegg nord	205 dager	to 03.08.23	to 06.06.24																										
22		Bygge ny midlertidig vei	20 dager	to 03.08.23	on 30.08.23	16																									
23		Omlagging VA	20 dager	to 31.08.23	on 27.09.23	22;17																									
24		Bygging av vegfylling mot brua	40 dager	to 23.11.23	to 25.01.24	23;6;18																									
25		Spleise ny og gammel veg	5 dager	fr 26.01.24	to 01.02.24	24																									
26		Veglys rekkverk	10 dager	fr 24.05.24	to 06.06.24	25;20																									
27		Asfaltarbeider	10 dager	fr 07.06.24	on 19.06.24	14;26																									
28		Sluttfrist	0 dager	fr 13.09.24	fr 13.09.24																										

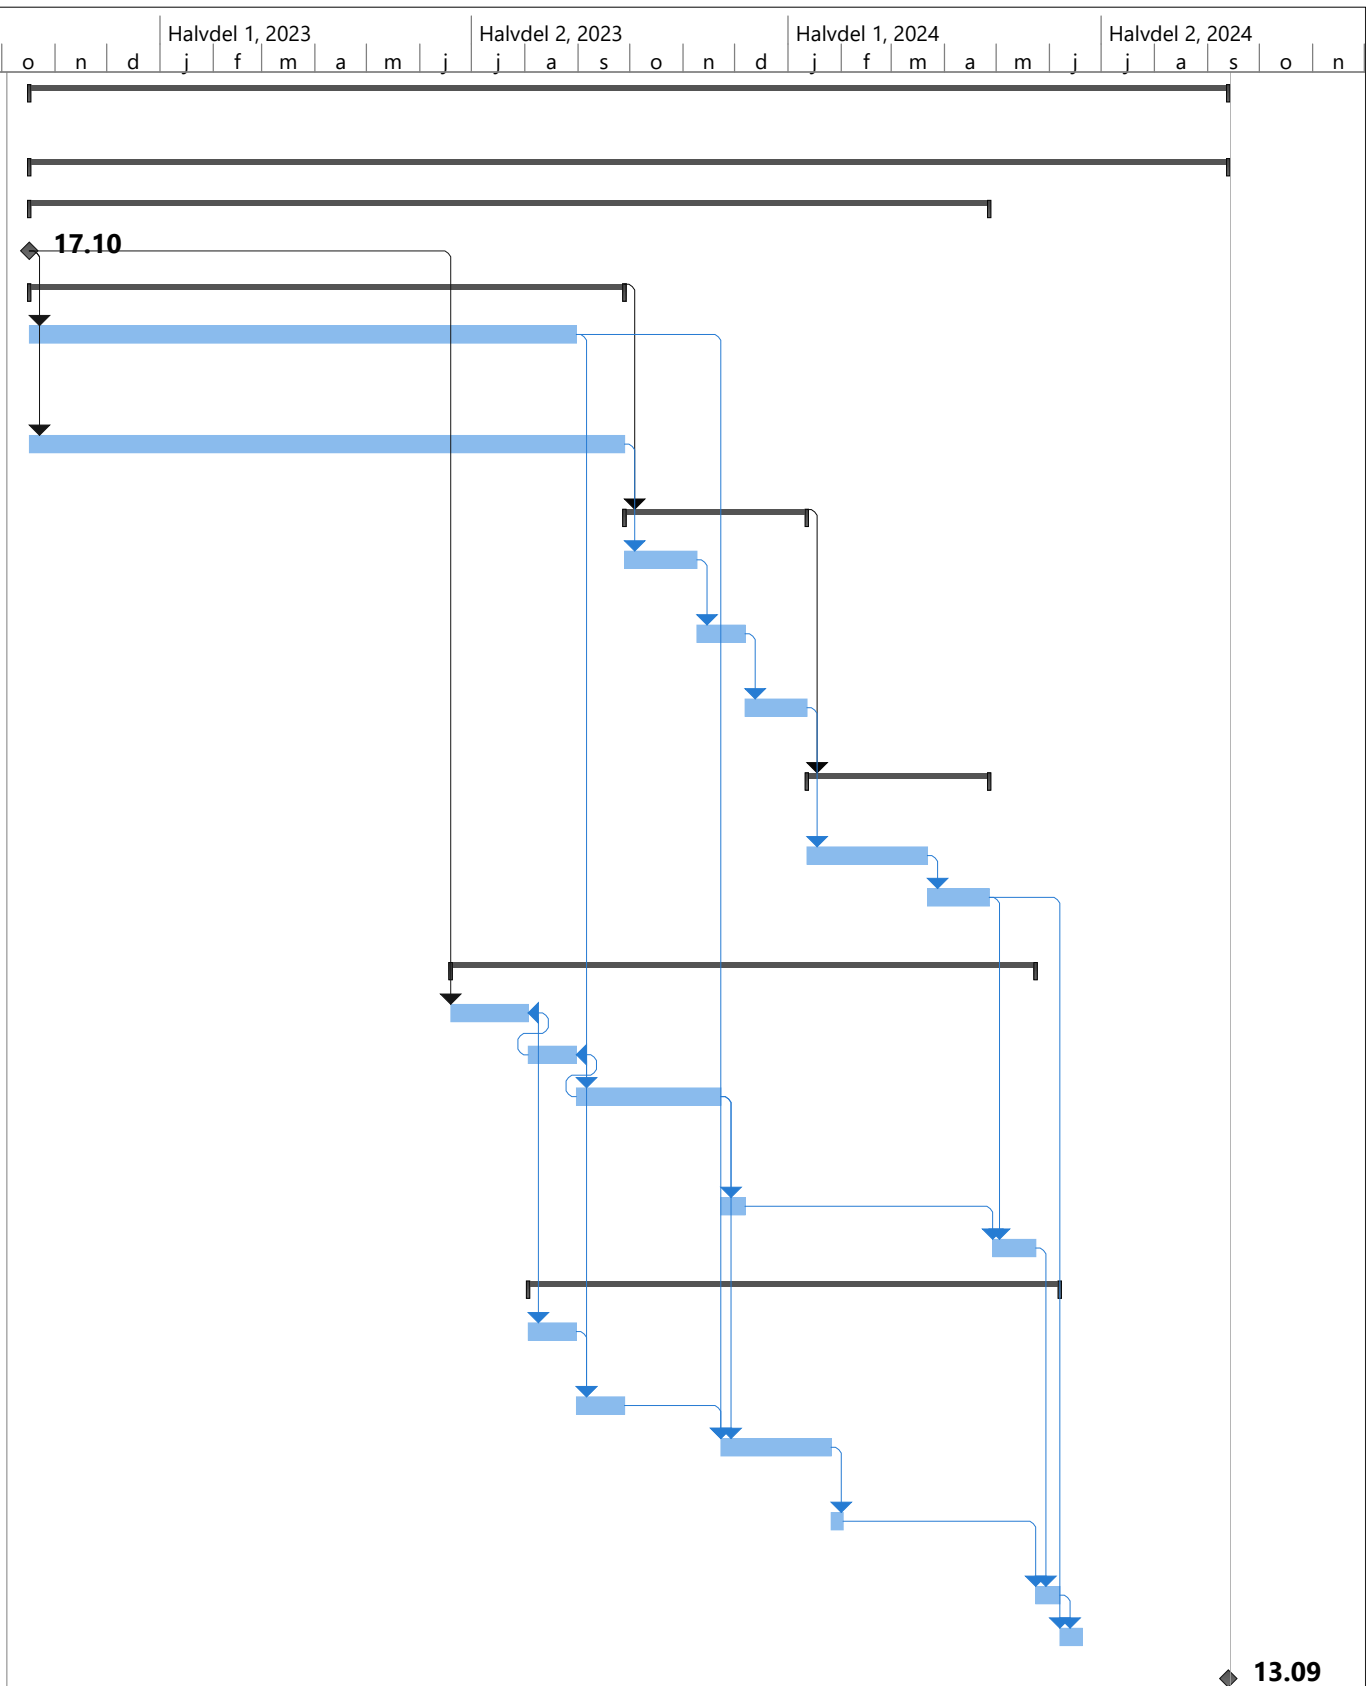

Prosjekt: Fv. 828 Veiledende fre
Dato: fr 06.05.22

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
