

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Timeline																												
						feb 24							mar 24							apr 24							mai 24							jun 24
						22	29	05	12	19	26	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24						
1		Byggefase	203,88 dager	fr 12.04.24	fr 07.03.25																													
2		Byggesøknad	19 dager	fr 12.04.24	fr 10.05.24																													
3		Nabovarsel	14 dager	fr 12.04.24	to 02.05.24																													
4		Søknad ett-trinn	5 dager	fr 03.05.24	fr 10.05.24																													
5		E21 Grunn, VA og bygg	172,88 dager	ma 29.04.24	fr 07.02.25																													
6		Kontrahering	32 dager	ma 29.04.24	ma 17.06.24																													
7		Rigg	9 dager	ma 01.07.24	fr 09.08.24																													
8		Elektroarbeider	131,88 dager	ma 01.07.24	fr 07.02.25																													
9		Byggestrøm	1,88 dager	ma 01.07.24	fr 05.07.24																													
10		Etablering av lys i tunnelen	10 dager	fr 05.07.24	on 14.08.24																													
11		El-installasjon i nisje for UV	30 dager	on 18.12.24	fr 07.02.25																													
12		Grunn- og VA-arbeider	27,13 dager	on 14.08.24	fr 20.09.24																													
13		Grunn- og VA-arbeid for kum, Provann, nisje,	25 dager	on 14.08.24	on 18.09.24																													
14		Grunn- og VA-arbeid for avløpsledning	10 dager	ma 09.09.24	fr 20.09.24																													
15		Betongarbeider	85 dager	on 18.09.24	fr 24.01.25																													
16		Ny kum	30 dager	on 18.09.24	on 30.10.24																													
17		Nisje for UV-anlegg	30 dager	on 30.10.24	on 11.12.24																													
18		Understøp for E61	5 dager	fr 17.01.25	fr 24.01.25																													
19		Montasjearbeider	32,88 dager	ma 04.11.24	on 18.12.24																													
20		Montasjearbeider telt /tunnel	5 dager	on 11.12.24	on 18.12.24																													
21		Montasje port mot nisje	14 dager	ma 04.11.24	to 21.11.24																													
22		Tilkomst for Maskin	0 dager	on 18.12.24	on 18.12.24																													


Prosjekt: Stendafjellet HB - UV-
Dato: ti 09.04.24

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

ID	Aktivitet	Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Timeline (feb 24, mar 24, apr 24, mai 24, jun 24)																											
23		E61 Maskin	184,88 dager	ma 13.05.24	fr 07.03.25																												
24		Kontrahering	60 dager	ma 13.05.24	on 04.09.24																												
25		Rigg	5 dager	on 18.12.24	fr 03.01.25																												
26		Installasjon maskin	20 dager	fr 03.01.25	fr 31.01.25																												
27		Test - igangkjøring	20 dager	fr 07.02.25	fr 07.03.25																												


Prosjekt: Stendafjellet HB - UV-
Dato: ti 09.04.24

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

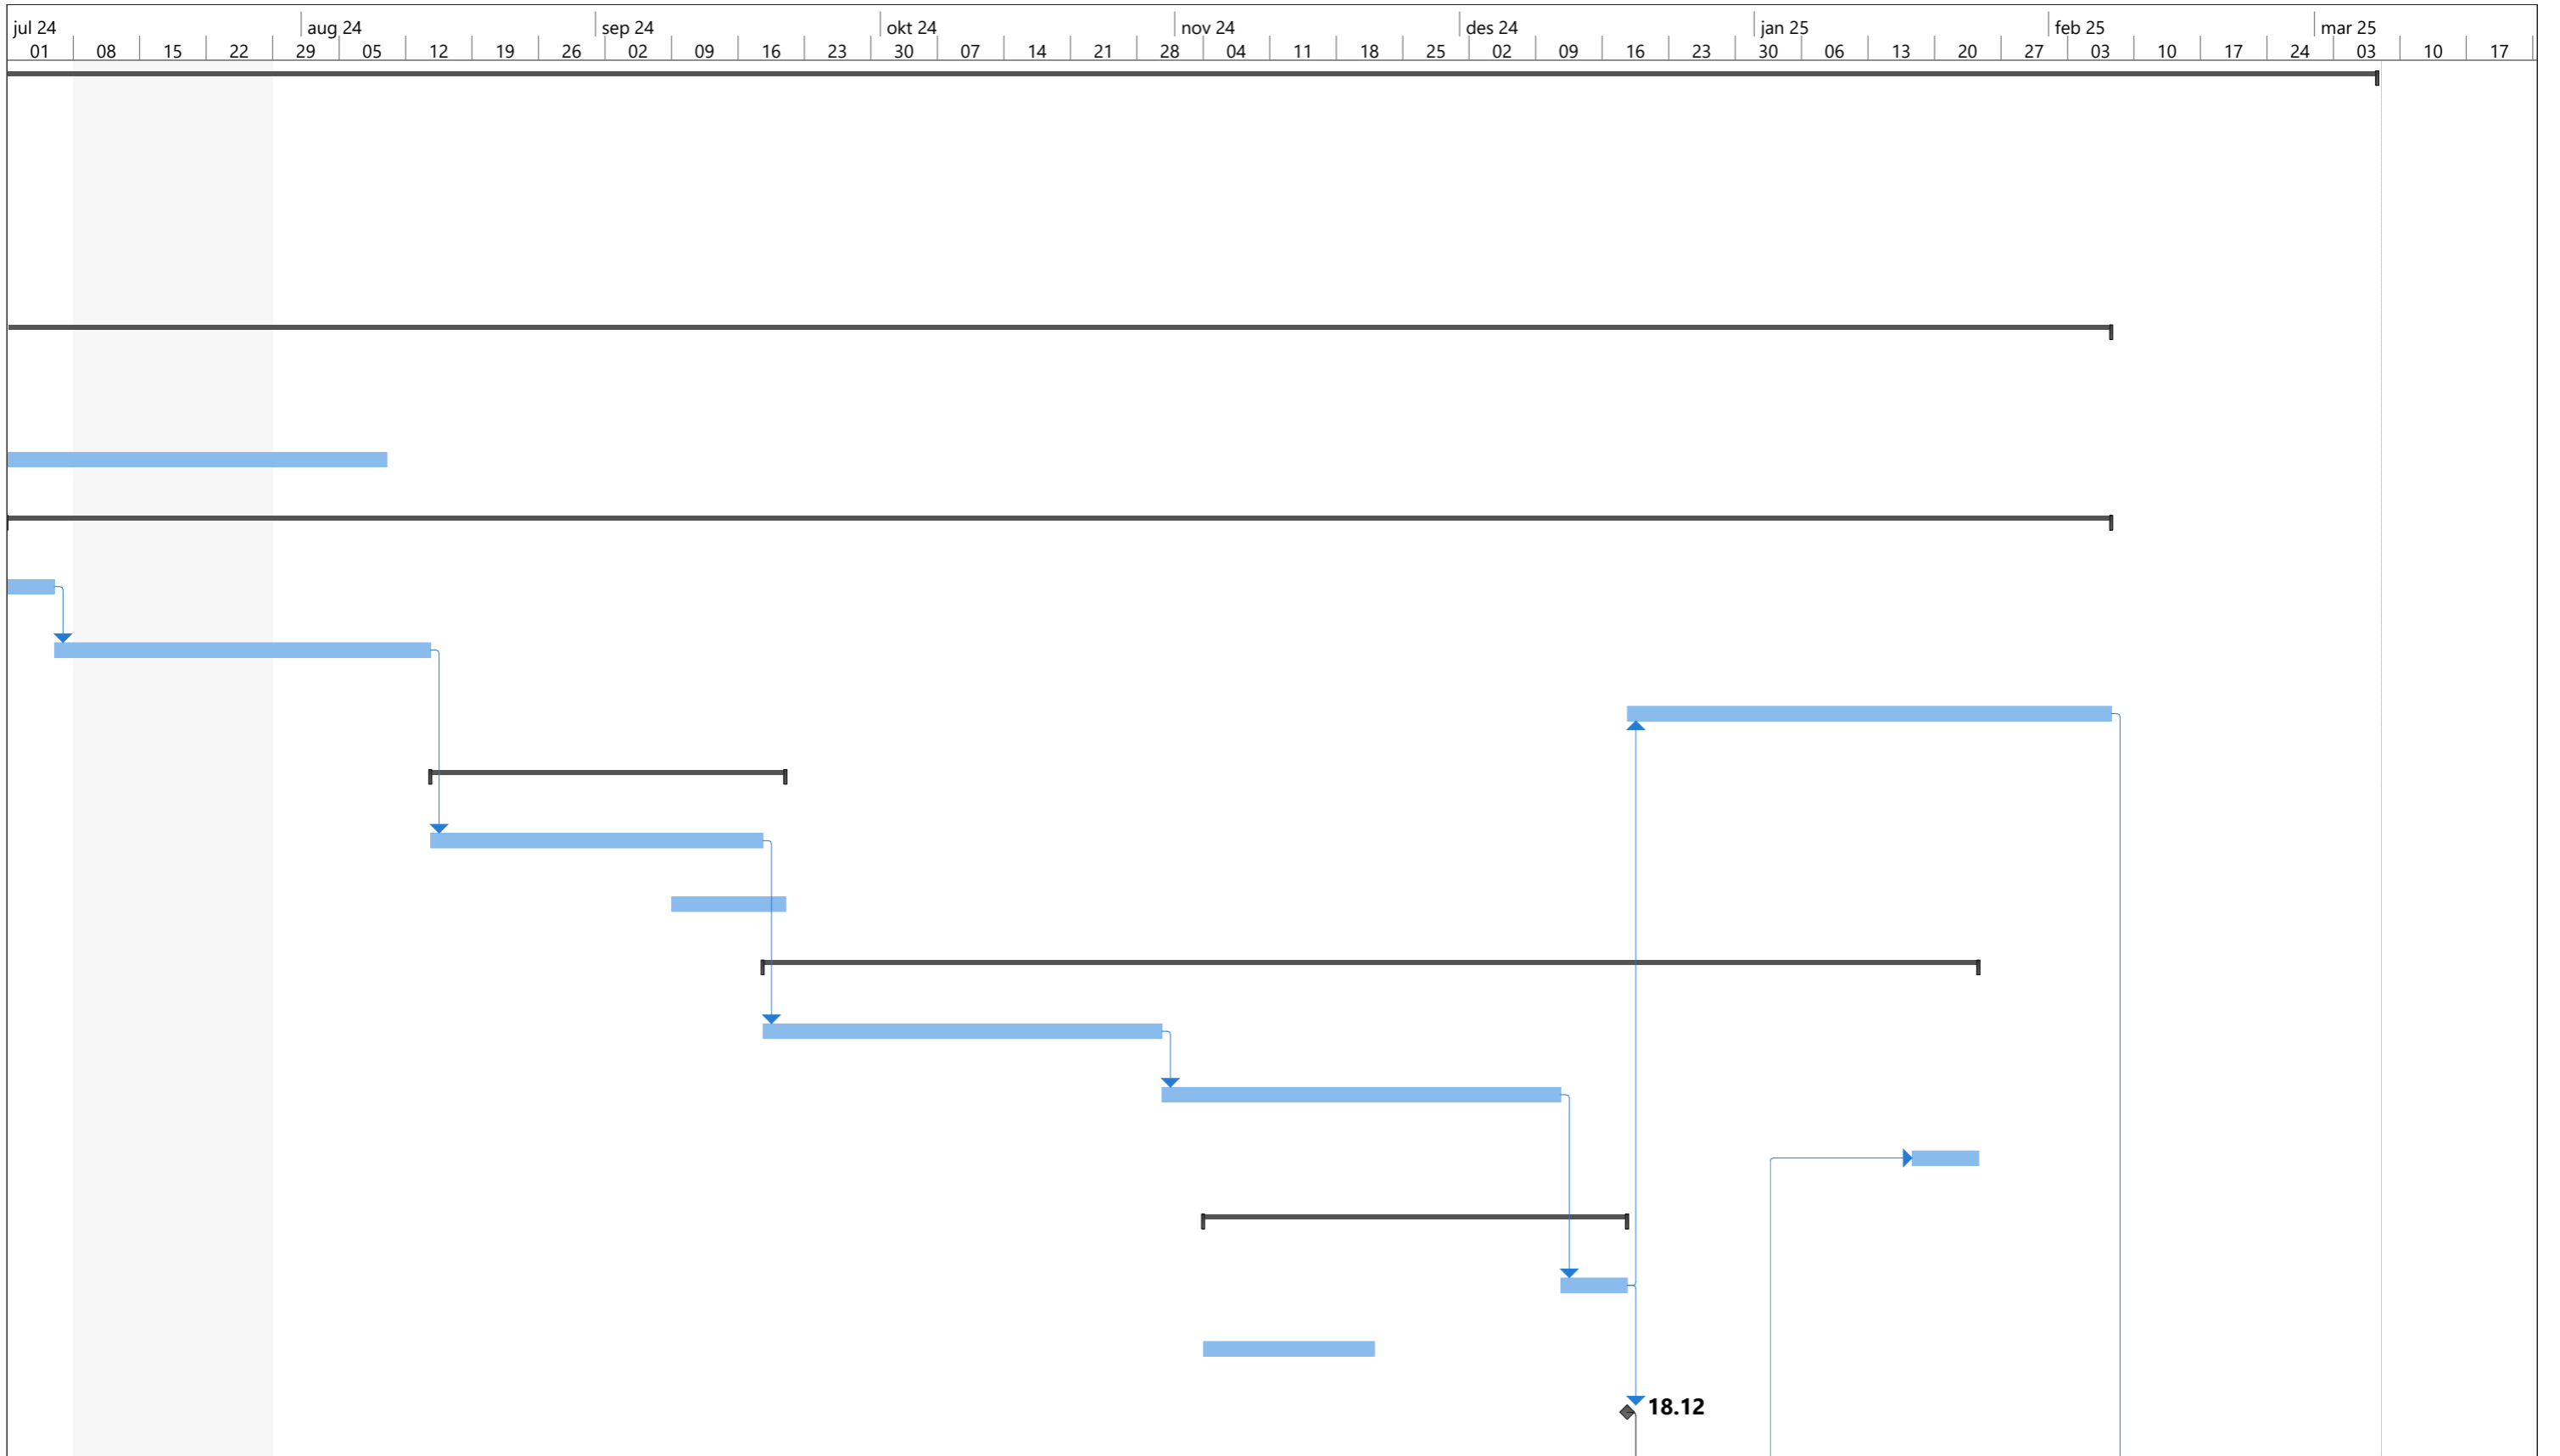

Prosjekt: Stendafjellet HB - UV-
Dato: ti 09.04.24

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendrag fremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

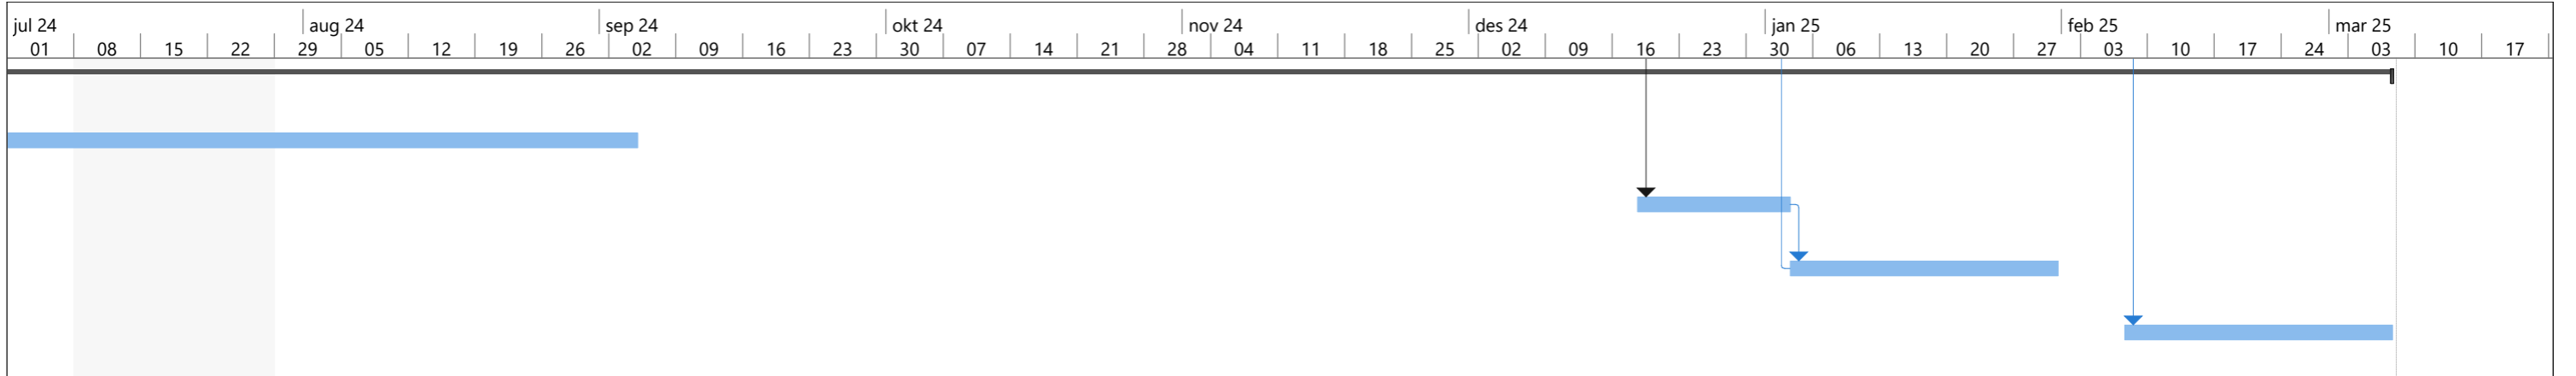

Prosjekt: Stendafjellet HB - UV-
Dato: ti 09.04.24

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
