


ID	Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	septem	oktober	novemb	desemb	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	sept
1	Utllysning i Merzell	66 dager	ma 28.06.21	ma 27.09.21																					
2	Evaluering av tilbud	28 dager	ti 28.09.21	to 04.11.21	1																				
3	Utsending av resultat av konkurransen	1 dag	fr 05.11.21	fr 05.11.21	2																				
4	Karensperiode	10 dager	ma 08.11.21	fr 19.11.21	3																				
5	Kontraktssignering	1 dag	ma 22.11.21	ma 22.11.21	4																				
6	Oppstartsmøte, samhandling og dokumentasjonsperiode	52 dager	ti 23.11.21	on 02.02.22	5																				
7	Byggestart	751 dager	to 03.02.22	to 19.12.24	6																				
19	Riving av eksisterende bru.	220 dager	fr 02.08.24	to 05.06.25																					
23	Nedrigging av anlegg	40 dager	fr 06.06.25	to 31.07.25	22																				



Prosjekt: Fremdriftsplan Bru En
Dato: to 24.06.21

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

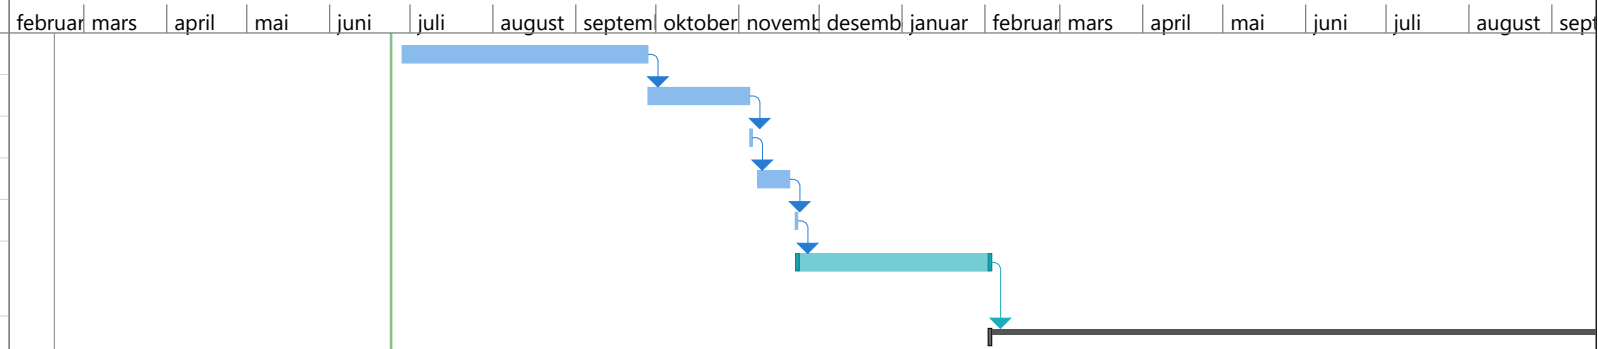

Prosjekt: Fremdriftsplan Bru En
Dato: to 24.06.21

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
