


ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Kv 4, 2022			Kv 1, 2023			Kv 2, 2023			Kv 3, 2023			Kv 4, 2023		
							okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
1		Konkurranse	69 dager	ti 20.12.22	ma 27.03.23																
2		Publisere konkurranse	0 dager	ti 20.12.22	ti 20.12.22																
3		Tilbudsfrist	0 dager	to 02.02.23	to 02.02.23																
4		Gjennomgang av inkomne tilbud	2 ukr	to 02.02.23	on 15.02.23	3															
5		Tildeling	0 dager	on 15.02.23	on 15.02.23	4															
6		Karenstid (10 dager)	8 dager	to 16.02.23	ma 27.02.23	5															
7		Kontraktsignering	5 dager	ti 28.02.23	ma 06.03.23	6															
8		Oppstartsmøte og samhandling	3 ukr	ti 07.03.23	ma 27.03.23	7															
9		ENT levert kvalitetsplan	2 ukr	ti 07.03.23	ma 20.03.23	7															
10		Arbeider på anlegg	169 dager	ma 20.03.23	fr 10.11.23																
11		Fysisk oppstart	0 dager	ma 20.03.23	ma 20.03.23	9															
12		Stans på anlegg i fellesferie	16 dager	ma 10.07.23	sø 30.07.23																
13		FDV-dokumentasjon levert BH	0 dager	fr 27.10.23	fr 27.10.23																
14		Ferdigstillelse	0 dager	fr 10.11.23	fr 10.11.23																

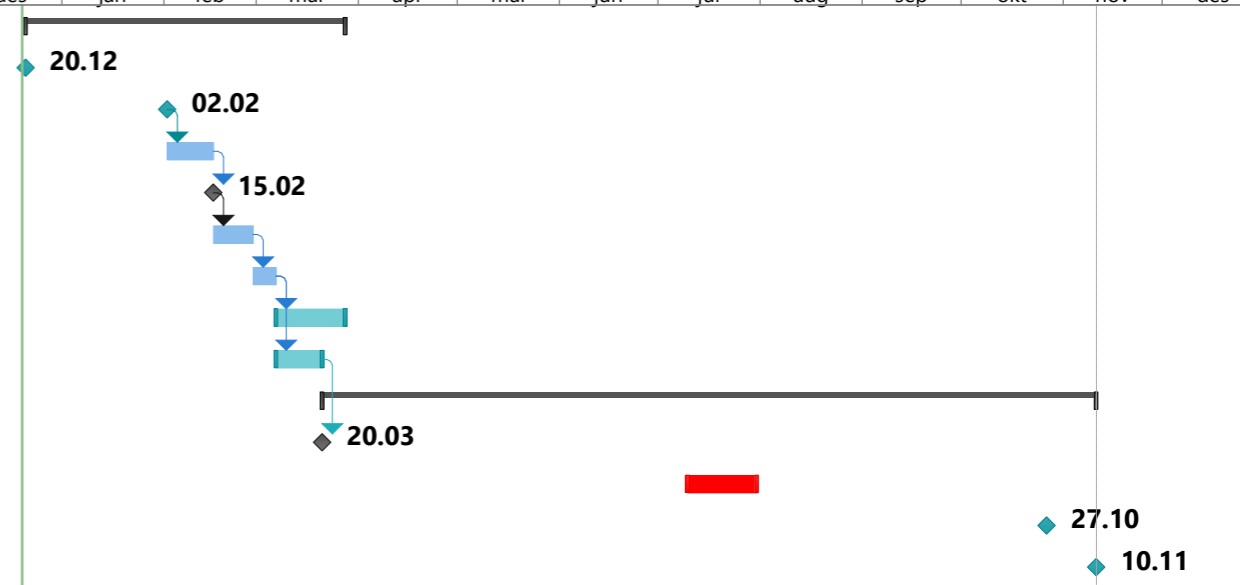

Prosjekt: Brønnøysund bru Dato: ti 20.12.22	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
