


Fase 1 - Operativ
1 : 100

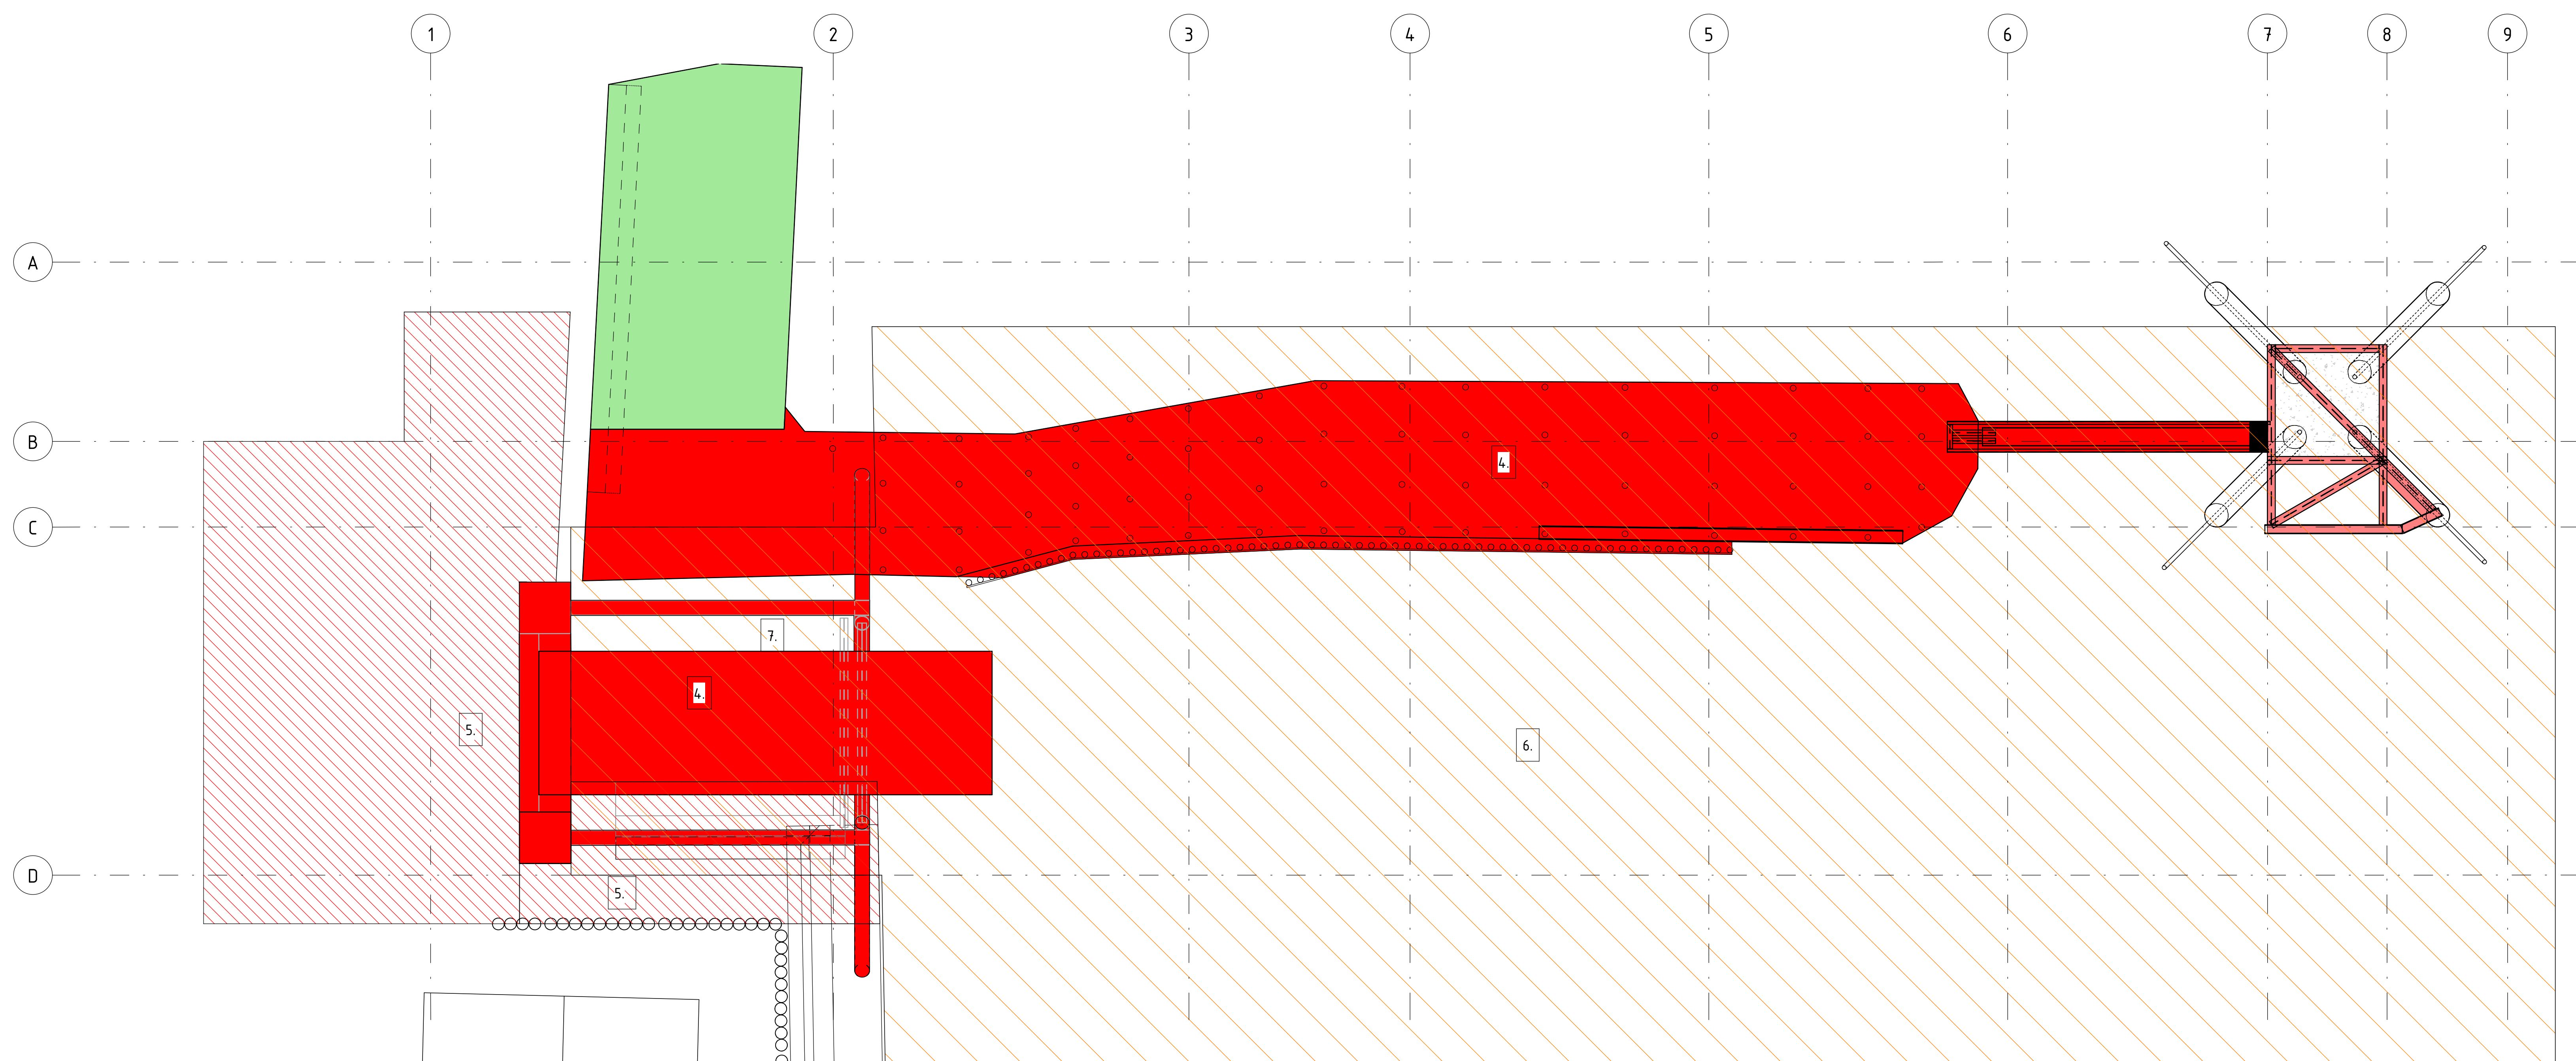

Fase 2 - del 1 - Stenøpeperiode
1 : 100

BEMERKNINGER:

- Gravearbeider
- Mudring
- Eksisterende kai
- Kaidel som flyttes
- Kaidel som rives
- Deler av konstruksjon rives
- Ny konstruksjon
- Rørspunt

Fase 1:

1. Opprigg byggeplass
2. Omlegging av eksisterende infrastruktur
3. Rørspunt sikring av eksisterende bygg

Fase 2 (stenøpeperiode):

4. Riving av tilleggskai
 5. Grunnarbeid graving
 6. Grunnarbeid mudring
 7. Grunnarbeid sprenging brubås
 8. Bru landkar
 9. Grunnarbeid brubås utgraving
 10. Tilleggskai peling
 11. Grunnarbeid brubås plasting
 12. Tilleggskai landkar
 13. Bru friksjonsplate/overgangsplåte
 14. Heisefårnramme peling
 15. Tilleggskai peling fender
 16. Grunnarbeid heisefårnramme
 17. Heisefårnramme montasje
 18. Armering og utstøping
 19. Tilleggskai montasje stål bjelke
 20. Tilleggskai montasje hovedbjelke
 21. Aggregathus montasje
 22. Bru montasje
 23. Montere fender
- Fase 3:
24. Tilleggskai montasje gangvei
 25. Nedrigg, rydding div
 26. Montering tilleggskai div

FASEPLANER KUN ORIENTERENDE. ENDELIG FREMDRIFTSPLAN
MÅ UTARBEIDES AV ENTREPRENØR.

Rev.	Utskrift	Rev. dato	Utskrift	Rev. dato
2	Endret fase	19.10.2022	NOBJA	NOBEL
1	Konkuransengrunnlag	19.10.2022	NOBJA	NOBEL
0	Revisjon		Utskrift	Rev. dato
Møre og Romsdal fylkeskommune Sandnesambandet Larsnes ferjekai Faseplan - Fase 1 og 2		Tegningsdato Beskrivelse Prosjekt for Prosjekt nr. Prosjekt nummer Prosjekt fase Prosjekt fase Prosjekt fase Prosjekt fase Prosjekt fase	19.10.2022 HSEK HSEK 10229601 15-0656 15-0656	Eufref89NTH5N2000 K03 2
Utskrift av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma	Tegningsnummer /
NOBJA	NOBEL	NOBEL	10229601	NOBJA
