


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	2024	Qtr 2, 2024	Qtr 3, 2024	Qtr 4, 2024	Qtr 1, 2025	Qtr 2, 2025	Qtr 3, 2025	Qtr 4, 2025	Qtr 1, 2026	Qtr 2, 2026	Qtr 3, 2026	Qtr 4, 2026	
							Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1																			
2																			
135																			
147		<b>FASE 2</b>	60 days?	Wed 04.12.24	Tue 11.03.25														
148		Oppstart fase 2	0 days	Wed 04.12.24	Wed 04.12.24	General Entreprenør													
149		Fase 2A	47 days?	Thu 05.12.24	Fri 21.02.25	General Entreprenør													
150		Ventilasjonsrom på tak	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
151		CH1952 - Teknisk rom til Lab 3	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
152		CHU255A - Medisinrom	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
153		CHU206 - Lager urent	10 days	Thu 05.12.24	Wed 18.12.24	General Entreprenør													
154		CHU209C - Lunge	10 days	Thu 05.12.24	Wed 18.12.24	General Entreprenør													
155		CHU209A - H.Vaktrom Lunge	10 days	Thu 05.12.24	Wed 18.12.24	General Entreprenør													
156		CHU211 - Enhetsleders kontor	10 days	Thu 05.12.24	Wed 18.12.24	General Entreprenør													
157		CHU212B - WC/DUSJ	10 days	Thu 05.12.24	Wed 18.12.24	General Entreprenør													
158		CH1207 - OBSrom 1	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
159		CH1208B - Disponibelt	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
160		CH1208A - OBS rom 2	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
161		CH1209 - Granskning	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
162		CH1821 - Korridor	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
163		CH1822A - Korridor	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
164		CH2210A - Vaktrom	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
165		CH2212 - Vaktrom	40 days	Thu 05.12.24	Wed 12.02.25	General Entreprenør													
166		Ferdigbefaring fase 2, uten ventilasjonsrom	1 day	Thu 13.02.25	Thu 13.02.25	General Entreprenør													
167		Retting av feil og mangler	5 days	Fri 14.02.25	Thu 20.02.25	General Entreprenør													
168		Komplett overtakelse av Fase 2A, utenom ventilasjonsrom på tak.	1 day?	Fri 21.02.25	Fri 21.02.25	General Entreprenør													
169		Fase 2D	12 days	Mon 24.02.25	Tue 11.03.25														
170		Flytting av møbler og personell	7 days	Mon 24.02.25	Tue 04.03.25	SSHf													
171		Flytting av tekniske installasjoner for LAB 2	5 days	Wed 05.03.25	Tue 11.03.25	Philips													
172		Flytting av elektrisk tavle for Lab 2	5 days	Wed 05.03.25	Tue 11.03.25	SSHf													
173		Etablering av kjøling i midlertidig teknisk i LAB 2	5 days	Wed 05.03.25	Tue 11.03.25	SSHf													
174		Nisje for Lab 1, i dør inn til Lab 2 ( Må ha rom nr)	5 days	Wed 05.03.25	Tue 11.03.25	General Entreprenør													
175																			
176		<b>FASE 3</b>	112 days?	Fri 21.02.25	Fri 01.08.25														
177		Fase 3A	86 days	Fri 21.02.25	Thu 26.06.25														
178		Ventilasjonsrom på tak	80 days	Fri 21.02.25	Wed 18.06.25	General Entreprenør													
179		CH1210 - Kard.Lab3	64 days	Mon 24.03.25	Wed 25.06.25	General Entreprenør													
180		CH1211 - Felles sjalterom del 1, akse 7 og 8.	64 days	Mon 24.03.25	Wed 25.06.25	General Entreprenør													




Project: PCI-Lab06  
Date: Fri 04.10.24

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

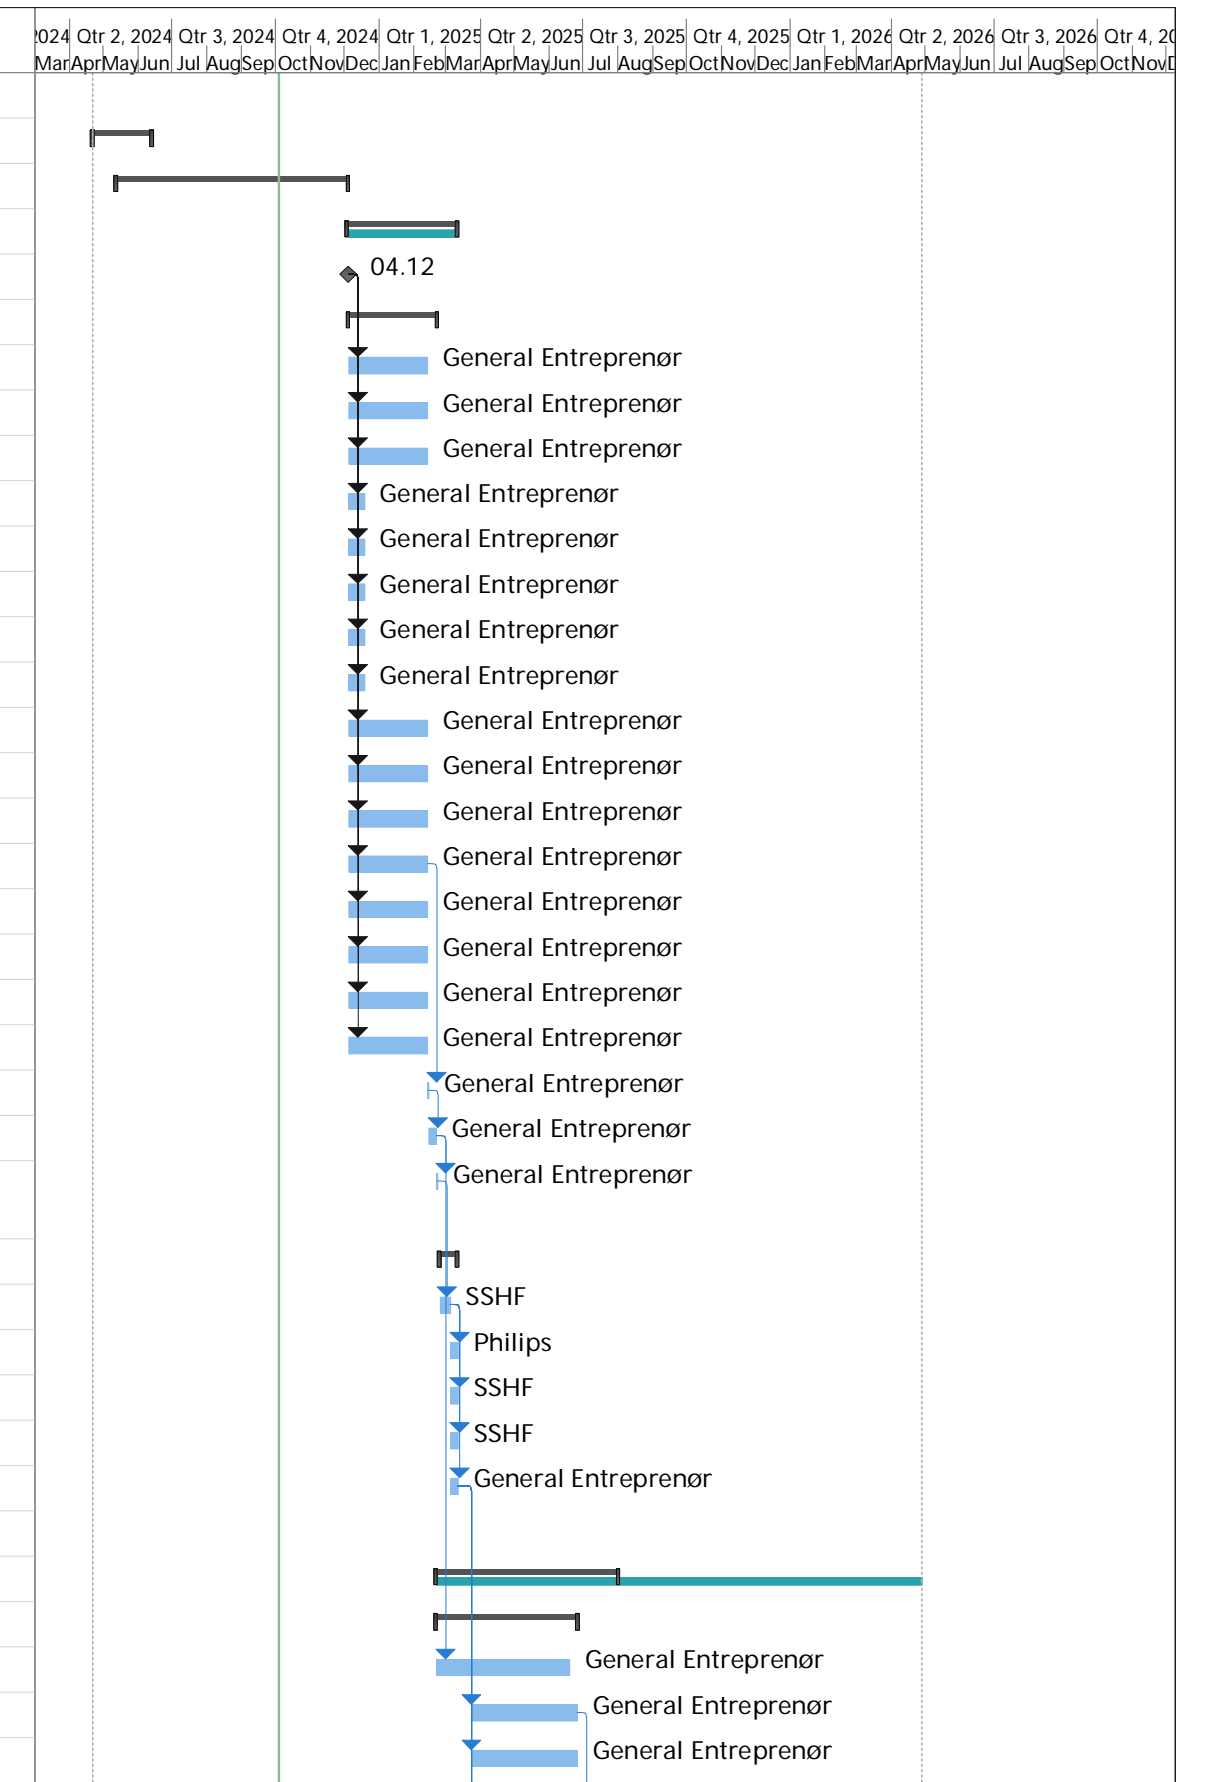

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	2024	Qtr 2, 2024	Qtr 3, 2024	Qtr 4, 2024	Qtr 1, 2025	Qtr 2, 2025	Qtr 3, 2025	Qtr 4, 2025	Qtr 1, 2026	Qtr 2, 2026	Qtr 3, 2026	Qtr 4, 2026	
							Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
218		CH1953 - Fjerning av UPS og kursopplegg I teknisk rom Lab 2	10 days	Fri 19.09.25	Thu 02.10.25	Nødstrøm													
219		CH1953 - Fjerning av tavler for Lab 2	10 days	Fri 19.09.25	Thu 02.10.25	Nødstrøm													
220		CH1953 - Teknisk rom Lab 2, bygningsmessig inkl.kjøling	20 days	Fri 03.10.25	Thu 30.10.25	General Entreprenør													
221		CH1212 - Kard,Lab 2 - Demontering	10 days	Fri 19.09.25	Thu 02.10.25	Philips													
222		Flytting av teknisk maskinpark Lab 2 til CH1953	10 days	Fri 31.10.25	Thu 13.11.25	Philips													
223		Fase 4B	10 days?	Mon 06.10.25	Fri 17.10.25														
224		CH1211 - Sjalterom del 2	10 days	Fri 14.11.25	Thu 27.11.25	General Entreprenør													
225		CH1212 - Kard.Lab2	75 days	Fri 14.11.25	Thu 26.02.26	General Entreprenør													
226		CH1823 - Korridor del 2, akse 2-6	10 days	Fri 14.11.25	Thu 27.11.25	General Entreprenør													
227		CHU223 - Lunge	5 days	Fri 14.11.25	Thu 20.11.25	General Entreprenør													
228		CHU224 - Lunge	10 days	Fri 21.11.25	Thu 04.12.25	General Entreprenør													
229		CHU226B - WC	5 days	Fri 05.12.25	Thu 11.12.25	General Entreprenør													
230		CHU238 - WC	5 days	Fri 12.12.25	Thu 18.12.25	General Entreprenør													
231		Delovertakelse Fase 4B	1 day	Fri 27.02.26	Fri 27.02.26	SSHF													
232		Fase 4C	38 days?	Mon 01.12.25	Wed 21.01.26														
233		CH4224 - Sengerom	20 days	Mon 01.12.25	Fri 26.12.25	General Entreprenør													
234		CH3224 - Sengerom Gastro	20 days	Mon 01.12.25	Fri 26.12.25	General Entreprenør													
235		CH2224 - Sengerom	38 days	Mon 01.12.25	Wed 21.01.26	General Entreprenør													
236		Ventilasjonsarbeider pipe 3	30 days	Mon 01.12.25	Fri 09.01.26	General Entreprenør													
237		Delovertakelse CH4224 og CH3224	1 day?	Mon 29.12.25	Mon 29.12.25	General Entreprenør													
238		Delovertakelse CH2224	0 days	Wed 21.01.26	Wed 21.01.26	General Entreprenør													
239		Fase 4D	55 days?	Wed 07.01.26	Tue 24.03.26														
240		CH4225 - Pasientrom	20 days	Tue 10.02.26	Mon 09.03.26	General Entreprenør													
241		CH3225 - Sengerom Gastro	20 days	Tue 10.02.26	Mon 09.03.26	General Entreprenør													
242		CH2225 - Sengerom	40 days	Tue 10.02.26	Mon 06.04.26	General Entreprenør													
243		CH2226A - Sluse	40 days	Tue 10.02.26	Mon 06.04.26	General Entreprenør													
244		CH2226B - WC/Dusj	40 days	Tue 10.02.26	Mon 06.04.26	General Entreprenør													
245		CH2226C - Pasientrom og bad	40 days	Tue 10.02.26	Mon 06.04.26	General Entreprenør													
246		Ventilasjonsarbeider pipe 4	20 days	Tue 10.02.26	Mon 09.03.26	General Entreprenør													
247		Delovertakelse CH4225 og CH3225	1 day	Tue 10.03.26	Tue 10.03.26	General Entreprenør													
248		Delovertakelse CH2225 og CH2226	1 day?	Wed 07.01.26	Wed 07.01.26	General Entreprenør													
249		Fase 4E	35 days	Tue 10.03.26	Mon 27.04.26														
250		Montering inventar	10 days	Tue 10.03.26	Mon 23.03.26	SSHF													
251		Innregulering av ventilasjonsagregat 1.	10 days	Tue 24.03.26	Mon 06.04.26	General Entreprenør													
252		Montering av MTU	10 days	Tue 24.03.26	Mon 06.04.26	Philips													
253		Prøvedrift Lab 2	15 days	Tue 07.04.26	Mon 27.04.26	SSA													

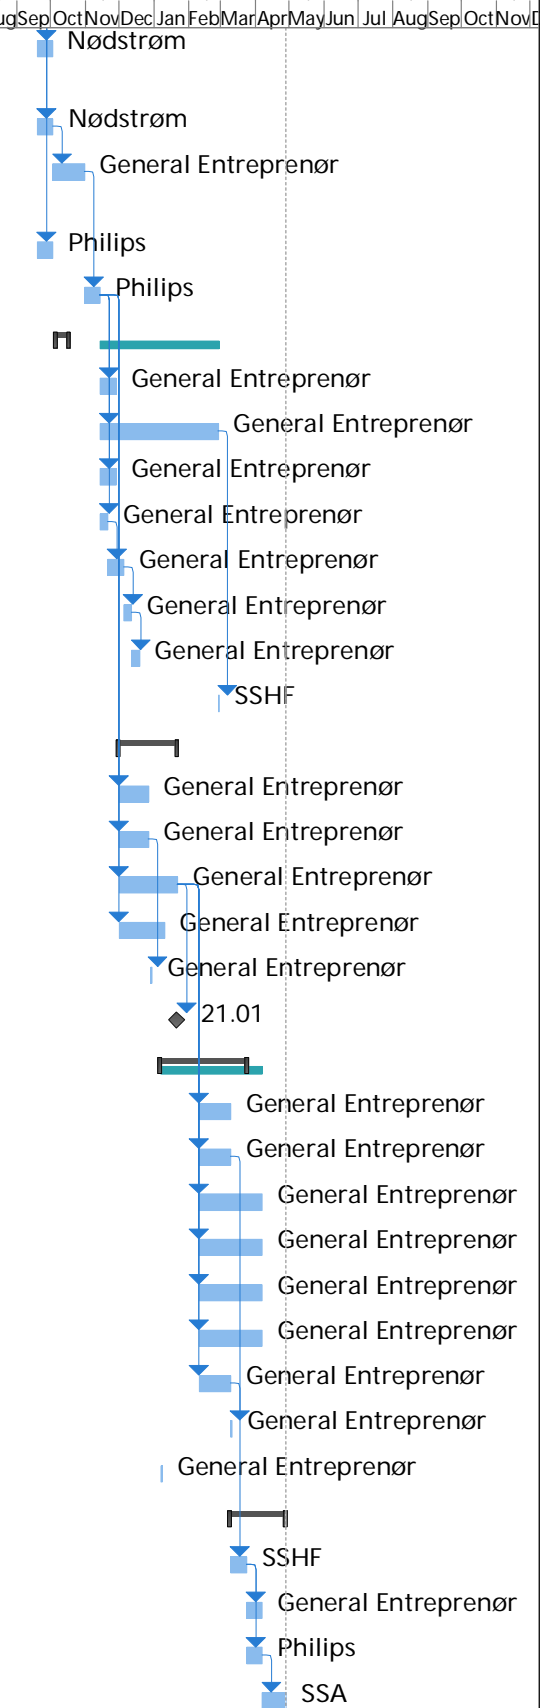

Project: PCI-Lab06  
Date: Fri 04.10.24

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			
