

SHA-PLAN

ihht. forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, Byggherreforskriften (BHF) og Arbeidsmiljøvernloven (AML).

PROSJEKT: 63416 Nytt Helseinnovasjonssenter	BYGGEPLASSENS ADRESSE: 1002 Øvre Eng gt 8b 6509 Kristiansund
TILTAKSHAVER, NAVN OG ADRESSE: Kristiansund kommune Postboks 178 6501 Kristiansund	PROSJEKTLEDER, NAVN OG ADRESSE: Kjell Gunnar Gjersvold Kristiansund kommune v/ Eiendomsdrift Vågev. 4, 6509 Kristiansund
HOVEDBEDRIFT (HB) ER ANSVARLIG SAMORDNER I HENHOLD TIL FLERE ARBEIDSGIVERE PÅ SAMME ARBEIDSPASS:	KOORDINATOR FOR ARBEIDSMILJØSPØRSMÅL UNDER GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET:

PROSJEKTETS ART

Kristiansund kommune renoverer Øvre Eng gt. 8b til nye kontorer for Helseinnovasjonssenteret Arealet som berøres er på ca. 500 m2 gulv.

De bygningsmessige arbeidene består bl.a. av:

- Nytt ventilasjonsanlegg
- Nye dører/ kontorvegger
- Nye vinduer.
- Nytt elektriks anlegg
- Maler og gulvbeleggarbeid
- Takarbeid
- Gravearbeid

SHA

- Når flere entreprenører arbeider på samme prosjekt skal PL avgjøre hvem som skal være Koordinator for utførelse (KU). Kopi av kontrakt henges opp på HMS tavle.
- Entreprenør/KU plikter å gjennomgå Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) planen med alle ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte før arbeidet påbegynnes
- Ved innvendige arbeider vurderes tiltak for avgrensning ut fra hva som skal utføres.
- Adgangsregistrering elektronisk. Fra 1. juli 2017 er det krav om daglig elektronisk adgangsregistrering og skal vise de som er på stedet i løpet av dagen.
- Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal sikker jobb analyse (SJA) gjennomføres av entreprenør før arbeidet starter og dokumenteres med tiltak
- Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra stillas eller lift. Ved bruk av stillas skal dette være montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Ved varme arbeider skal brannslukningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet

- På uteområdet og tilstøtende bygninger er det full drift og dette må hensyntas og det må gjøres avtale om riggplass.

Det skal ikke være mulig at uvedkommende ved en feiltakelse tar seg inn i arealet hvor det foregår bygningsmessige arbeider.

Ved støvende arbeider må tiltak iverksettes som hindrer støvspreddning

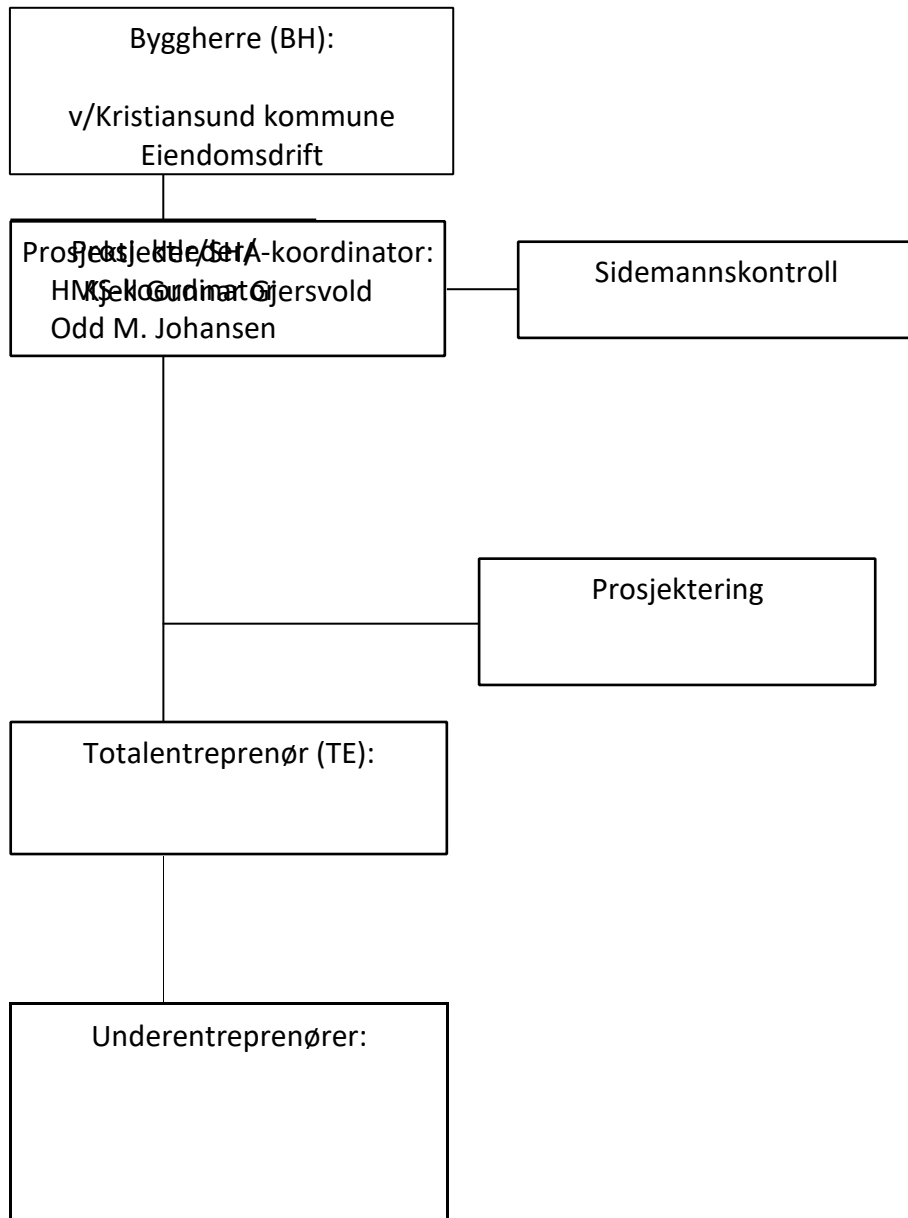
- Arbeidsområdet skal sikres mot uvedkommende
- Arbeidsområdet skal holdes ryddig. Avfall fjernes av håndverker
- Bilkjøring/rygging/parkering. Anleggsarbeid på et område som er i drift er risikofylt. Dette må hensyntas i planlegging og gjennomføring.
- Alle som opererer mekanisk løfteutstyr (lift, etc.) skal kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse for bruk av dette
-
- Vernerunder går hver 14. dag der hvor arbeidet varer lenger enn 14 dager. Disse dokumenteres og forevises på forespørsel.
-
- Varslingsplan for entreprenører skal være tilstede på byggeplassen
- Verktøy/materiell skal til enhver tid holdes under oppsyn eller være innelåst
-
- Før byggestart skal det utarbeides beredskapsplan, handlingsplan ved ulykke, sørge for førstehjelpsutstyr på plassen, sørge for brannslukningsutstyr på plassen, instruks for varslingsrutiner

F.02.7

□

Avvik: Alle på byggeplassen har et ansvar for å rapportere avvik fra denne plan. Avvik skal rapporteres til entreprenør/KU som igjen varsler byggherre og de entreprenørene som påvirkes av avviket. Melding og oppfølging av avvik skal dokumenteres skriftlig, herunder hvem som har ansvar for oppfølging og hvilke tiltak som skal gjennomføres.

□ Vernerunder gjennomføres av TE med representant fra BH tilstede ved forespørsel.

ORGANISASJONSKART

Denne SHA planen fratar ikke entreprenør/KU å utarbeide egne rutiner der entreprenør/KU finner at denne planen ikke er tilstrekkelig. I tillegg til ovennevnte punkter har entreprenør/KU ansvar for at alle relevante lover og forskrifter følges. Viser for øvrig også til konkurransegrunnlag/beskrivelser og dokumentasjon tilgjengelig på Mercell.

DATO:
21.03.2018

SHA-PLAN ER UTARBEIDET AV:
Kjell Gunnar Gjersvold, Eiendomsdrift

SIGN.:
