


ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Navn på ressurser	Foregående aktiviteter	Kv 1, 2021												Kv 2, 2021												Kv 3, 2021												Kv 4, 2021											
								jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt								
1		Ladestruktur Helgeland																																																					
2																																																							
3																																																							
4																																																							
5		Avtale med nettselskaper	2 ukr	ma 15.02.21	fr 26.02.21																																																		
6	✓	Ferdig tegning bygg	0 dager	fr 12.02.21	fr 12.02.21																																																		
7		Ferdig tegning fundament	0 ukr	to 04.03.21	to 04.03.21																																																		
8	✓	Detaljplan for hver lokasjon	0 dager	ma 08.03.21	ma 08.03.21																																																		
9		Valg av glassleverandør	0 ukr	fr 12.03.21	fr 12.03.21																																																		
10		Valg av byggleverandør	0 ukr	fr 19.03.21	fr 19.03.21																																																		
11		Valg av leverandør fundament	0 ukr	fr 19.03.21	fr 19.03.21																																																		
12		Avtale med lokasjonseiere	0 ukr	fr 26.03.21	fr 26.03.21																																																		
13		Valg av Entreprenør for oppsett av bygg	0 dager	on 31.03.21	on 31.03.21																																																		
14		Valg av entreprenør for grunnarbeid	0 dager	on 31.03.21	on 31.03.21																																																		
15		Valg av entreprenør for idriftsettelse	0 dager	on 31.03.21	on 31.03.21																																																		
16		Bygging av ladestasjoner	130 dager	ma 03.05.21	fr 29.10.21																																																		
17		Byporten Mo	2 ukr	ma 03.05.21	fr 14.05.21																																																		
18		Handelsparken Mosjøen	2 ukr	ti 18.05.21	ma 31.05.21																																																		
19		Utskarpen	1 uk	ti 25.05.21	ma 31.05.21																																																		
20		Foldereid	1 uk	ma 31.05.21	fr 04.06.21																																																		
21		Ørnes	2 ukr	ma 07.06.21	fr 18.06.21																																																		
22		Saltstraumen	1 uk	ma 21.06.21	fr 25.06.21																																																		
23		Halsa	1 uk	ma 28.06.21	fr 02.07.21																																																		
24		Umbukta	1 uk	ma 23.08.21	fr 27.08.21																																																		
25		Salhusmarka	1 uk	ma 30.08.21	fr 03.09.21																																																		
26		Prosjekt ferdig	0 dager	fr 29.10.21	fr 29.10.21																																																		

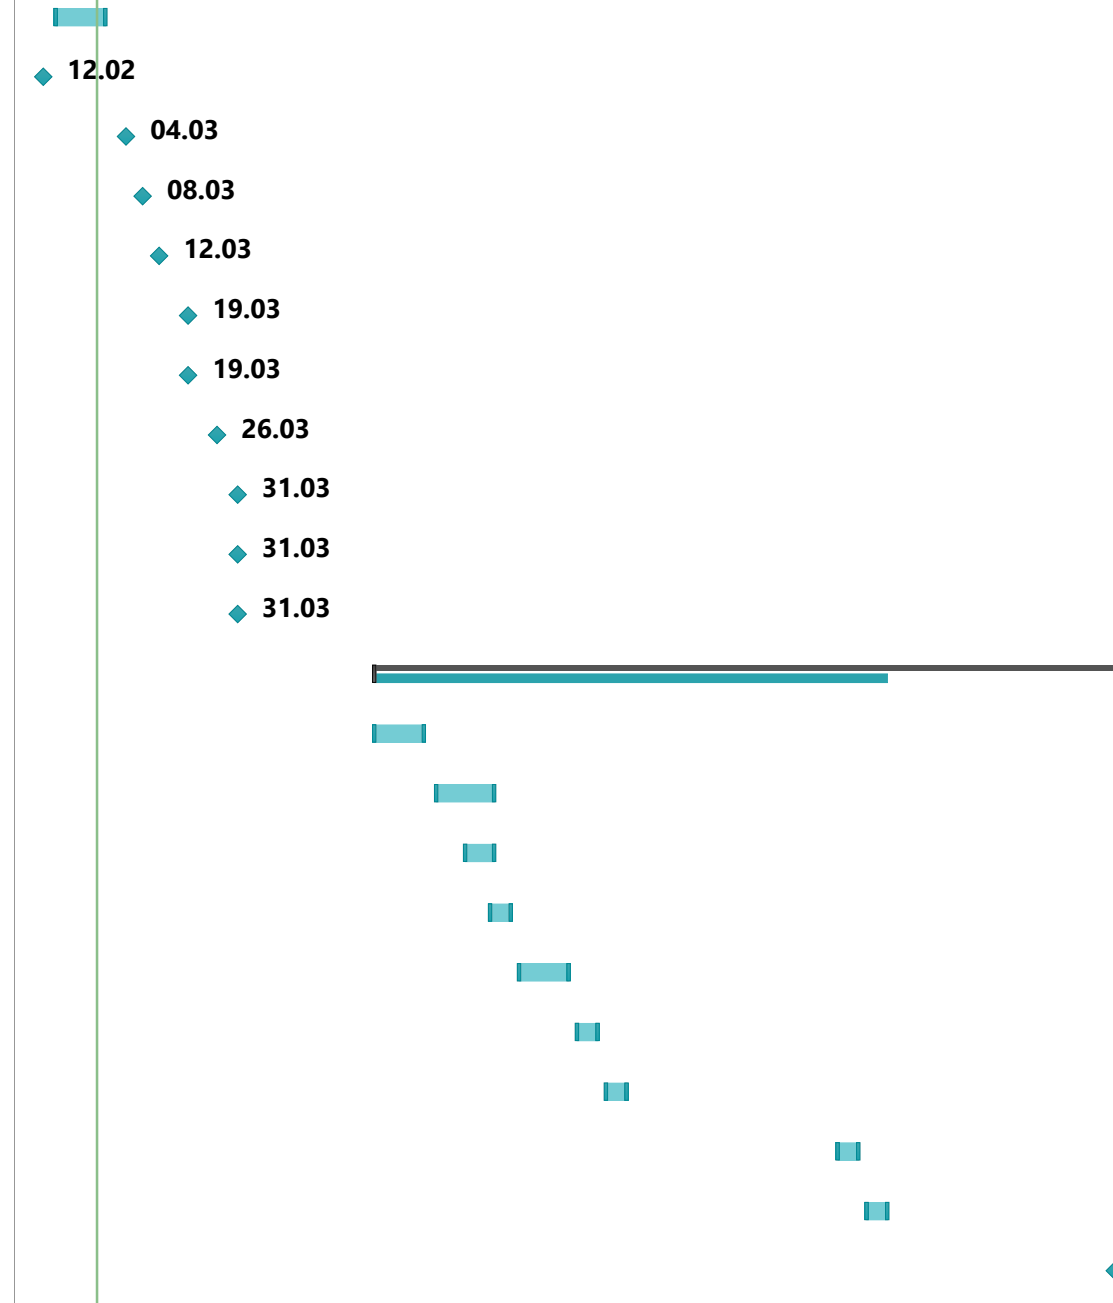

Prosjekt: Ladestruktur Helgelan
Dato: to 25.02.21

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
