


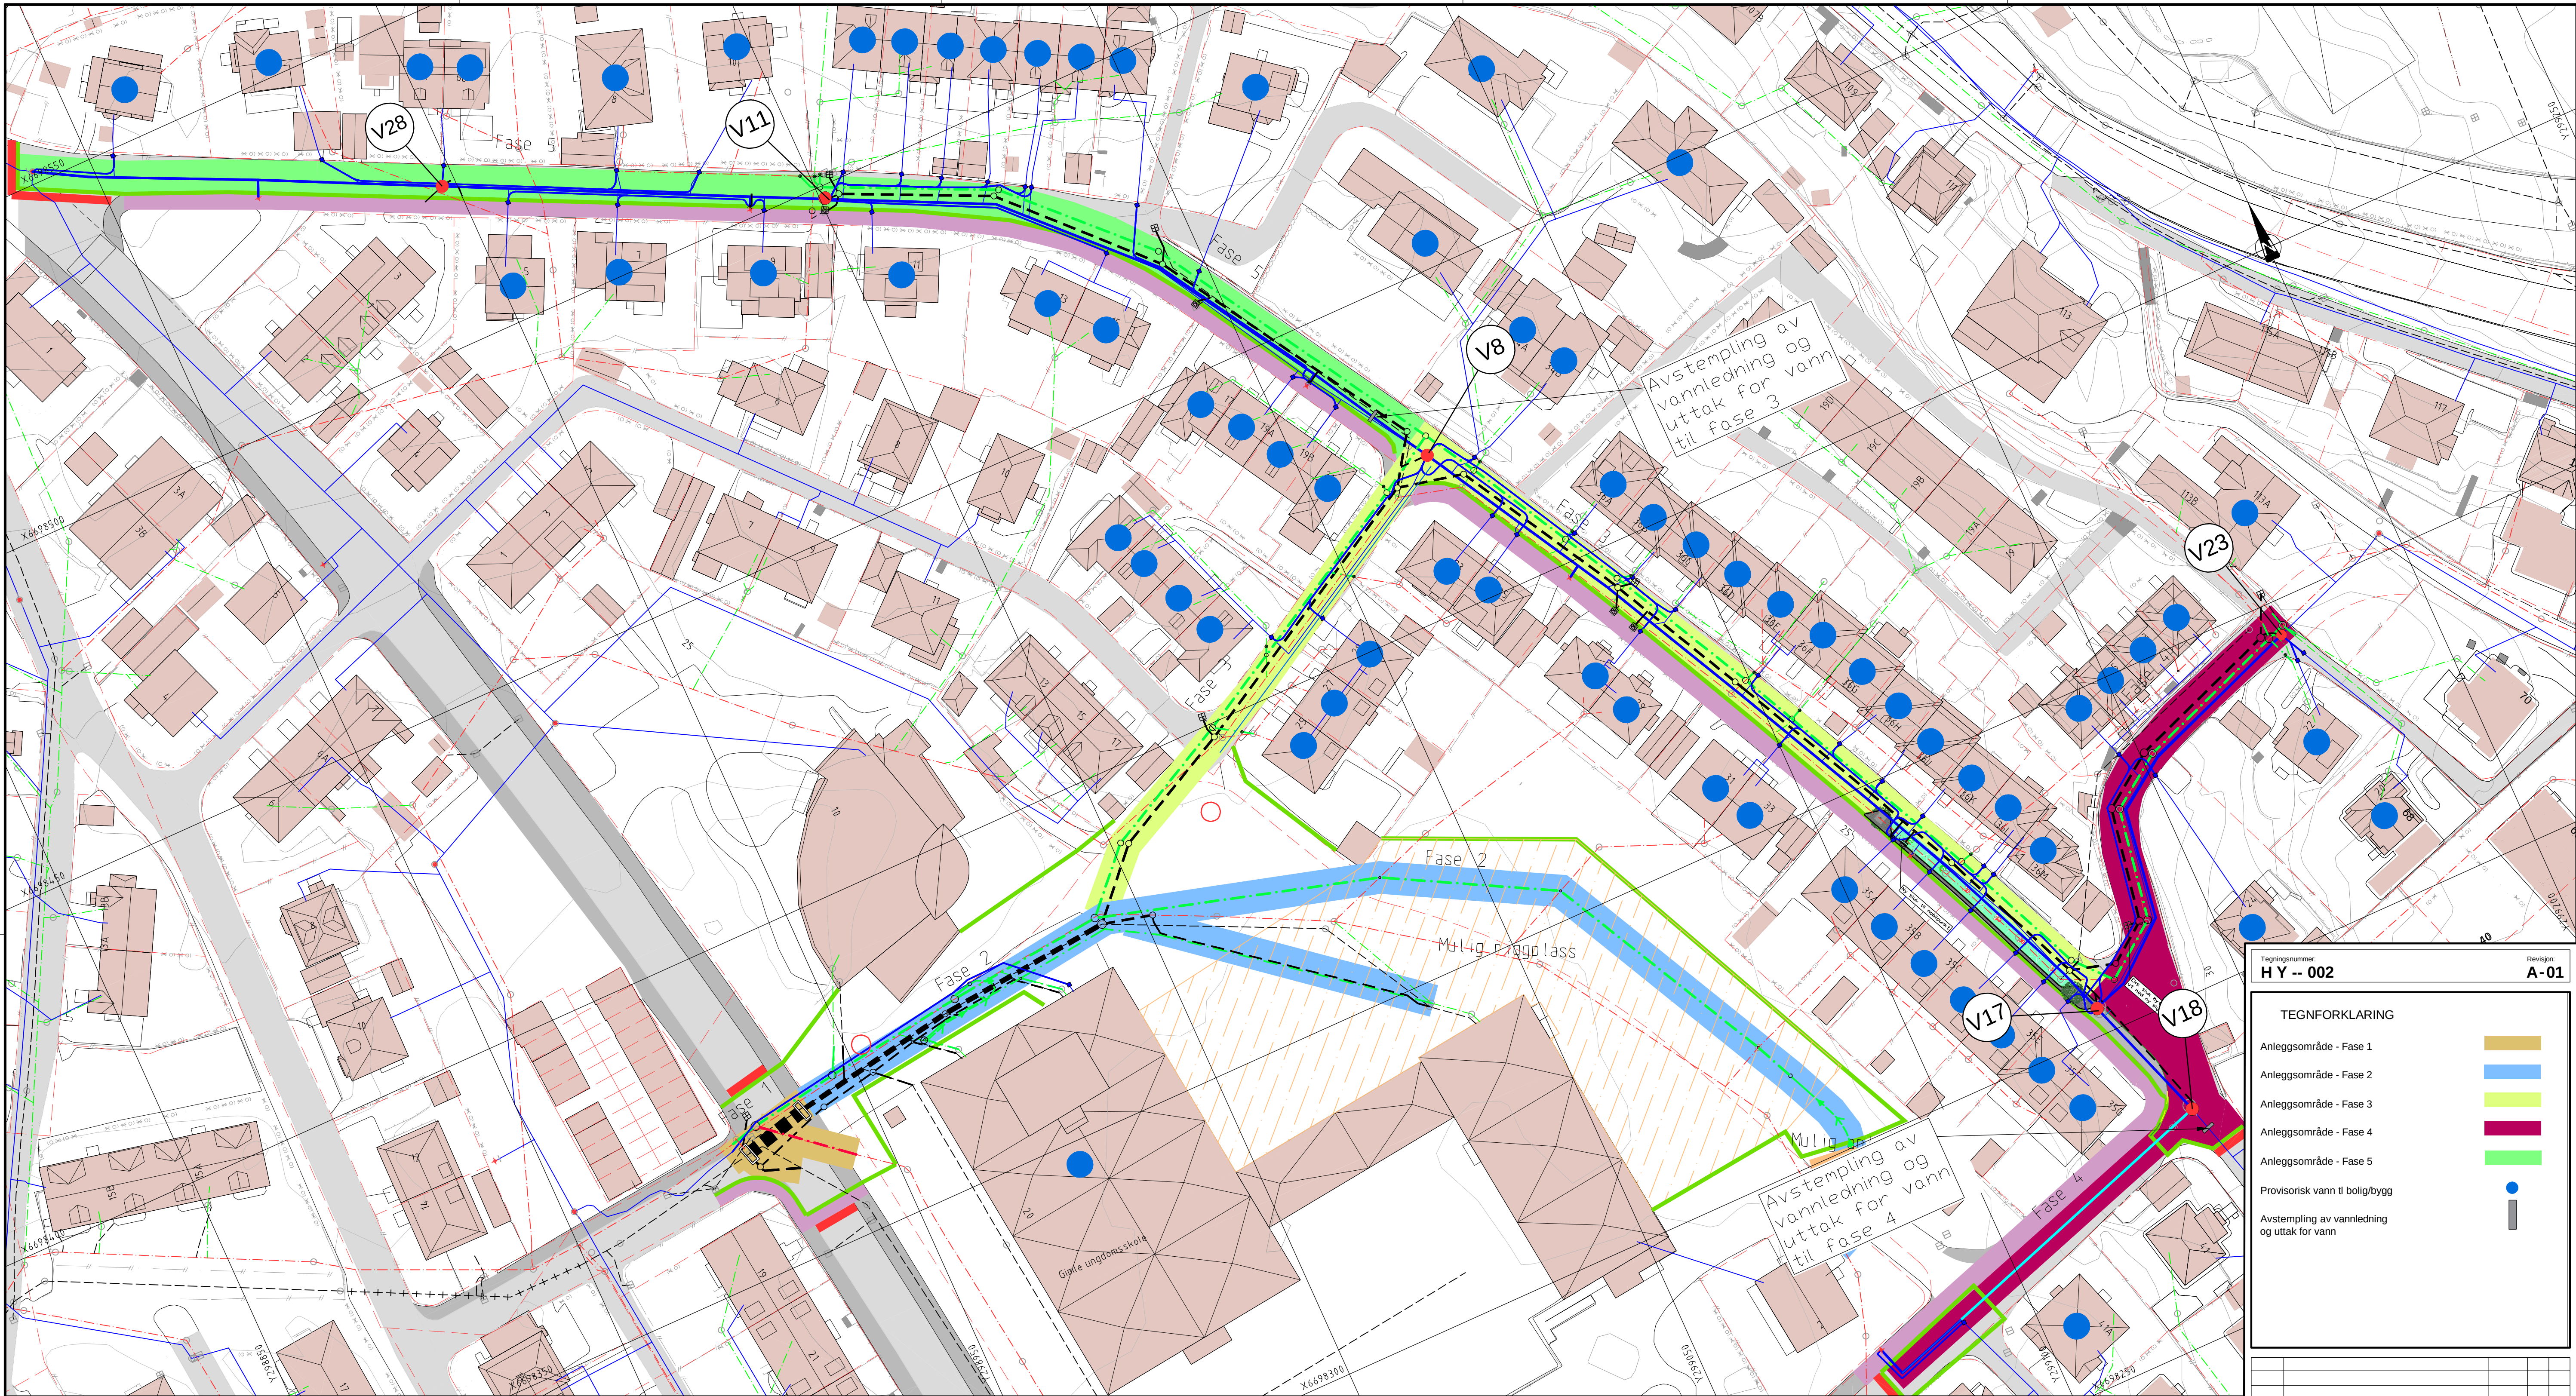

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Provisorisk vannforsyning:

Eksisterende 63mm stikkledning til Gimle oppvekstun skal erstattes med nye vannledning fra start av trase A. Eksisterende 63mm stikkledning erstattes med rør i rør ledning. Medierør: 63mm PE100 RC+ SDR 11. Varerør 90mm PE100 SDR17.

Ny stikkledning etableres på grøftkanten før hovedgrøften graves. Stikkledningen legges i grøften mens hovedledningen blir etablert.

Provisorisk vannforsyning:

Ny 63mm stikkledning fra fase 1 føres videre inn til Gimle oppvekstun.

Ny stikkledning etableres på grøftkanten før hovedgrøften graves. Stikkledningen legges i grøften mens hovedledningen blir etablert.

Stikkledningen skal trykkes etter den er etablert i grøften.

Provisorisk vannforsyning:

Eksisterende vannledning 300mm i Gimleveien stemples av nord for ny vannkum V8. Det monteres mellomring med 1-3 uttak for provisorisk vannforsyning. Fra det midlertidige vannuttaket kan noen av boligene sør for V8 i Gimleveien og St. Torfins vei få provisorisk vann.

Eksisterende vannkum som blir erstattes med vannkum V17, stenges i nordlig retning mot Gimleveien. Fra eksisterende vannkum etableres provisorisk vann i resterende del av Gimleveien. Hydranter som settes ut av drift må markes tydelig, med f.eks gult overtrekk.

Etter at V8 og V17 og vannledningstrekket mellom er etablert skal ledningen pluggkjøres med renseplugg. Vannledningstrekket skal også renseplugges med video, trykkes, koples og nøytraliseres etter desinfisering før ledningen kan tas i bruk.

Avstempling av eks. 300mm vannledning: Vannledning kappes og det monteres en flensmuffe, med en mellomring med 1-3 uttak og en blindflens i enden. Mot blindflensen plasseres det en betong kloss. Gravegrop skal gjenfylles og masser skal plasseres bak betongkloss før ledningen trykkes.

Provisorisk vannforsyning:

Provisorisk vann for Gimlebakken kan tas fra eks. vannkum nord for V23. Denne vannkummen er en soneinledningskum så ventil mot Gimlebakken skal holdes stengt. Provisorisk vann må tas ut fra brannuttaket i kummen.

Eksisterende vannledning 300mm i Gimleveien stemples av øst for ny vannkum V18. Det monteres mellomring med 1-3 uttak for provisorisk vannforsyning. Fra det midlertidige vannuttaket kan noen av boligene i nedre del av Gimlebakken få provisoriskvann. Hydranter som settes ut av drift må markes tydelig, med f.eks gult overtrekk.

Provisorisk vann for boligene tilkoblet fellesprivat vannledning ved brannhydrant (St. Clemens vei 41A - 41F) kan også forsynes fra det midlertidige vannuttaket.

Avstempling av eks. 300mm vannledning: Vannledning kappes og det monteres en flensmuffe, med en mellomring med 1-3 uttak og en blindflens i enden. Mot blindflensen plasseres det en betong kloss. Gravegrop skal gjenfylles og masser skal plasseres bak betongkloss før ledningen trykkes.

Provisorisk vannforsyning:

Provisorisk vann kan tas fra V8 som ble etablert i fase 3. Provisorisk vann kan tas ut fra brannuttaket i kummen og føres frem til boligene ved V11.

For det resterende området i Gimleveien kan provisorisk vann tas fra eks. vannkum helt i starten av Gimleveien. Provisorisk vann kan tas fra brannuttaket i kummen.

Tegningsnummer:
HY -- 002

Revisjon:
A-01

TEGNFORKLARING

Anleggsområde - Fase 1

Anleggsområde - Fase 2

Anleggsområde - Fase 3

Anleggsområde - Fase 4

Anleggsområde - Fase 5

Provisorisk vann til bolig/bygg

Avstempling av vannledning og uttak for vann

A-01

Anbudstegning

Rev.

Revisjon gjeber

27.11.23

ML

TA

Rev dato

Ukjent

Kont

Prosjekt

Gimleområde

Sanering og separering

Oppdragsgiver

Bergen Vann

Oppdragsleder

osplan

viak

AV

Prosjekt fase

ANBUDSTEGNING

Dato

16.12.2022

Oppdragsnr

636932-01

Koordinatsystem

UTM32

Heiderreferanse

NN2000

Utarbeidet av

ML

Kontrollert av

TA

Godkjent av

ML

Målestokk

1:500

Format

A1

Gimleområdet

Oversiktskart

Faseplan - Provisorisk vannforsyning

Tegningsnummer

HY -- 002

Revisjon

A-01

Fag

Type

Et

Lapser
