

REFERAT FRA TILBUDSBEFARING

Oppdrag **Løkkeveien vann- og avløpsanlegg**
Emne **Referat fra tilbudsbeifaring**
Dato **2023-03-08**
Sted **Løkkeveien 115, Rambølls kontor**
Møte nr. **1**
Referent **Hans-Petter Bergseng – Rambøll (referent)**
Deltagere **Kåre K. Kristensen AS
Christer Sundstrøm AS
Pedersen Maskin AS
Ronny Hermansen AS
Alta kommune v/ Mats Ailo Soleng**

Sendt **Lagt ut på Merzell tilgjengelig for alle påmeldte tilbydere**

Dato 2023-03-13

Rambøll
Løkkeveien 105
N-9510 Alta

T +47 78 44 92 22
www.ramboll.no

1. Orientering


Tilbudsbeifaringen startet med en kjapp beifaring av tiltaksområdet. Hans-Petter Bergseng orienterte kort om prosjektet.

Med bakgrunn i endringer av reguleringsplaner for området må eksisterende vann- og avløpsanlegg flyttes, for å frigjøre arealer for fremtidig bebyggelse.

Prosjektet Løkkeveien vann- og avløpsanlegg omfatter etablering av nytt VA-anlegg langs Løkkeveien.

Orientering, spørsmål og svar og som ble tatt opp på konferansen er sammenfattet i etterfølgende poster.

2. Midlertidig deponi og riggområde.

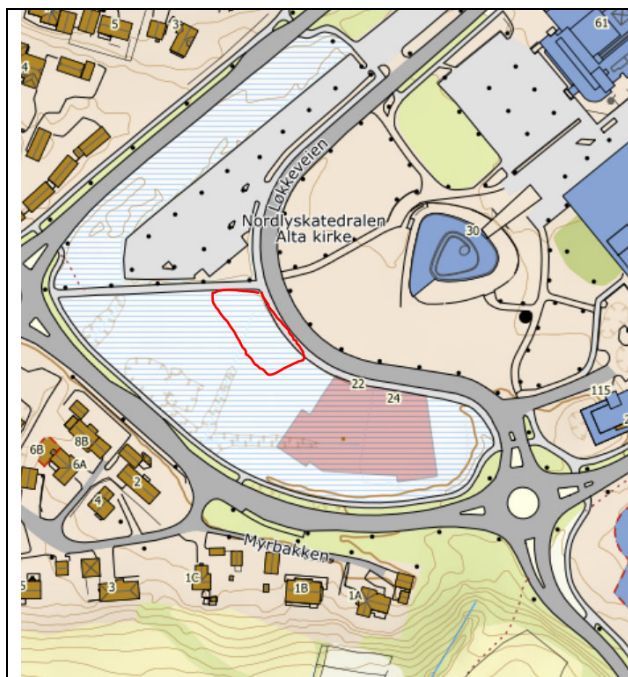

Arealer på vestsiden av Løkkeveien kan benyttes for midlertidig deponi for av gravemasser. Dette for å legge til rette for en kjapp fremdrift.

Postene 73.09.3 og 73.09.4 omfatter transport til og fra deponiet, og kostnader skal inkluderes her.

Arealer i dette området kan også benyttes som riggområde.

3. Drift av eksisterende VA-anlegg

Vannledningsanlegg gjennom utbyggingsområdet vil stenges i byggeperioden.

Spill- og overvannsanlegg må være drift i forbindelse med arbeidene, og arbeider tilknyttet omkobling må inkluderes.

4. Kryssing og reetablering av veianlegg

Prosjektet omfatter to veikryssinger av Løkkeveien, i start og slutt av VA-trase.

Eksisterende veianlegg skal reetableres etter gravearbeidene.

Veianlegget skal reetableres mest mulig likt oppbygging av dagens veianlegg. Dette vil endelig avklares når området er oppgravd, og vi kjenner dagens veioppbygging.

Det skal etableres en betydelig utkiling, samt fortanning av øvre del av veioverbygning.

Det er begrenset tid for at graveområdet ved veikryssinger skal få «sette seg», og dette er ikke optimalt. Dette med bakgrunn i at det skal arrangeres et større arrangement i området i august 2023. Byggherre er kjent med at det derfor kan forekomme setninger i gravetrase ved veikryssingen.

Det er ikke medtatt noen ekstra poster for ulempe tilknyttet kryssing av veianlegg, utover de postene som er med i konkurransegrunnlaget. Dette betyr at kostander må inkluderes i de respektive postene som er medtatt.

5. PVC vs PP

Det kan også benyttes materialet PP for spillvannsrør.

6. Beplantning av parkområdet

Alta kommune vil utføre beplantning og tilsåing av grøntanlegget.

Tilbyder er ansvarlig for maskinarbeid og utlegging vekstjord for tilsåing.

7. Geoteknikk

Det er utført geoteknisk detaljprosjektering for arbeidene. Rapport vil fremlegges i forbindelse med oppstarten av arbeidene.

8. Overskuddsmasser

Overskuddsmasser fra området skal kjøres til Alta kommunes deponi på Holmen. Det skal ikke inkluderes tipparbeider for deponiet.

9. Revet asfalt

Asfalt skal kjøres til deponi ved Øytun. Det er ikke deponiavgift for dette.

10. Inngjerding av anleggsområdet

Hele anleggsområdet skal gjerdes inn. Det er medtatt poster for denne aktiviteten.

11. Eksisterende veianlegg og langsgående sikring

Løkkeveien skal holdes åpen i største delen av byggeperioden. Det er angitt poster for levering av langsgående sikring for gravearbeider mot veianlegg. I forbindelse med kryssinger må veianlegg stenges.

12. Byggetillatelse

Søknad om byggetillatelse for prosjektet er sendt til Bygningsmyndigheten.

Når utførende er valgt vil dette inkluderes i søknaden.

13. Arbeidstid

Angitt arbeidstid i konkurransegrunnlaget er gjeldene.

I forbindelse med veikryssinger er det naturlig at det gis tillatelse for nattarbeider, for å begrense stengingstid for veianlegg.

14. Innkommende spørsmål

1. Det mangler post for tetthetsprøving av avløpsanlegg.

Svar: Det stilles ikke krav om dokumentasjon for tetthetsprøving av avløpsanlegg.

2. Det er ikke medtatt post for pluggkjøring av vannledningsanlegg.

Svar: Dette arbeidet ønsker Alta kommune utført.

Vedlegg med prisbærende poster er revidert, og det er lagd nye digitale prisfiler der denne posten er inkludert. Post for pluggkjøring omfatter post 73.08.8.
