G/S-bru over Otra

Fremdriftsplan
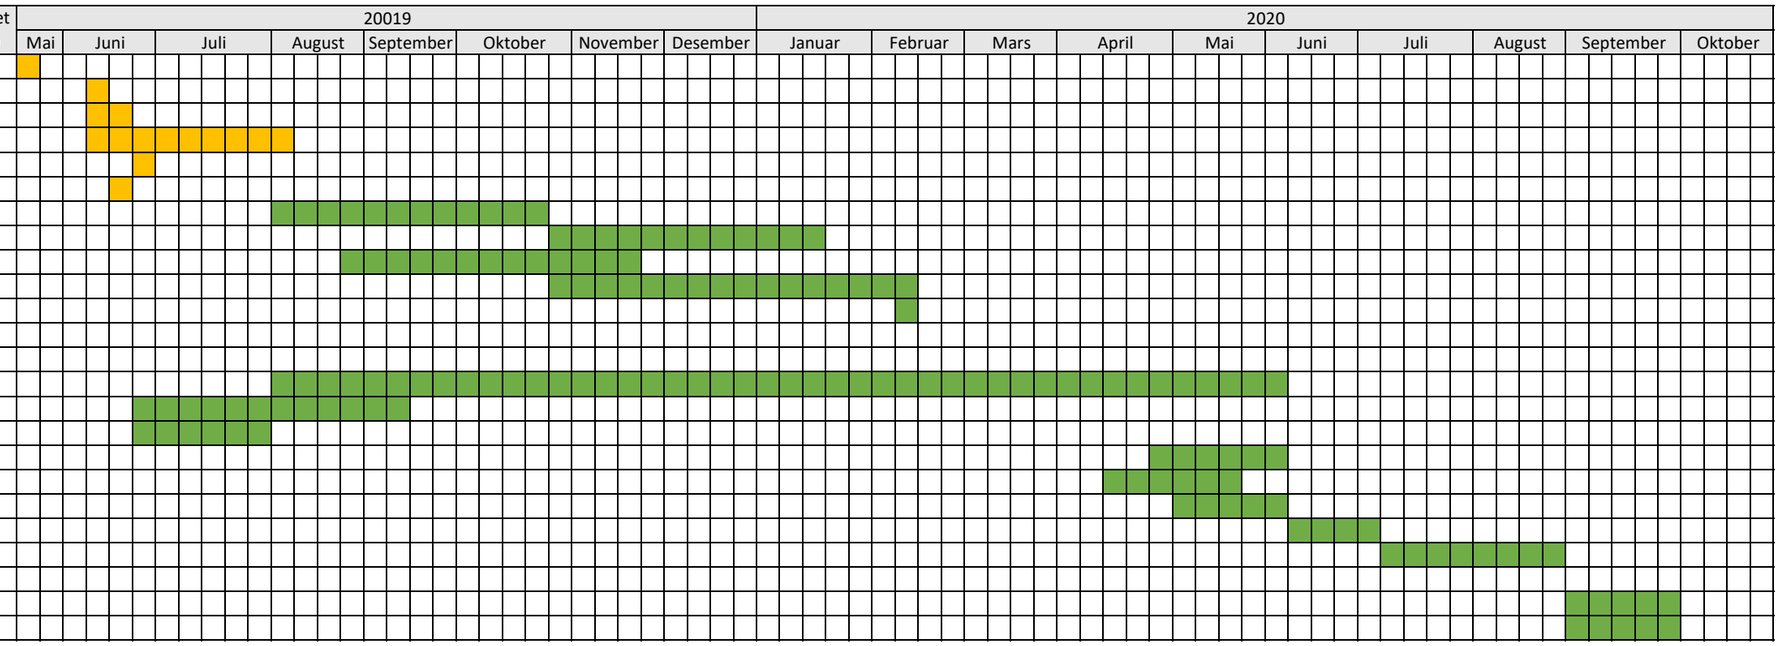
Aktivitet	Varighet (uker)
Innlevering 20.5.19	1
Kontrakt	1
Samhandling	2
Tilrigging av byggeplass	9
UE betongarbeider godkjent	1
UE stålarbeider og stålmontasje godkjent	1
Landkar Elvegata	12
Landkar Kjøita	12
Fundamentering i elva	13
Søyler i elva	16
Kontrollmålinger av fundamenter og landkar	1
Betongarbeider i elva inkludert mudring ferdig 17.02.2020	
Produksjon stål	44
Utarbeidelse av produksjonstegninger	12
Utarbeidelse og godkjenning av sveiseprosedyrer	6
Prøvemontasje av stål i verksted ferdig 30.4.2020	6
Kontroll av overflatebehandling	6
Kontrollmåling av stålkonstruksjon	5
Transport stål til byggeplass (levert 03.07.2020)	4
Montasje av stål	8
Montasje bruutstyr, asfaltering	6
Landskapsarbeider	6
