Utarbeidet av: Jørgen Johnsen
Dato: 22.03.2019

Prosjektplan Rehabilitering Rundtom PST

Period Highlight: 12 | Plan Duration | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
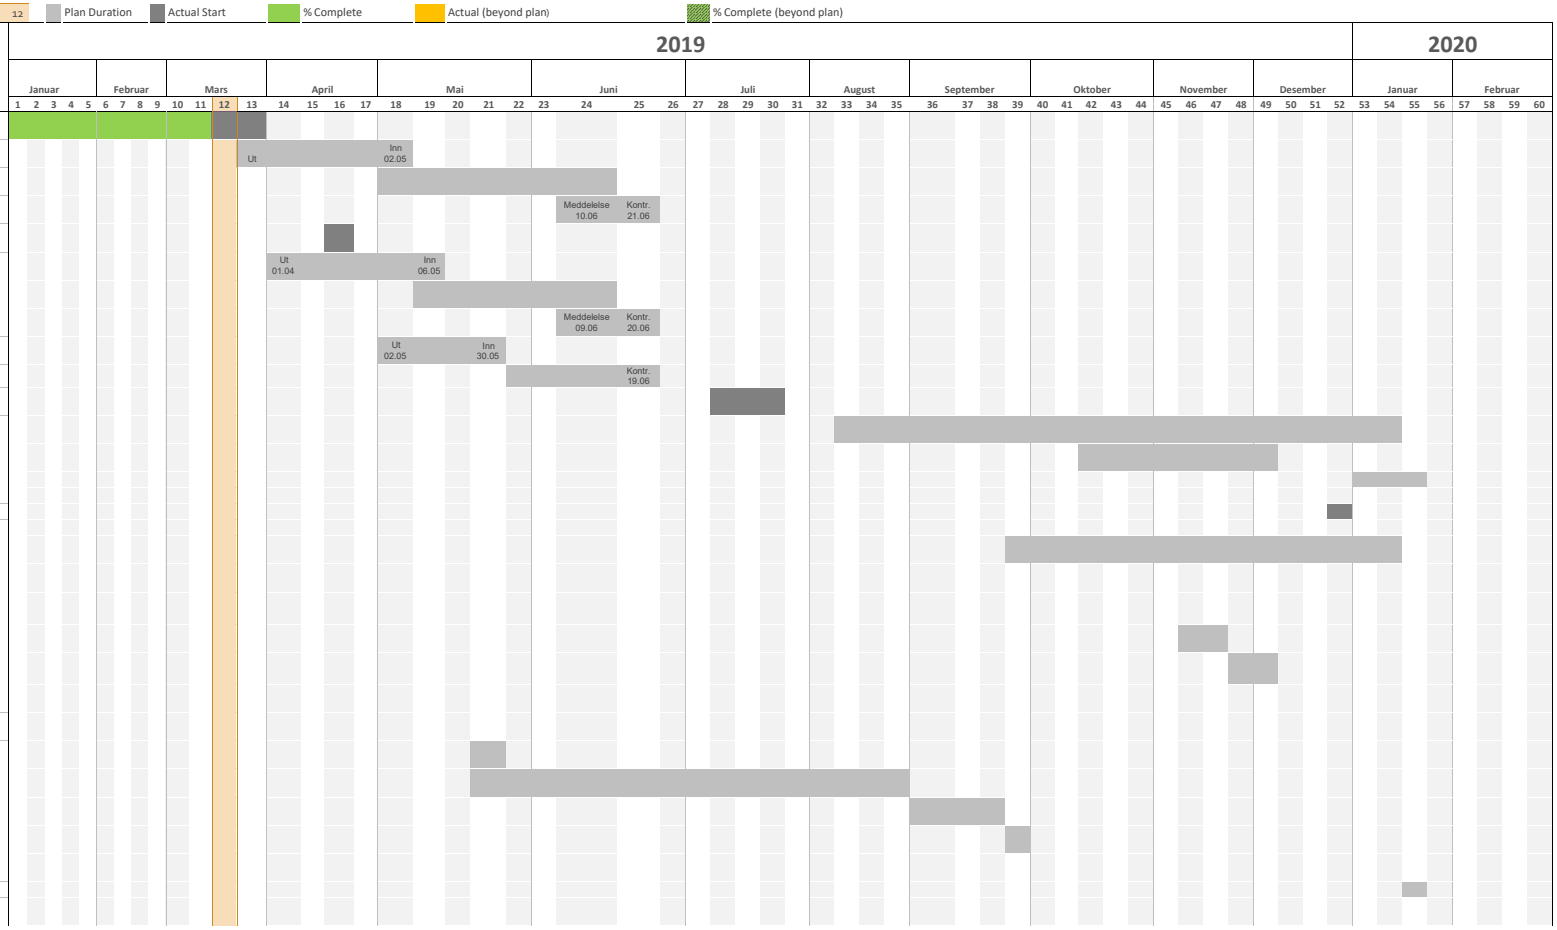
Aktivitet	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE
Prosjektering	1	13	1	13	90 %
Tilbudsarbeid E1	13	6			
Evaluering/Forhandling E1	18	7			0 %
Kontrahering	24	2			
Påske	16	1	16	1	
Tilbudsarbeid E2	14	6			
Evaluering/Forhandling E2	19	6			
Karensperiode	24	2			
Tilbudsarbeid E3	18	4			
Evaluering/kontrahering	22	4			
Fellesferie	28	3	28	3	
Fremdrift E1 maskin	33	22			
Prov. drift pumper	42	8			
Ferdigstilling, igangkj. P01/P02	53	3			
Jul	52	1	52	1	
Fremdrift E2 elektro	39	16			
Fremdrift E3 PLS/programmering					
Levering/montering PLS	46	2			
Leveranse software, igangkjøring	48	2			
Glitre energi fremdrift					
Forberedelse før igangsetting	21	1			
Leveringstid nettstasjon etc.	21	15			
Installasjon	36	3			
Klart for spenningsetting	39	1			
Oppstart prøvedrift	55	1
