HOVEDFREMDRIFTSPLAN
HOV OMSORGSBOLIGER OG HOV FORELDREKONSEPT

Ver.	Dato:	Beskrivelse/Fase:	Sign
1.0			

Prosjektleder :
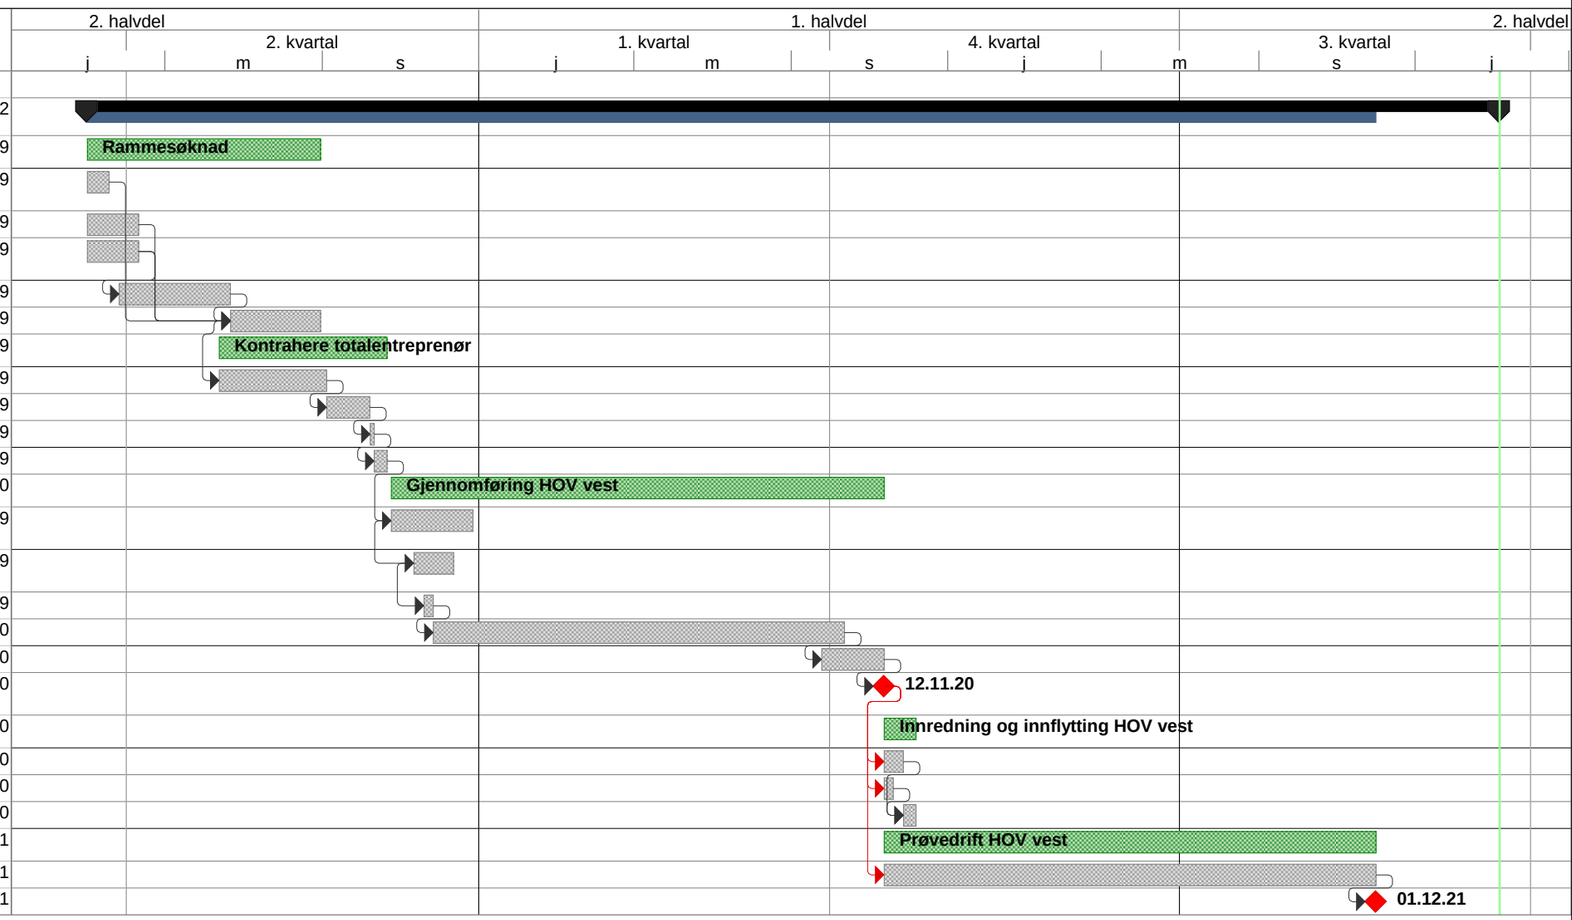
ID	Aktivitet (lilla aktiviter har egen kaldender)	Varighet	Start	Slutt
1				
2	**HOV VEST**	**688,06 d**	fr 01.03.19	ma 07.03.22
3	**Rammesøknad**	**114 d**	fr 01.03.19	fr 30.08.19
4	Revdere prosjektet basert på kommentarer til forprosjekt og politisk vedtak	**10 d**	fr 01.03.19	ma 18.03.19
5	Søknad om arbeidstilsynets godkjenning	**25 d**	fr 01.03.19	on 10.04.19
6	Søknad om godkjenning etter miljørettet helsevern	**25 d**	fr 01.03.19	on 10.04.19
7	Utarbeide rammesøknad	**55 d**	ti 26.03.19	to 20.06.19
8	Rammesøknad/tillatelse	**44 d**	fr 21.06.19	fr 30.08.19
9	**Kontrahere totalentreprenør**	**81,75 d**	on 12.06.19	ma 21.10.19
10	Ferdigstille konkurransegrunnlag	**40 d**	on 12.06.19	on 04.09.19
11	Konkurranseperiode	**21 d**	on 04.09.19	ma 07.10.19
12	Evaluering av innkomne forslag/tilbud	**3 d**	ti 08.10.19	fr 11.10.19
13	Karensperiode og kontraktsinngåelse	**10 ud**	fr 11.10.19	ma 21.10.19
14	**Gjennomføring HOV vest**	**240 d**	to 24.10.19	to 12.11.20
15	Detaljprosjektering og kontrahering av underentreprenører	**2 MN**	to 24.10.19	fr 27.12.19
16	Uavhengig kontroll brann og geoteknisk prosjektering	**20 d**	ma 11.11.19	to 12.12.19
17	IG grunn og fundamenter	**5 d**	ti 19.11.19	ti 26.11.19
18	Byggearbeider	**10 MN**	ti 26.11.19	ma 12.10.20
19	Sluttfase med innregulering og uttesting	**30 d**	to 24.09.20	to 12.11.20
20	Delovertakelse fra entreprenør/ oppstart prøvedrift	**0 d**	to 12.11.20	to 12.11.20
21	**Innredning og innflytting HOV vest**	**17,13 d**	to 12.11.20	ma 07.12.20
22	Møblering	**10 d**	to 12.11.20	fr 27.11.20
23	Oppkobling av IT	**5 d**	to 12.11.20	to 19.11.20
24	Innflytting og utpakking	**5 d**	fr 27.11.20	ma 07.12.20
25	**Prøvedrift HOV vest**	**240 d**	to 12.11.20	on 01.12.21
26	Prøvedriftsperiode	**12 MN**	to 12.11.20	on 01.12.21
27	Overtagelse etter godkjent prøvedrift	**0 d**	on 01.12.21	on 01.12.21
