ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
1	**Prosjektering forprosjektfase**	**ti 28.02.17**	**fr 30.06.17**
2	Kontraktsinngåelse	ti 28.02.17	ti 28.02.17
3	Forenklet forprosjekt/bearbeidelsesfase	on 01.03.17	fr 12.05.17
4	Oppstartsseminar, bearbeidelsesfase	ma 06.03.17	ma 06.03.17
5	Logistikk, planløsninger, fleksibilitet	ti 07.03.17	fr 12.05.17
6	Brukermedvirkning FHS	ti 07.03.17	fr 12.05.17
7	Brukermedvirkning SIT	ti 07.03.17	fr 12.05.17
8	Inneklima, soneinndeling og styring	ti 18.04.17	fr 12.05.17
9	Dørfunksjoner og adgangskontroll,	ma 24.04.17	fr 12.05.17
10	Universell utforming og materialbruk	ma 24.04.17	fr 12.05.17
11	Gjennomgang utomhusarealer og søppelsug	ma 24.04.17	fr 12.05.17
12	ITB, verifisere grensesnitt	ma 15.05.17	fr 09.06.17
13	Låste plantegninger	fr 26.05.17	fr 26.05.17
14	Verifisere miljømål	ma 29.05.17	fr 09.06.17
15	Verifisere energimål	ma 29.05.17	fr 09.06.17
16	Kjøre oppdatert preanalyse i BREEAM	ma 29.05.17	fr 09.06.17
17	Verifisere brannsikkerhet	ma 29.05.17	fr 09.06.17
18	Verifisere lyd- og støyforhold	ma 29.05.17	fr 09.06.17
19	Ferdigstillelse forprosjekt	ma 12.06.17	fr 30.06.17
20	**Prosjektering detaljfase**	**ma 04.12.17**	**fr 25.09.20**
21	Oppstart detaljprosjektering	ma 04.12.17	ma 04.12.17
22	Avsjekk BREEAM, kontinuerlig	ma 04.12.17	fr 25.09.20
23	Avsjekk ITB, kontinuerlig	ma 04.12.17	fr 25.09.20
24	Prosjektering for myndighetsbehandling	ma 04.12.17	fr 09.08.19
25	Prosjektering for bygging	ma 04.12.17	fr 25.10.19
26	Prosjektering for innkjøp	ma 04.12.17	fr 21.02.20
27	Arkitekt, grunnlagstegninger	ma 04.12.17	fr 15.12.17
28	Arkitekt, prosjektering og koordinering	ma 04.12.17	fr 26.06.20
29	Teknikk, systemskjema/topologi	ma 04.12.17	fr 19.01.18
30	Grensesnittplan teknikk	ma 04.12.17	fr 19.01.18
31	Geoteknikk, byggegrop/spunt	ma 04.12.17	fr 09.02.18
32	Geoteknikk, fundamentering	ma 04.12.17	fr 09.02.18
33	Miljøgeologi, analyser-tiltaksplan	ma 04.12.17	fr 16.03.18
34	Miljøgeologi, graveplan forurenset grunn	ma 04.12.17	fr 16.03.18
35	Konstruksjonsteknikk, fundamentering	ma 04.12.17	fr 16.03.18
36	Konstruksjonsteknikk, bæresystem	ma 04.12.17	fr 01.06.18
37	Brannsikkerhet	ma 04.12.17	fr 22.03.19
38	Miljøteknisk prosjektering	ma 04.12.17	fr 22.03.19
39	Energirådgivning	ma 08.01.18	fr 18.01.19
40	Bygningsfysisk rådgivning	ma 08.01.18	fr 18.01.19
41	Lydteknisk prosjektering	ma 08.01.18	fr 22.03.19
42	SHA i prosjekteringen	ma 08.01.18	fr 18.01.19
43	Hovedføringsveier	ma 22.01.18	fr 16.03.18
44	Underlag for UKPR geoteknikk	fr 09.02.18	fr 09.02.18
45	Underlag for UKPR konstruksjonsteknikk	fr 16.03.18	fr 16.03.18
46	Underlag for UKPR brannsikkerhet	fr 16.03.18	fr 16.03.18
47	Underlag for UKPR bygningsfysikk	fr 01.06.18	fr 01.06.18
48	Underlag BH-beslutninger tett bygg	ma 06.08.18	fr 14.09.18
49	Byggherrebeslutninger tett bygg	ma 03.09.18	fr 12.10.18
50	Underlag BH-beslutninger innredning	ma 17.09.18	fr 21.12.18
51	Byggherrebeslutninger innredning	ma 19.11.18	fr 25.01.19
52	Underlag BH-beslutninger utomhus	ma 11.02.19	fr 22.03.19
53	Byggherrebeslutninger utomhus	ma 11.03.19	fr 12.04.19
54	**Nødvendige tillatelser**	**fr 01.12.17**	**fr 16.10.20**
55	Forhåndskonferanse	fr 01.12.17	fr 01.12.17
56	Rammesøknad	fr 15.12.17	fr 15.12.17
57	Søknad IG1, riving i ett trinn	fr 22.12.17	fr 22.12.17
58	Arbeidstilsynet, forhåndsmelding	fr 19.01.18	fr 19.01.18
59	Tillatelse IG1	fr 26.01.18	fr 26.01.18
60	Rammetillatelse	fr 16.03.18	fr 16.03.18
61	Teknisk godkjenning tilkobling VA-ledninger	fr 23.03.18	fr 20.04.18
62	Søknad IG2, grunnarb./fundam./bunnl.	fr 06.04.18	fr 06.04.18
63	Tillatelse IG2	fr 27.04.18	fr 27.04.18
64	Søknad IG3, bæresystem/råbygg	fr 29.06.18	fr 29.06.18
65	Tillatelse IG3	fr 10.08.18	fr 10.08.18
66	Arbeidstilsynets samtykke	fr 16.11.18	to 13.12.18
67	Søknad IG4, Tett bygg	fr 18.01.19	fr 18.01.19
68	Tillatelse IG4	fr 08.02.19	fr 08.02.19
69	Søknad IG5, innredningsarbeider	fr 22.03.19	fr 22.03.19
70	Tillatelse IG5	fr 12.04.19	fr 12.04.19
71	Teknisk godkj. utomhus/veger og plasser	ma 03.06.19	fr 28.06.19
72	Søknad IG6, utomhus/veger og plasser	fr 09.08.19	fr 09.08.19
73	Tillatelse IG6	fr 06.09.19	fr 06.09.19
74	Anmode om brukstillatelse/ferdigattest	fr 25.09.20	fr 25.09.20
75	Gitt brukstillatelse/ferdigattest	fr 16.10.20	fr 16.10.20
76	**Produksjon**	**ma 15.01.18**	**fr 30.04.21**
77	Tilrigging for riving	ma 15.01.18	fr 26.01.18
78	Miljøsanering og riving	ma 29.01.18	fr 06.04.18
79	Tilrigging for bygging	ti 03.04.18	fr 27.04.18
80	Grunnarbeider, graving/spunting	ma 30.04.18	fr 31.08.18
81	Bunnledninger	ma 30.07.18	fr 31.08.18
82	Råbygg, U1 og U2	ma 27.08.18	fr 21.12.18
83	Teknisk montasje	on 02.01.19	fr 26.06.20
84	Råbygg, 1.-6. etg	ma 07.01.19	fr 12.07.19
85	Tett bygg	ma 08.07.19	fr 11.10.19
86	Innredning	ma 07.10.19	fr 14.08.20
87	Utomhus, veger og plasser	ma 03.08.20	fr 25.09.20
88	Byggvask	ma 03.08.20	fr 28.08.20
89	Innregulering, røranlegg	ma 03.08.20	fr 18.09.20
90	Innregulering, ventilasjonsanlegg	ma 17.08.20	fr 18.09.20
91	Ferdigbefaringer	ma 07.09.20	fr 02.10.20
92	Prøveperiode	ma 02.11.20	fr 23.04.21
93	Oppfølging ITB	ma 02.11.20	fr 30.04.21
94	Overtakelsesforretning	ma 26.04.21	fr 30.04.21
95	**Dagmulktbelagte milepæler**	**on 15.03.17**	**fr 30.04.21**
96	Utarbeidelse fremdriftsplan	on 15.03.17	on 15.03.17
97	Igangsetting på byggeplass	ma 30.04.18	ma 30.04.18
98	Tett bygg	fr 11.10.19	fr 11.10.19
99	Overlevering av prøve på FDV-dokum.	fr 05.06.20	fr 05.06.20
100	Innvend. arbeider ferdig og bygning rengjort	fr 28.08.20	fr 28.08.20
101	Overlevering av FDV-dokumentasjon	fr 25.09.20	fr 25.09.20
102	Oppstart prøvedriftsperiode	ma 02.11.20	ma 02.11.20
103	Overtagelse	fr 30.04.21	fr 30.04.21

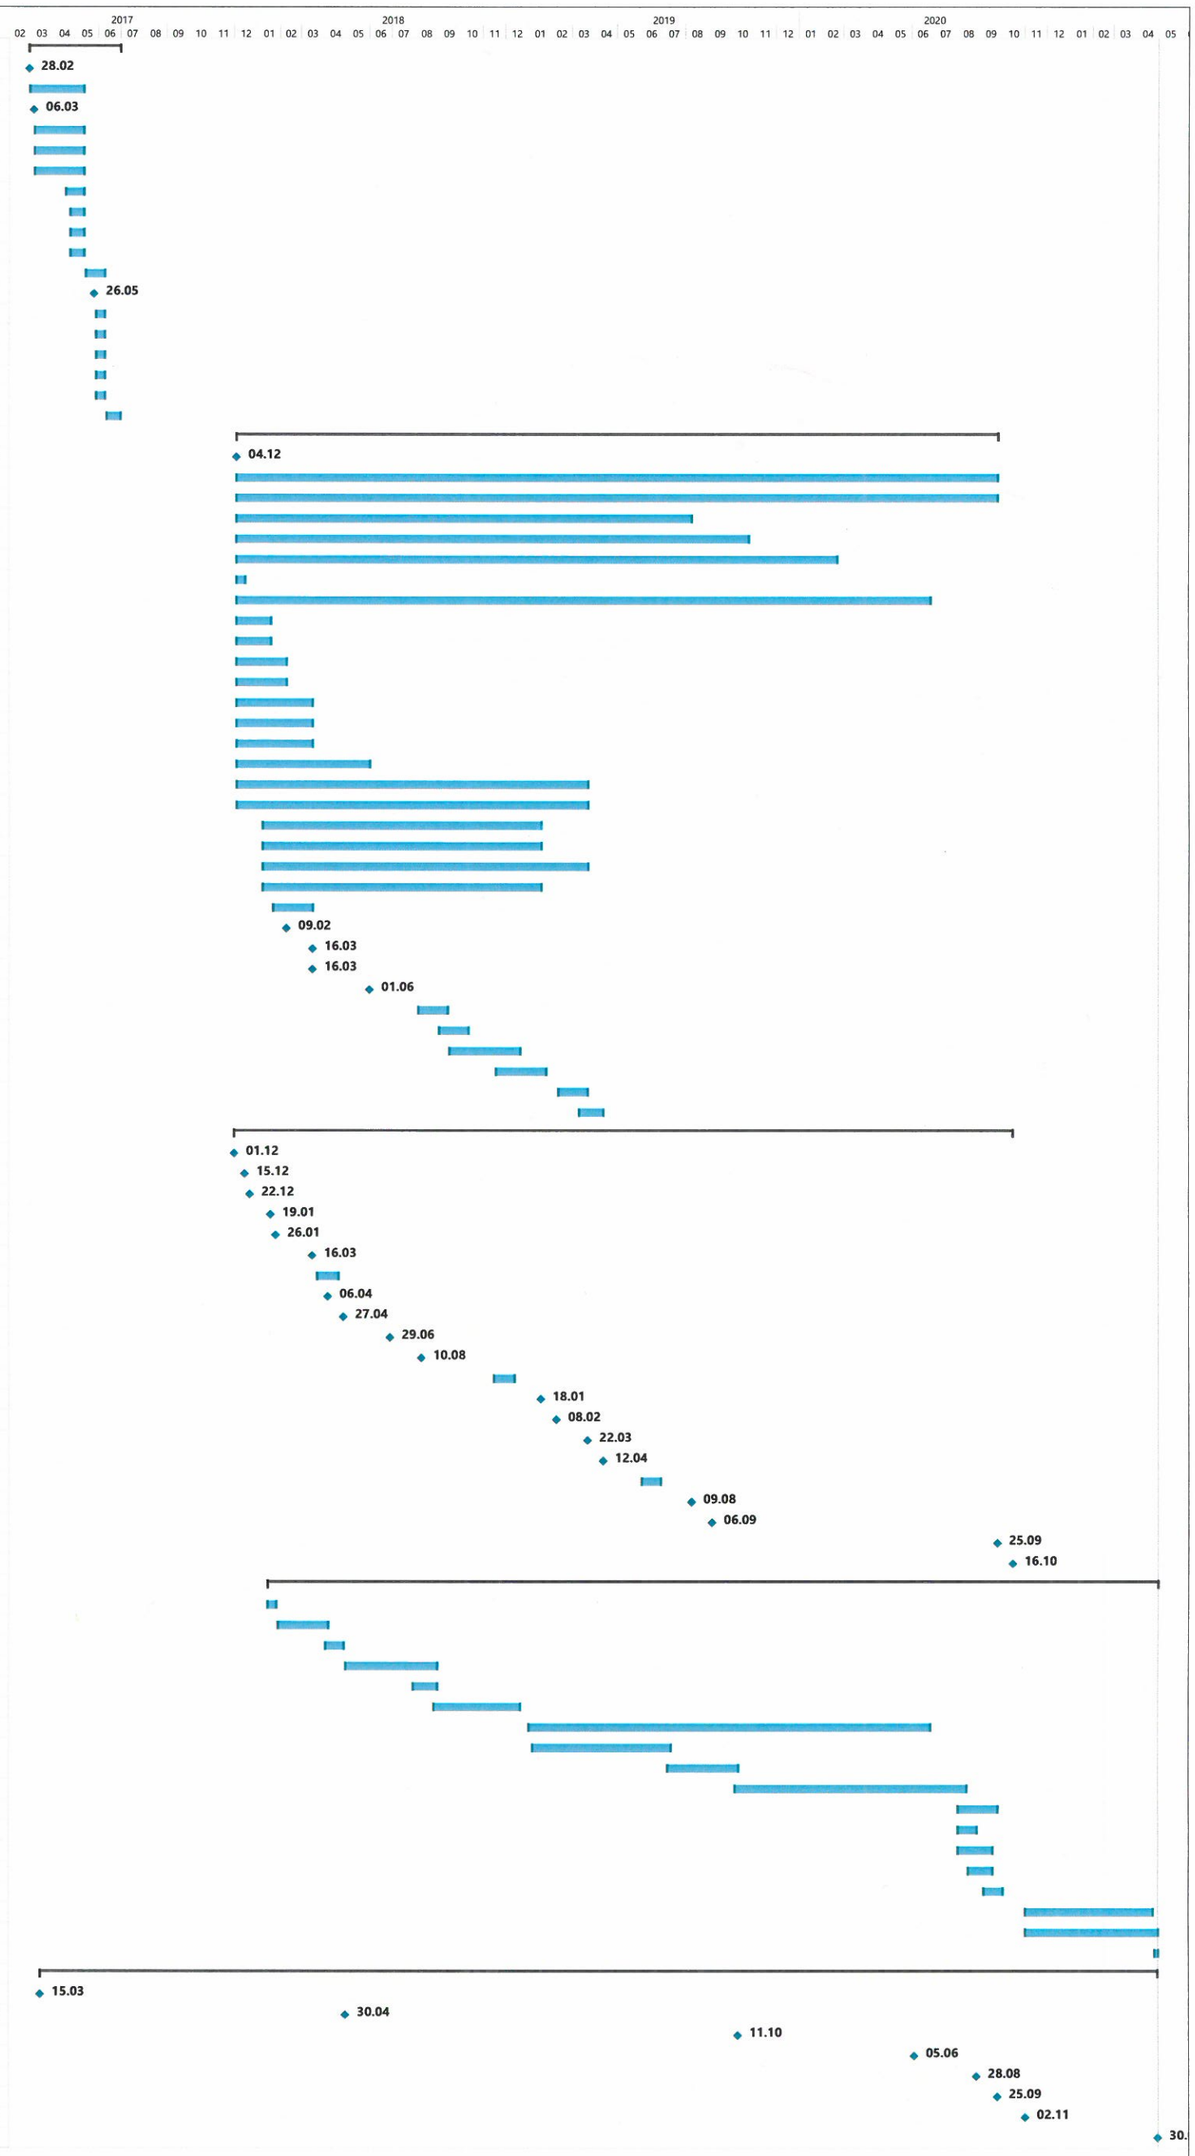

Prosjekt: Fremdriftsplan
Dato: sø 22.01.17

Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist			
Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Fremdrift			
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift			
Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl					
