Saksnummer 20/297
Prosjekt nr. wbs: 234.701

Nye Fjelltun skole

Rev: 2.0
Dato: ti 19.05.20

ID	Aktivitetsnr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
1		**Råbygg/Tett bygg**	**307 dager**	**ma 18.05.20**	**ti 24.08.21**	
2		**E92 Riving (rives fra sør mot nord)**	**63 dager**	**ma 18.05.20**	**on 12.08.20**	
3		Riving Bygg A og B	25 dager	ma 29.06.20	fr 31.07.20	
4		Riving Bygg C, bygg F og paviljong	33 dager	ma 29.06.20	on 12.08.20	
5		Riving SFO	14 dager	ma 08.06.20	fr 26.06.20	3SA-1 dag
6		Riving bolig nr 25	10 dager	ma 25.05.20	fr 05.06.20	
7		Riving bolig nr 39	10 dager	ma 18.05.20	fr 29.05.20	
8		Ferdigbefaring riving bygg A og B	0 dager	fr 31.07.20	fr 31.07.20	3AS-1 dag
9		**E3 Grunn og VA**	**156 dager**	**ti 23.06.20**	**ma 01.02.21**	
10		**Byggegrop (utgraves fra sør mot nord)**	**127 dager**	**ma 03.08.20**	**ma 01.02.21**	
11		Byggegrop del A, akse A-F, inkl. klargjøring for fundamenter, dybde 3-3,5m	8 dager	ma 03.08.20	on 12.08.20	3
12		Byggegrop del B, akse F-O, inkl. klargjøring for fundamenter, dybde 3-4,5m	10 dager	to 13.08.20	on 26.08.20	11
13		Tilbakefylling til generelt nivå del A pkt 1 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001	2 dager	on 26.08.20	to 27.08.20	44AS+1 dag
14		Tilbakefylling til generelt nivå del B pkt 1 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001	2 dager	ma 07.09.20	ti 08.09.20	47
15		Byggegrop del C inkl. klargjøring akse O-U	10 dager	to 08.10.20	on 21.10.20	
16		Tilbakefylling mot kjellervegg pkt 7 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001 inkl klargjøring rest. del C	2 dager	fr 11.12.20	ma 14.12.20	105AS-1 dag
17		Inntillfylling mot bygg utomhus	8 dager	to 21.01.21	ma 01.02.21	108
18		**Drensledninger, bunnledninger mm**	**76 dager**	**ma 21.09.20**	**fr 08.01.21**	
19		Drensledninger del A og B	15 dager	ma 21.09.20	fr 09.10.20	46AS+1 dag
20		Drensledning del C	10 dager	fr 18.12.20	on 06.01.21	53AS-2 dag
21		Oppfylling til OK fundament del A og B. Klargjøre/etterfylle bunnledninger pkt 3 og 4 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001	23 dager	ma 21.09.20	on 21.10.20	46AS+1 dag
22		Oppfylling innvendig til UK isolasjon del A og B. Klargjøre/etterfylle bunndninger, radon pkt 5 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001	12 dager	ti 10.11.20	on 25.11.20	102AS-2 dager
23		Klargjøre/etterfylle tekniske bunnledninger del C pkt 7 ref tegning 234701-XX-B-20-80-001	9 dager	ti 15.12.20	ti 29.12.20	16
24		Oppfylling til UK isolasjon del C. Klargjøre/etterfylle bunnledninger, radon mm	6 dager	on 30.12.20	fr 08.01.21	106AS-1 dag
25		**VA-anlegg utomhus**	**70 dager**	**ti 23.06.20**	**ma 28.09.20**	
26		Fellesgrøft ny vannledning, utskifting av overvann Fjelltunveg retning nord	26 dager	fr 26.06.20	fr 31.07.20	33
27		Spillvann, overvann fra posisjon 11-12, 12-4, 12-13 ref. tegning H001. Inkluder stikk spillvann og overvann fra posisjon 12 til 4	13 dager	ti 23.06.20	to 09.07.20	
28		Krysning ved Fjelltunveg, overvann og spillvann	5 dager	ma 03.08.20	fr 07.08.20	26
29		Spillvann posisjon 9-10, overvann posisjon 8-10,ref tegning H001, + høyspent, lys, trekkerør ref tegning 104	10 dager	ma 10.08.20	fr 21.08.20	28
30		Vannledning, overvann posisjon 6 til 7, ref. tegning H001	6 dager	ma 24.08.20	ma 31.08.20	29

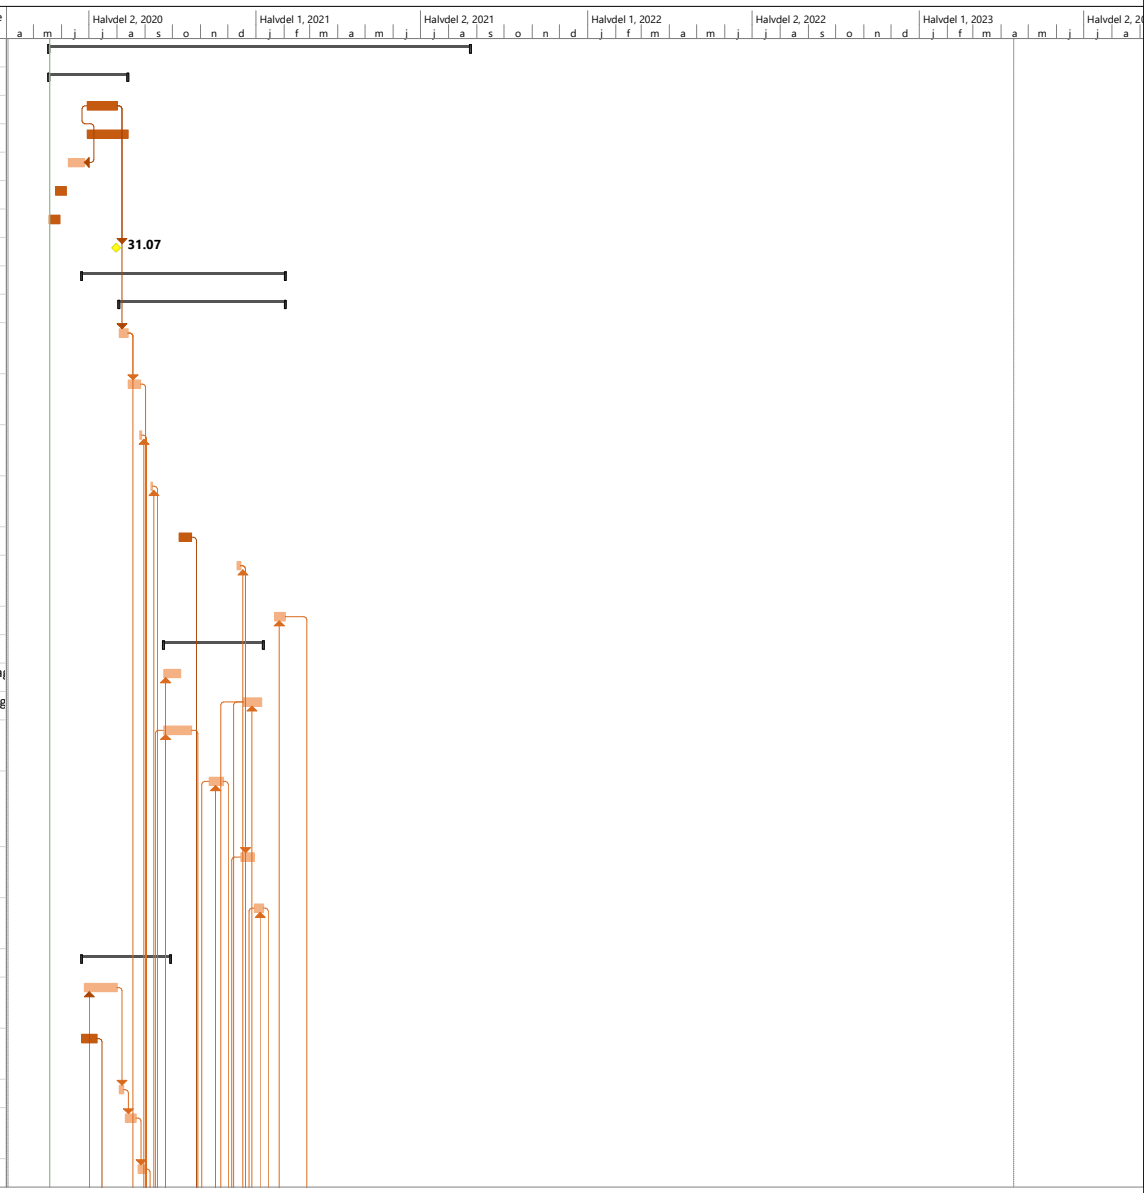

Prosjekt: Fremdriftsplan Nye Fje
Dato: ti 19.05.20

Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist	
Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	
Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl			

Nye Fjelltun skole

ID	Aktivitetsnr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
31		Resterende VA ledninger, kummer på skoleplass etc (tilpasser fremdrift)	20 dager	ti 01.09.20	ma 28.09.20	30
32		**Kabelgrøfter mm.**	**84 dager**	**ti 23.06.20**	**fr 16.10.20**	
33		Krysning ved Fjelltunveg, høyspent og fiber+ trekkerør	3 dager	ti 23.06.20	to 25.06.20	
34		Fellesgrøft ved Fjelltunveg retning nord, høyspent, lavspent, fiber, lys, trekkerør, kjølerør til isbane	10 dager	ma 05.10.20	fr 16.10.20	50AS+1 dag
35		Høyspent, lavspent, trekkerør, lys posisjon R-S-T-U-V, ref. tegning 104	13 dager	fr 10.07.20	ti 28.07.20	
36		**Grøft energibrønner**	**10 dager**	**on 30.09.20**	**ti 13.10.20**	
37		Grøft energibrønner	10 dager	on 30.09.20	ti 13.10.20	180SS-1 da
38		**Diverse grunnarbeider**	**138 dager**	**ti 23.06.20**	**on 06.01.21**	
39		Etablere bussoppstilling i Fjelltunvegen	34 dager	ti 23.06.20	fr 07.08.20	
40		Etablere midertidig parkeringsplass Fjelltunveg (området mellom barnehager) inkl. kabler, drens mm.	20 dager	fr 10.07.20	to 06.08.20	27
41		Utomhus terreng (tilpasser fremdrift)	20 dager	fr 04.12.20	on 06.01.21	20SS-10 da
42		**E5 Betong stedstøpt**	**244 dager**	**to 13.08.20**	**ti 24.08.21**	
43		**Betong stedstøpt råbygg (refereres til tegning 234701-XX-B-20-80-001)**	**182 dager**	**to 13.08.20**	**ti 04.05.21**	
44		Del A (akse A-F): Platefundament, gruber, veggfundament pkt 1	8 dager	to 13.08.20	ma 24.08.20	11
45		Del A: Punktfundament pkt 2	9 dager	fr 28.08.20	on 09.09.20	44;13
46		Del A: Såler og grunndragere pkt 3, inkl såle for støttemur mot veg	6 dager	to 10.09.20	to 17.09.20	45
47		Del B (akse F-O): Platefundament, gruber, veggfundament pkt 1	8 dager	on 26.08.20	fr 04.09.20	12AS-1 dag
48		Del B: Punktfundament pkt 2	9 dager	on 09.09.20	ma 21.09.20	47;14
49		Del B: Såler og grunndragere pkt 3	5 dager	ti 22.09.20	ma 28.09.20	48
50		Utvendig støttemur mot veg pkt 4	10 dager	fr 18.09.20	to 01.10.20	46
51		Del A og B: Vegger, ringmur 1.etg pkt 4	20 dager	ti 29.09.20	ma 26.10.20	49
52		Del C: Fundamenter, såler, grunndragere, ringmur pkt7	12 dager	to 22.10.20	fr 06.11.20	15
53		Del C: Fundamenter, såler, grunndragere, ringmur resterende pkt 7	5 dager	ti 15.12.20	ma 21.12.20	16
54		Stedstøpte vegger 2.etg pkt 8	9 dager	ma 14.12.20	ma 28.12.20	105
55		Stedstøpte vegger 3.etg pkt 10	9 dager	ti 26.01.21	fr 05.02.21	109AS-2 da
56		Stedstøpte vegger 4.etg og dekke over trapperom pkt 12	9 dager	on 03.03.21	ma 15.03.21	112AS-2 da
57		Trappegulv i allrom pkt 12	15 dager	ma 22.03.21	on 14.04.21	64
58		Betongsokler takterrasse (oppsatt etter byggelagstekking)	5 dager	on 28.04.21	ti 04.05.21	171
59		**Gulvarbeider**	**130 dager**	**ti 26.01.21**	**ti 24.08.21**	
60		**Påstøp gulv på grunn inkl forarbeid**	**39 dager**	**ti 26.01.21**	**fr 19.03.21**	
61		Gulv på grunn 1.etg forarbeid (radonduk, isopor, armering)	10 dager	ti 26.01.21	ma 08.02.21	110SS
62		Gulv på grunn 1.etg støping	2 dager	to 11.03.21	fr 12.03.21	123
63		Gulv på grunn 2.etg forarbeid(radonduk, isopor, armering)	9 dager	fr 26.02.21	on 10.03.21	111
64		Gulv på grunn 2.etg støping	2 dager	to 18.03.21	fr 19.03.21	124
65		**Gulv forarbeid og støping 4.etg**	**25 dager**	**on 21.04.21**	**fr 28.05.21**	
66		Gulv 4.etg forarbeid O-U (plast, isopor, armering)	7 dager	on 21.04.21	to 29.04.21	165SS+20 d

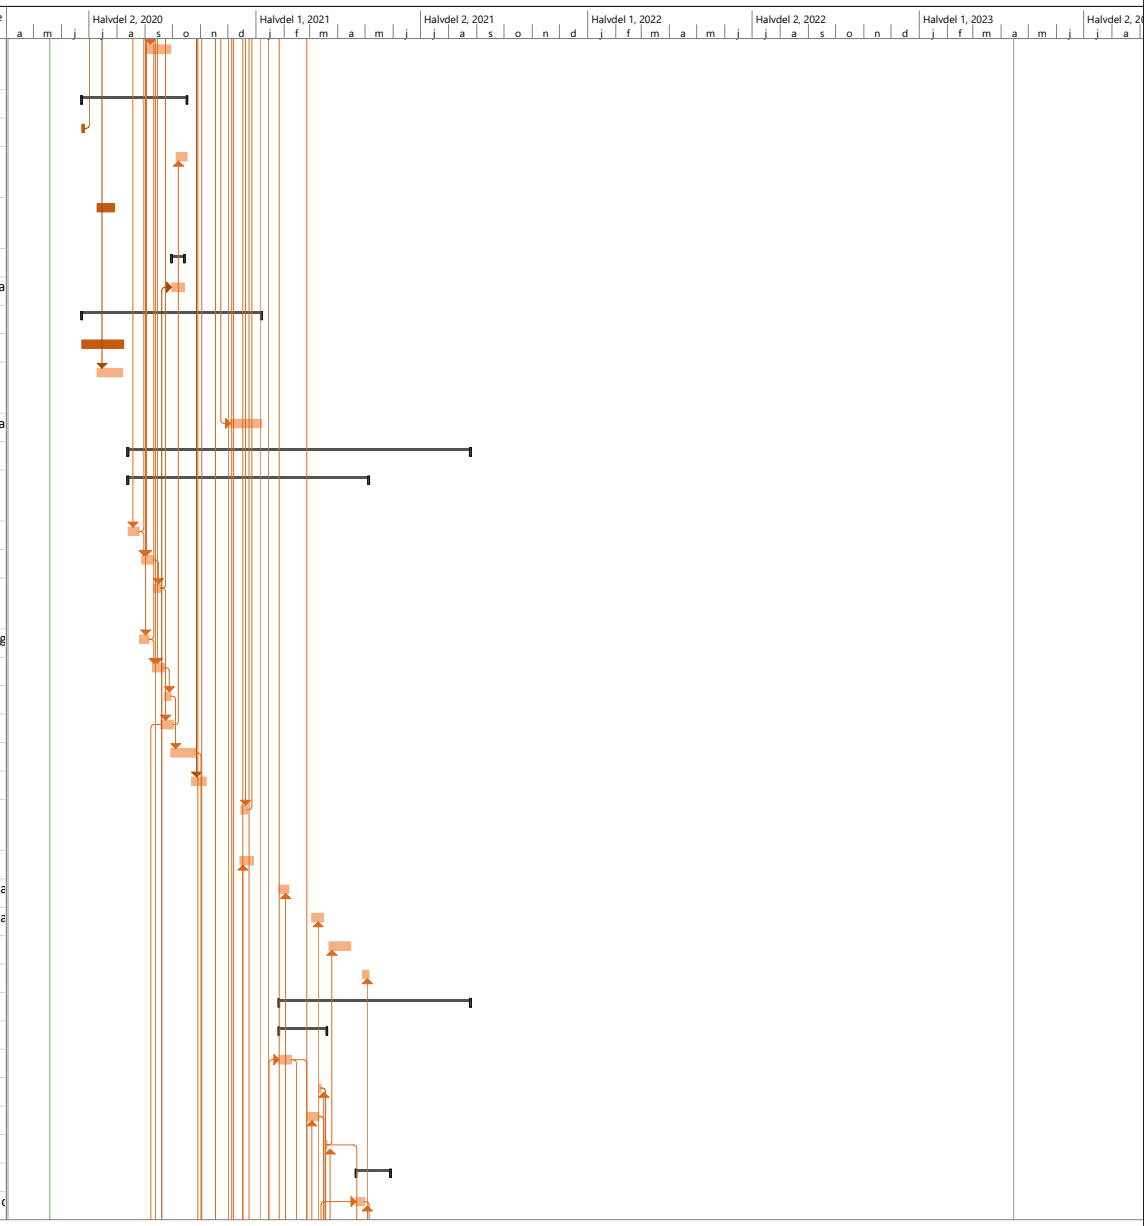

Prosjekt: Fremdriftsplan Nye Fje
Dato: ti 19.05.20

Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist	
Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	
Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl			

Nye Fjelltun skole

ID	Aktivitetsnr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
67		Gulv 4.etg forarbeid H-O (plast, isopor, armering)	7 dager	fr 07.05.21	on 19.05.21	165AS-8 da
68		Gulv 4.etg påstøp O-U	2 dager	to 06.05.21	fr 07.05.21	127
69		Gulv 4.etg påstøp H-O	2 dager	to 27.05.21	fr 28.05.21	128
70		Tynnpuss tekn.rom	3 dager	on 19.05.21	fr 21.05.21	165AS-2 da
71		**Gulv forarbeid og støping 3.etg**	**35 dager**	**on 28.04.21**	**fr 18.06.21**	
72		Gulv 3.etg forarbeid A-E/F (plast, isopor, armering)	7 dager	on 28.04.21	to 06.05.21	166SS+25 d
73		Gulv 3.etg forarbeid E/F-J (plast, isopor, armering)	7 dager	fr 07.05.21	on 19.05.21	72
74		Gulv 3.etg forarbeid J-O (plast, isopor, armering)	7 dager	to 20.05.21	ma 31.05.21	73
75		Gulv 3.etg forarbeid O-U (plast, isopor, armering)	7 dager	ti 01.06.21	on 09.06.21	74
76		Gulv 3.etg påstøp A-E/F	1 dag	fr 14.05.21	fr 14.05.21	130
77		Gulv 3.etg påstøp E/F-J	2 dager	to 27.05.21	fr 28.05.21	131
78		Gulv 3.etg påstøp J-O	4 dager	ma 07.06.21	to 10.06.21	132
79		Gulv 3.etg påstøp O-U	3 dager	on 16.06.21	fr 18.06.21	133
80		**Gulv forarbeid og støping 2.etg**	**26 dager**	**to 10.06.21**	**to 15.07.21**	
81		Gulv 2.etg forarbeid A-E/F (plast, isopor, armering)	7 dager	to 10.06.21	fr 18.06.21	75
82		Gulv 2.etg forarbeid E/F-J (plast, isopor, armering)	5 dager	ma 21.06.21	fr 25.06.21	81
83		Gulv 2.etg forarbeid J-O rest (plast, isopor, armering)	5 dager	ma 28.06.21	fr 02.07.21	82
84		Gulv 2.etg påstøp A-E/F	2 dager	fr 25.06.21	ma 28.06.21	135
85		Gulv 2.etg påstøp E/F-J	4 dager	ma 05.07.21	to 08.07.21	136
86		Gulv 2.etg påstøp J-O rest	4 dager	ma 12.07.21	to 15.07.21	137
87		**Slipte gulv 1.etg, støping og behandling**	**16 dager**	**fr 23.04.21**	**ti 18.05.21**	
88		Forarbeid 1.etg, radon, isopor etc	4 dager	fr 23.04.21	on 28.04.21	163;171AS-
89		Støping 1.etg	4 dager	ti 04.05.21	fr 07.05.21	139
90		Sliping 1.gang 1.etg	2 dager	on 12.05.21	fr 14.05.21	89SS+6 dag
91		Tildekking slipte gulv 1.etg	1 dag	ti 18.05.21	ti 18.05.21	90
92		Sliping 2. gang 1.etg (mot slutten av byggetid. Tidspunkt avklares senere)				
93		**Slipte gulv 2.etg, støping og behandling**	**13 dager**	**fr 16.07.21**	**ti 24.08.21**	
94		Forarbeid 2.etg, radon, isopor etc	4 dager	fr 16.07.21	on 11.08.21	86
95		Støping 2.etg	2 dager	on 18.08.21	to 19.08.21	140
96		Sliping 1.gang 2.etg	2 dager	fr 20.08.21	ma 23.08.21	95
97		Tildekking slipte gulv 2.etg	1 dag	ti 24.08.21	ti 24.08.21	96
98		Sliping 2. gang 2.etg (mot slutten av byggetid. Tidspunkt avklares senere)				
99		**Utvendig gulvstøping takterrasse**	**7 dager**	**on 19.05.21**	**fr 28.05.21**	
100		Isolering og gulvstøp takterrasse	7 dager	on 19.05.21	fr 28.05.21	165AS-2 da
101		**E7 Betong Prefab og stålarbeider (refereres til tegning 234701-XX-B-20-80-001)**	**103 dager**	**to 29.10.20**	**fr 26.03.21**	
102		Del A og B: Prefab søyler 1.etg pkt 5	10 dager	to 29.10.20	on 11.11.20	51AS+2 dag
103		Del A og B: stål 1.etg, deltabjelker for hulldekker DO1 pkt 6	10 dager	ma 09.11.20	fr 20.11.20	102SS+7 da
104		Del A og B: Hulldekke over 1.etg og trapper/repos pkt 7	8 dager	to 26.11.20	ma 07.12.20	103;22
105		Stedstøpte dekkefelter og utstøp hulldekke DOU pkt 7	4 dager	ti 08.12.20	fr 11.12.20	104

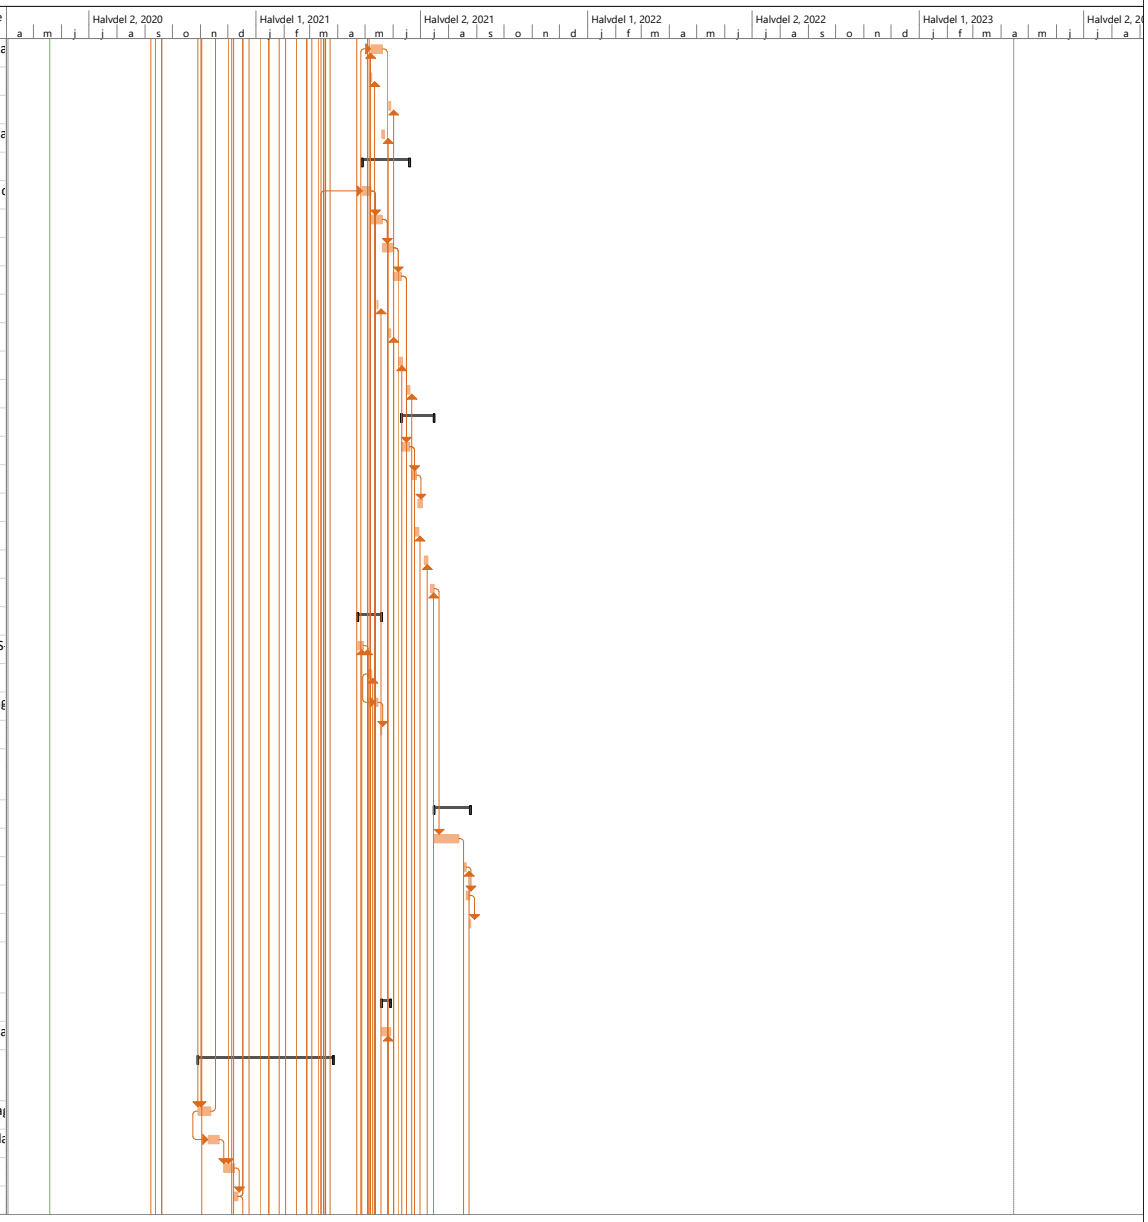

Prosjekt: Fremdriftsplan Nye Fje
Dato: ti 19.05.20

Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist	
Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	
Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl			

Nye Fjelltun skole

ID	Aktivitetsnr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
106		Stål, prefab søyler, gavlvegger, delta bjelker 2.etg pkt 8	11 dager	ma 14.12.20	on 30.12.20	105
107		Vindfang stål pkt 8	10 dager	ma 14.12.20	ti 29.12.20	106SS
108		Hulldekke over 2.etg og trapper repos pkt 9	11 dager	on 06.01.21	on 20.01.21	106AS+1 da
109		Stedstøpte dekkefelter og utstøp hulldekke DO2 pkt 9	5 dager	to 21.01.21	on 27.01.21	108
110		Stål, prefab søyler, gavlvegger, delta bjelker 3.etg pkt 10	12 dager	ti 26.01.21	on 10.02.21	109AS-2 da
111		Hulldekke over 3.etg og trapper/repos pkt 11	11 dager	to 11.02.21	to 25.02.21	110
112		Stedstøpte dekkefelter og utstøp hulldekke DO3 pkt 11	5 dager	fr 26.02.21	to 04.03.21	111
113		Stålramme for lett-tak over 4.etg pkt 12	12 dager	on 03.03.21	to 18.03.21	112AS-2 da
114		Stål for glassfasade pkt 12	7 dager	to 18.03.21	fr 26.03.21	62AS+3 dag
115		**E31, E33 Rør- og sanitærarbeider**	**210 dager**	**on 23.09.20**	**ti 17.08.21**	
116		**Tekniske bunnledninger**	**73 dager**	**on 23.09.20**	**to 07.01.21**	
117		Del A og B: Hovedgrøft bunnledninger	20 dager	on 23.09.20	ti 20.10.20	21SS+2 dag
118		Del A og B: Bunnledninger resterende, radon mm	8 dager	fr 13.11.20	ti 24.11.20	22SS+3 dag
119		Del C: Bunnledninger pkt 7 ref tegning 234701-XX-B-20-001	7 dager	on 16.12.20	ma 28.12.20	23SS+1 dag
120		Del C: Bunnledninger resterende, radon mm	4 dager	ma 04.01.21	to 07.01.21	24SS+1 dag
121		Inspeksjon				
122		**Varmerør gulv på grunn**	**14 dager**	**fr 26.02.21**	**on 17.03.21**	
123		Varmerør gulv på grunn 1.etg	9 dager	fr 26.02.21	on 10.03.21	111;61
124		Varmerør gulv på grunn 2.etg	9 dager	fr 05.03.21	on 17.03.21	63AS-4 dag
125		**Varmerør i gulv**	**63 dager**	**ti 27.04.21**	**ti 17.08.21**	
126		**Varmerør gulv 4.etg**	**19 dager**	**ti 27.04.21**	**on 26.05.21**	
127		Varmerør gulv 4.etg O-U	7 dager	ti 27.04.21	on 05.05.21	66AS-3 dag
128		Varmerør gulv 4.etg H-O	7 dager	fr 14.05.21	on 26.05.21	127;67AS-3
129		**Varmerør gulv 3.etg**	**28 dager**	**ti 04.05.21**	**ti 15.06.21**	
130		Varmerør gulv 3.etg A-E/F	7 dager	ti 04.05.21	on 12.05.21	72AS-3 dag
131		Varmerør gulv 3.etg E/F-J	7 dager	fr 14.05.21	on 26.05.21	130;73AS-3
132		Varmerør gulv 3.etg J-O	7 dager	to 27.05.21	fr 04.06.21	131AS-1 da
133		Varmerør gulv 3.etg O-U	7 dager	ma 07.06.21	ti 15.06.21	132;75AS-3
134		**Varmerør gulv 2.etg**	**18 dager**	**on 16.06.21**	**fr 09.07.21**	
135		Varmerør gulv 2.etg A-E/F	7 dager	on 16.06.21	to 24.06.21	128;81AS-3
136		Varmerør gulv 2.etg E/F-J	7 dager	to 24.06.21	fr 02.07.21	135AS-1 da
137		Varmerør gulv 2.etg J-O rest	6 dager	fr 02.07.21	fr 09.07.21	136AS-1 da
138		**Varmerør for slipte gulv**	**62 dager**	**on 28.04.21**	**ti 17.08.21**	
139		Varmerør for slipte gulv 1.etg	4 dager	on 28.04.21	ma 03.05.21	88AS-1 dag
140		Varmerør for slipte gulv 2.etg	4 dager	to 12.08.21	ti 17.08.21	94
141		**E40,E50 Elektroarbeider**	**123 dager**	**fr 18.09.20**	**ma 15.03.21**	
142		**Tekniske bunnledninger**	**120 dager**	**on 23.09.20**	**ma 15.03.21**	
143		Del A og B: Bunnledninger pkt 4 ref tegning 234701-XX-B-20-001	10 dager	on 07.10.20	ti 20.10.20	117SS+10 d
144		Del A og B: Bunnledninger resterende	8 dager	fr 13.11.20	ti 24.11.20	118SS
145		Del C: Bunnledninger pkt 7 ref tegning 234701-XX-B-20-001	5 dager	to 17.12.20	on 23.12.20	119SS+1 da
146		Del C: Bunnledninger resterende	4 dager	ma 04.01.21	to 07.01.21	120SS
147		Del A og B: Ringjord	20 dager	on 23.09.20	ti 20.10.20	117SS

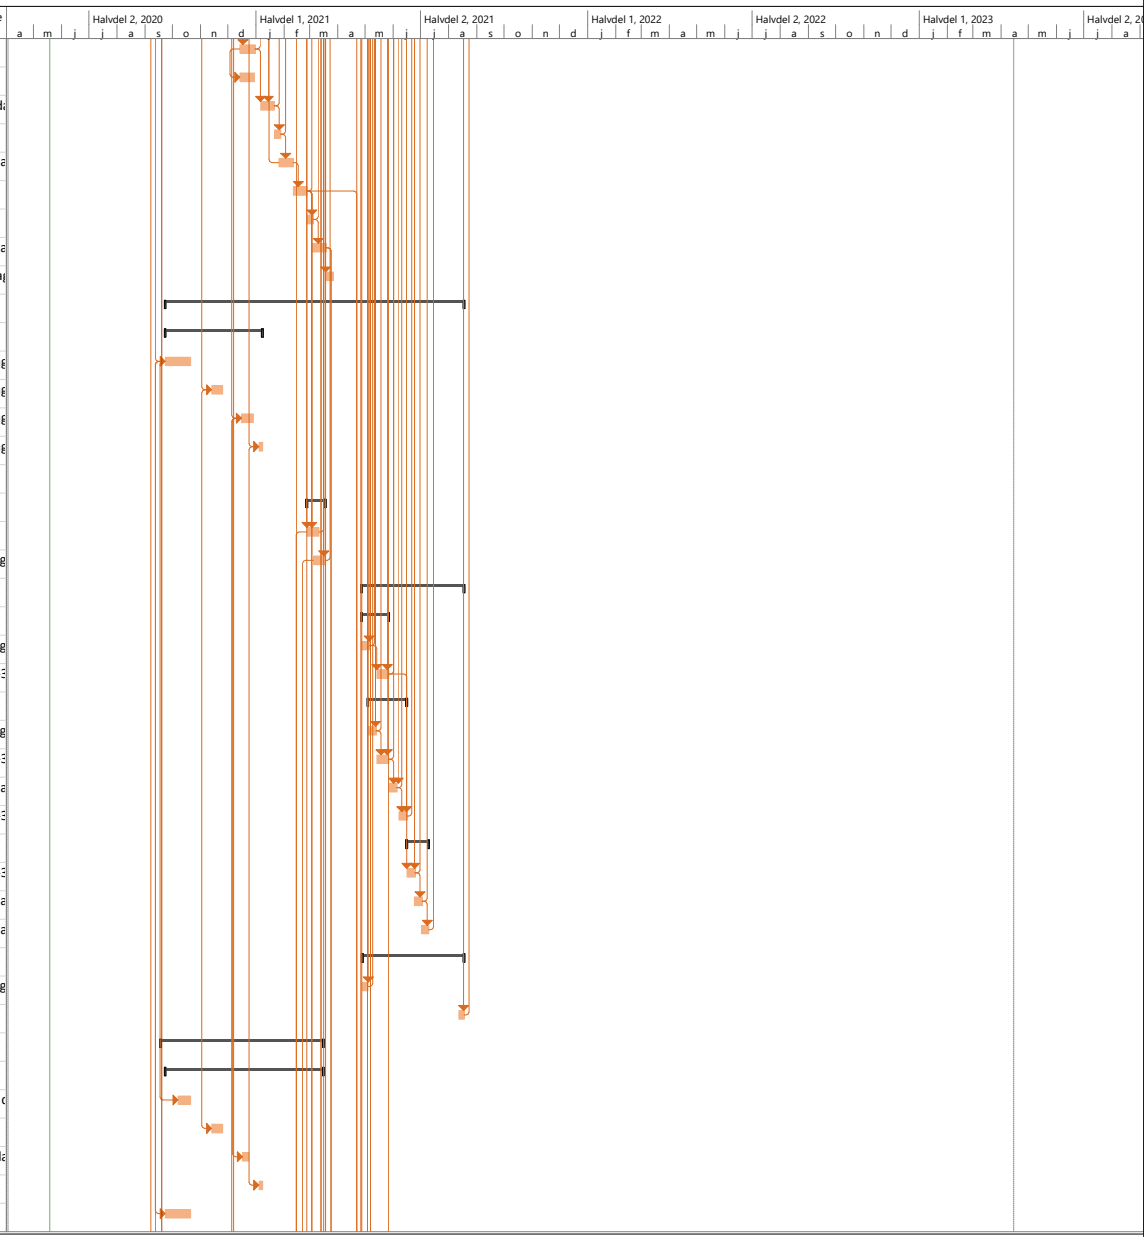

Prosjekt: Fremdriftsplan Nye Fje
Dato: ti 19.05.20

Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist	
Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	
Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl			

Nye Fjelltun skole

ID	Aktivitetsnr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
148		Del C: Ringjord	10 dager	fr 18.12.20	on 06.01.21	20SS
149		Del A og B: Elektroteknisk rørføring i grunn, pkt 4 ref tegning 234701-XX-B-20-001	20 dager	on 23.09.20	ti 20.10.20	117SS
150		Del C: Elektroteknisk rørføring i grunn, pkt 7 ref tegning 234701-XX-B-20-001	10 dager	on 16.12.20	ma 04.01.21	119SS
151		Del A og B: Utgjevningsforbindelse til armering 1.etg	3 dager	ti 09.02.21	to 11.02.21	61
152		Del C: Utgjevningsforbindelse til armering 2.etg	3 dager	to 11.03.21	ma 15.03.21	63
153		**Belysningsanlegg i støttemur**	**10 dager**	**fr 18.09.20**	**to 01.10.20**	
154		Rørføringer og innstøpingsgods i støttemur for utendørs belysningsanlegg 1.etg, pkt 4 ref. tegning 234701-XX-B-20-001	10 dager	fr 18.09.20	to 01.10.20	50SS
155		**Belysningsanlegg takterrasse**	**5 dager**	**fr 26.02.21**	**to 04.03.21**	
156		Rørføringer og innstøpingsgods for utendørs belysningsanlegg takterasse, pkt 11 ref. tegning 234701-XX-B-20-001	5 dager	fr 26.02.21	to 04.03.21	111
157		**Rør i gulv på grunn**	**6 dager**	**to 25.02.21**	**to 04.03.21**	
158		Del A og B: Rørføringer for utendørs snøsmelteanlegg 1.etg	1 dag	to 25.02.21	to 25.02.21	123SS-1 da
159		Del C: Rørføringer for utendørs snøsmelteanlegg 2.etg	1 dag	to 04.03.21	to 04.03.21	124SS-1 da
160		**E12,E17,E18,E19 Tømmer**	**75 dager**	**fr 26.02.21**	**fr 18.06.21**	
161		**E12 Tømrerarbeider**	**73 dager**	**fr 26.02.21**	**on 16.06.21**	
162		**Yttervegg inkl. plating/vindtett duk, strø, vinduer**	**73 dager**	**fr 26.02.21**	**on 16.06.21**	
163		Yttervegg 1.etg og 2.etg, del A og B	25 dager	ma 15.03.21	on 21.04.21	62
164		Yttervegg 2. etg del C	17 dager	to 22.04.21	ti 18.05.21	111;163;16
165		Yttervegger 4.etg. Inkl. gesimser del A og B	40 dager	fr 19.03.21	to 20.05.21	113;168
166		Yttervegger 3.etg del A,B,C	40 dager	fr 19.03.21	to 20.05.21	168
167		Yttervegger 2.etg del A,B,C	20 dager	on 19.05.21	on 16.06.21	164
168		Montere stillas	15 dager	fr 26.02.21	to 18.03.21	17AS-4 dag
169		**E17 Taktekking**	**50 dager**	**on 07.04.21**	**fr 18.06.21**	
170		**Byggelagstekking inkl isolasjon for byggelagstekke**	**15 dager**	**on 07.04.21**	**ti 27.04.21**	
171		Byggelagstekking takterrasse DO2 og tak DO3	15 dager	on 07.04.21	ti 27.04.21	165SS+10 d
172		**Hovedtekking**	**30 dager**	**on 05.05.21**	**fr 18.06.21**	
173		Hovedtekking	30 dager	on 05.05.21	fr 18.06.21	171AS+5 da
174		**E19 Metallarbeider**	**8 dager**	**on 17.03.21**	**fr 26.03.21**	
175		Stålplater tak DO3	8 dager	on 17.03.21	fr 26.03.21	113AS-2 da
176		**E 21 og E22 Maler- og gulvarbeider**	**25 dager**	**ma 01.03.21**	**on 07.04.21**	
177		Støvbinding	25 dager	ma 01.03.21	on 07.04.21	
178		Hovedstrekk, sjakter tekniske fag	49 dager	ma 22.02.21	ti 04.05.21	
179		Råbygg/Tett bygg	0 dager	on 16.06.21	on 16.06.21	162;170
180		Energibrønner	8 dager	to 01.10.20	ma 12.10.20	
181		**Innvendige arbeider**	**476 dager**	**to 22.04.21**	**fr 14.04.23**	
183		Invendige arbeider ferdig	0 dager	fr 14.04.23	fr 14.04.23	182

Prosjekt: Fremdriftsplan Nye Fje
Dato: ti 19.05.20

Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist	
Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	
Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl			
