DEL D

Sørlandet sykehus HF SSA Bygg 101 C fløy høy

| ID | Aktivitetsr | Aktivitetsnavn | Varighet | Start | Slutt | Foregående aktiviteter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Kontraheringsperiode** | **53 dager** | **ma 31.08.20** | **to 12.11.20** | |
| 2 | | Anbudsperiode | 26 dager | ma 31.08.20 | ma 05.10.20 | |
| 3 | | Anbudsfrist | 0 dager | ti 06.10.20 | ti 06.10.20 | |
| 4 | | Kontraheringsperiode | 18 dager | ti 06.10.20 | to 29.10.20 | 3 |
| 5 | | Intensjonserklæringsperic | 8 dager | fr 30.10.20 | ti 10.11.20 | 4 |
| 6 | | Startordre/kontrakt | 0 dager | to 12.11.20 | to 12.11.20 | |
| 7 | | Prosjektering | 41 dager | on 18.11.20 | on 13.01.21 | 6 |
| 8 | | Detaljert fremdriftsplan fra totalentreprenør | 0 dager | fr 04.12.20 | fr 04.12.20 | |
| 9 | | Søknadsgrunnlag fylkesantikvar | 0 dager | on 16.12.20 | on 16.12.20 | |
| 10 | | Forutsatt godkj fylkesantikv: | 0 dager | ma 25.01.21 | ma 25.01.21 | |
| 11 | | Søknadsgrunnlag rammetillatelse | 0 dager | on 02.12.20 | on 02.12.20 | |
| 12 | | Forutsatt igangsettelsestillatelse fra kommunen | 0 dager | ma 25.01.21 | ma 25.01.21 | |
| 13 | | **Utførelse** | **140 dager** | **ma 01.02.21** | **ma 16.08.21** | |
| 14 | | **Aggregater i underkjeller** | **43 dager** | **ma 01.02.21** | **on 31.03.21** | |
| 15 | | Frg 3 | 7 dager | ma 01.02.21 | ti 09.02.21 | 12 |
| 16 | | Frg 4 | 10 dager | ma 01.02.21 | fr 12.02.21 | 12 |
| 17 | | Frg 5 | 7 dager | ma 15.02.21 | ti 23.02.21 | 16 |
| 18 | | Frg 6 | 7 dager | to 25.02.21 | fr 05.03.21 | 17 |
| 19 | | avtrekk 7 | 7 dager | ti 09.03.21 | on 17.03.21 | 18 |
| 20 | | Etterarbeider osv Ukj | 10 dager | to 18.03.21 | on 31.03.21 | 19 |
| 21 | | **Aggregater i ventilasjonsrom tak** | **71 dager** | **ma 01.03.21** | **ma 07.06.21** | |
| 22 | | avag 1 | 7 dager | ma 01.03.21 | ti 09.03.21 | |
| 23 | | avag 2 | 7 dager | on 10.03.21 | to 18.03.21 | 22 |
| 24 | | avag 3A | 7 dager | fr 19.03.21 | ma 29.03.21 | 23 |
| 25 | | avag 3B | 7 dager | ti 06.04.21 | on 14.04.21 | |
| 26 | | avag 4 | 7 dager | to 15.04.21 | fr 23.04.21 | 25 |
| 27 | | avag 5 | 7 dager | ma 26.04.21 | ti 04.05.21 | 26 |
| 28 | | avag 6 | 7 dager | on 05.05.21 | to 13.05.21 | 27 |
| 29 | | Isolataggregat | 7 dager | fr 14.05.21 | ma 24.05.21 | 28 |
| 30 | | Etterarbeider osv ventilasjonsrom tak | 10 dager | ti 25.05.21 | ma 07.06.21 | 29 |
| 31 | | Etasjevise VAV spjeld med etterarbeider | 10 dager | ti 08.06.21 | ma 21.06.21 | 30 |
| 32 | | Dokumentasjon, justering tester osv | 5 dager | ti 22.06.21 | ma 28.06.21 | 31 |
| 33 | | FDV dokumentasjon | 0 dager | to 01.07.21 | to 01.07.21 | |
| 34 | | Overtakelsesforretning med ferdigattest | 0 dager | ma 09.08.21 | ma 09.08.21 | |
| 35 | | Oppstart prøvetid | 0 dager | ma 16.08.21 | ma 16.08.21 | |

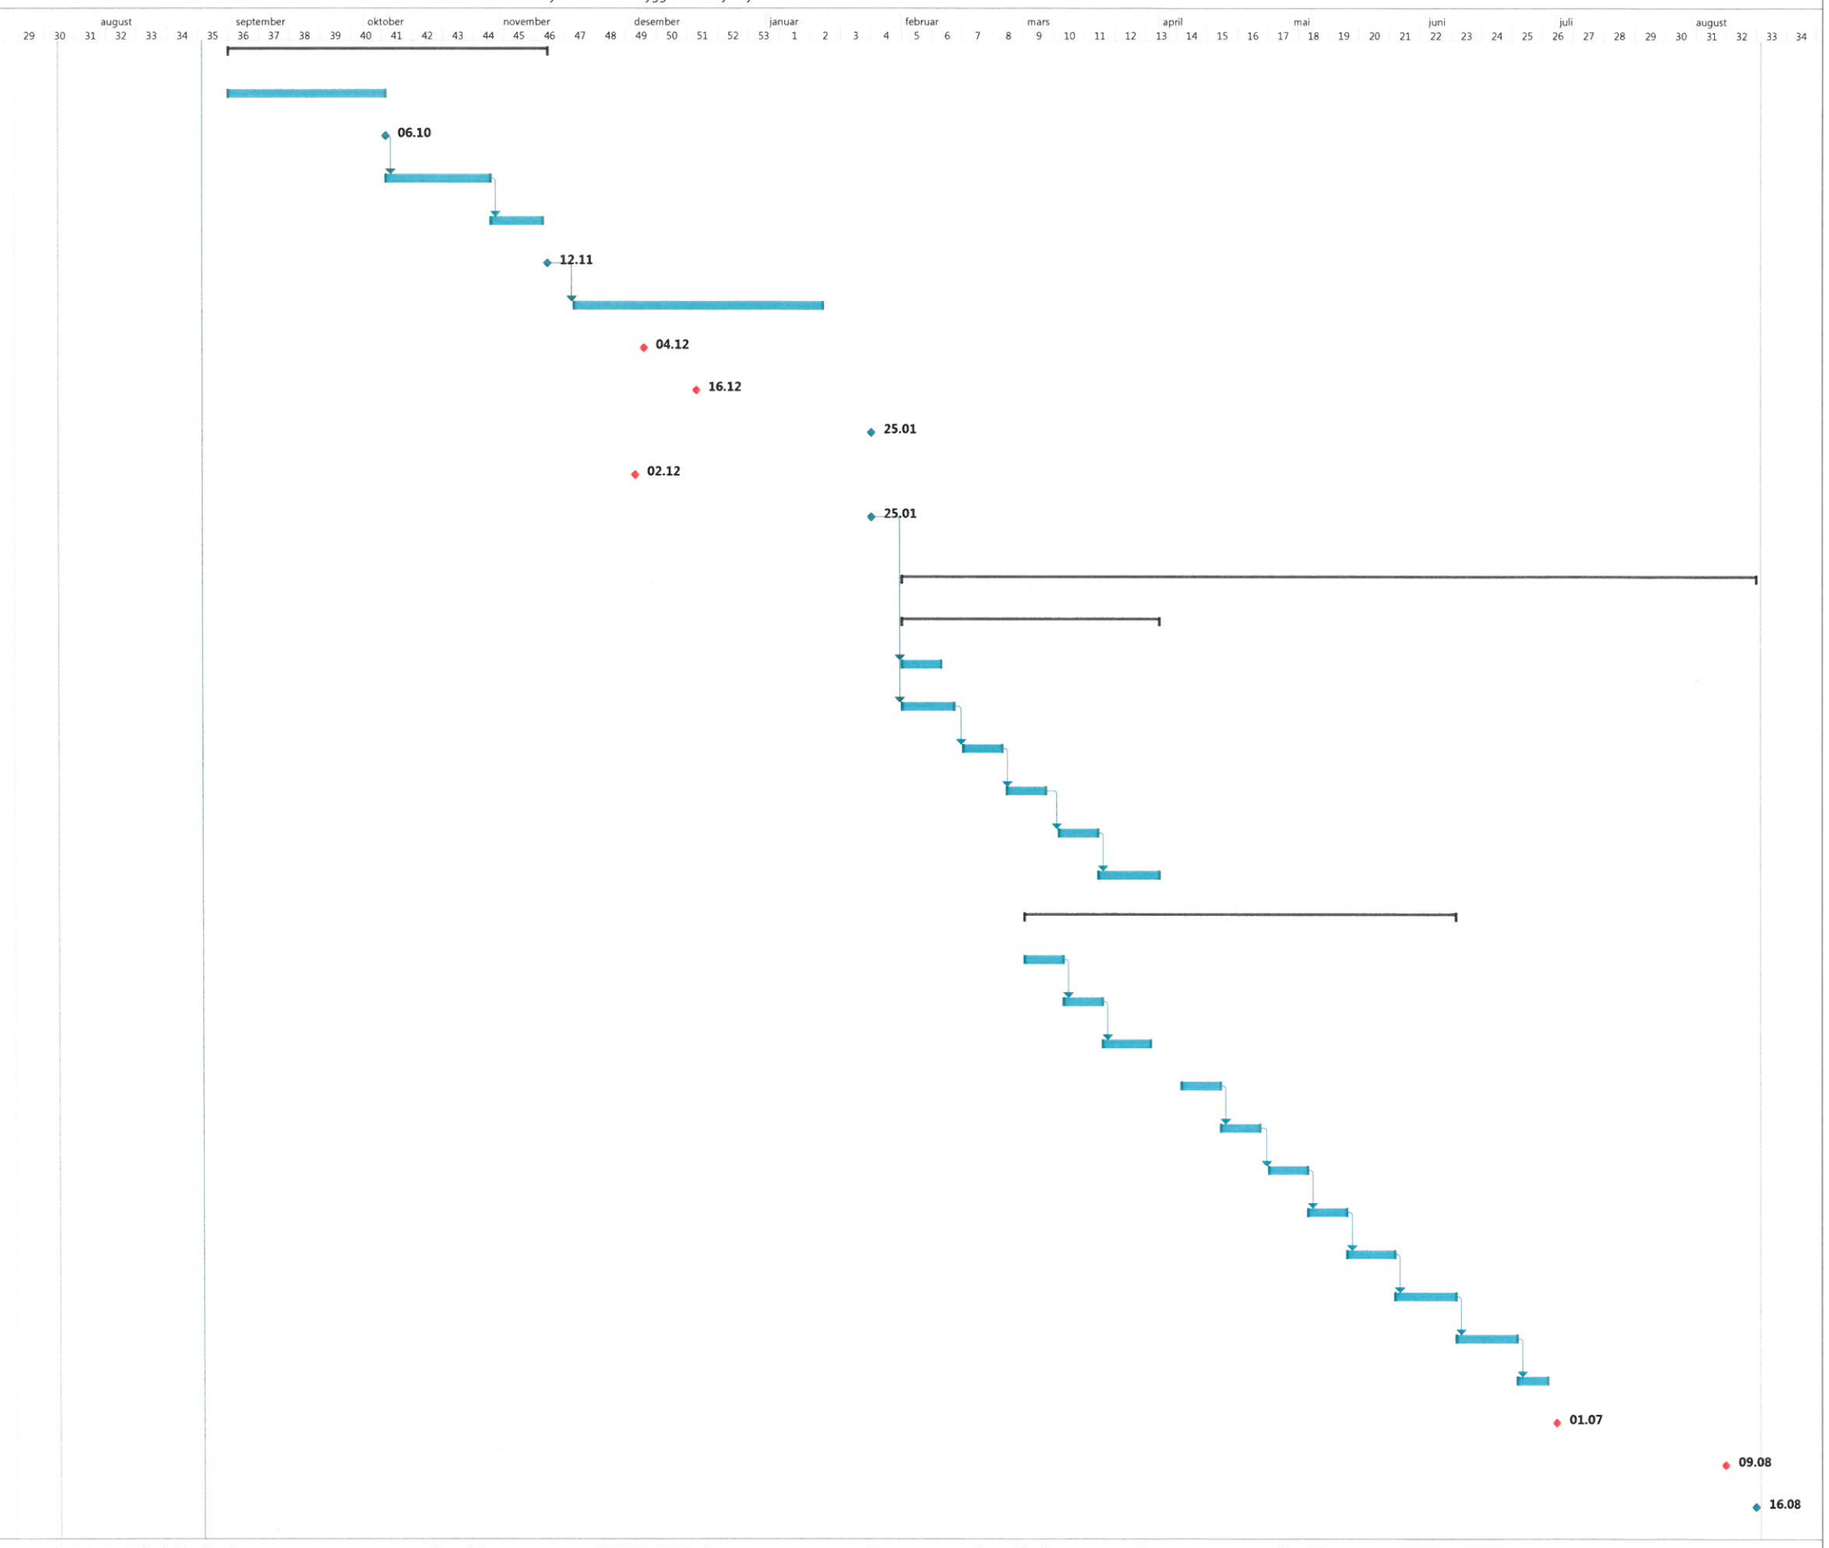


Prosjekt: Skifte vent aggr C fløy
Dato: ti 25.08.20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivitet | Sammendrag | Inaktiv milepæl | Bare varighet | Bare start | Ekstern milepæl | Manuell fremdrift | |
| Deling | Prosjektsammendrag | Inaktivt sammendrag | Manuell sammendragsfremheving | Bare slutt | Tidsfrist | | |
| Milepæl | Inaktiv aktivitet | Manuell aktivitet | Manuelt sammendrag | Eksterne aktiviteter | Fremdrift | | |
