DEL D

Sørlandet sykehus HF SSA Bygg 101 D fløy

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
1		**Kontraheringsperiode**	**60 dager**	**ma 31.08.20**	**ma 23.11.20**	
2		Anbudsperiode	31 dager	ma 31.08.20	ma 12.10.20	
3		Anbudsfrist	0 dager	ma 12.10.20	ma 12.10.20	
4		Kontraheringsperiode	18 dager	ti 13.10.20	to 05.11.20	
5		Intensjonserklæringsperic	8 dager	fr 06.11.20	ti 17.11.20	4
6		Startordre/kontrakt	0 dager	ma 23.11.20	ma 23.11.20	
7		Prosjektering	41 dager	ti 24.11.20	ti 19.01.21	6
8		Detaljert fremdriftsplan fra totalentreprenør	0 dager	ma 04.01.21	ma 04.01.21	
9		Søknadsgrunnlag fylkesantikvar	0 dager	to 17.12.20	to 17.12.20	
10		Forutsatt godkj fylkesantikv.	0 dager	fr 15.01.21	fr 15.01.21	
11		Søknadsgrunnlag rammetillatelse	0 dager	ma 14.12.20	ma 14.12.20	
12		Forutsatt igangsettelsestillatelse fra kommunen	0 dager	fr 15.01.21	fr 15.01.21	
13		**Utførelse**	**106 dager**	**ma 18.01.21**	**ma 14.06.21**	
14		**Aggregater i kjeller D fløy**	**30 dager**	**fr 16.04.21**	**to 27.05.21**	
15		Tilluft etasje kjeller, u c	7 dager	fr 16.04.21	ma 26.04.21	12
16		Ventilasjonsaggregat til B fløy	7 dager	fr 30.04.21	ma 10.05.21	12
17		Etterarbeider osv kjelle	10 dager	fr 14.05.21	to 27.05.21	
18		**Aggregater i ventilasjonsrom tak**	**94 dager**	**fr 15.01.21**	**on 26.05.21**	
19		Kanalarbeider internt i bygget	60 dager	fr 15.01.21	to 08.04.21	12
20		Rive for fundamenter, etablere fundament, etablering av aggregat tak D fløy	5 dager	fr 02.04.21	to 08.04.21	
21		Driftsette ventilasjonsanlegget	3 dager	fr 09.04.21	ti 13.04.21	20
22		Bygningsmessig rundt aggregathus, inntekking osv	10 dager	to 08.04.21	on 21.04.21	20
23		Supplerende arbeider i	14 dager	fr 09.04.21	on 28.04.21	19
24		Etterarbeider osv ventilasjonsrom tak	10 dager	ti 13.04.21	ma 26.04.21	21
25		Innreguleringer	20 dager	to 29.04.21	on 26.05.21	
26		Dokumentasjon, justering tester osv	5 dager	to 27.05.21	on 02.06.21	
27		FDV dokumentasjon	0 dager	to 03.06.21	to 03.06.21	
28		Overtakelsesforretning med ferdigattest	0 dager	ma 21.06.21	ma 21.06.21	
29		Oppstart prøvetid	0 dager	to 01.07.21	to 01.07.21	

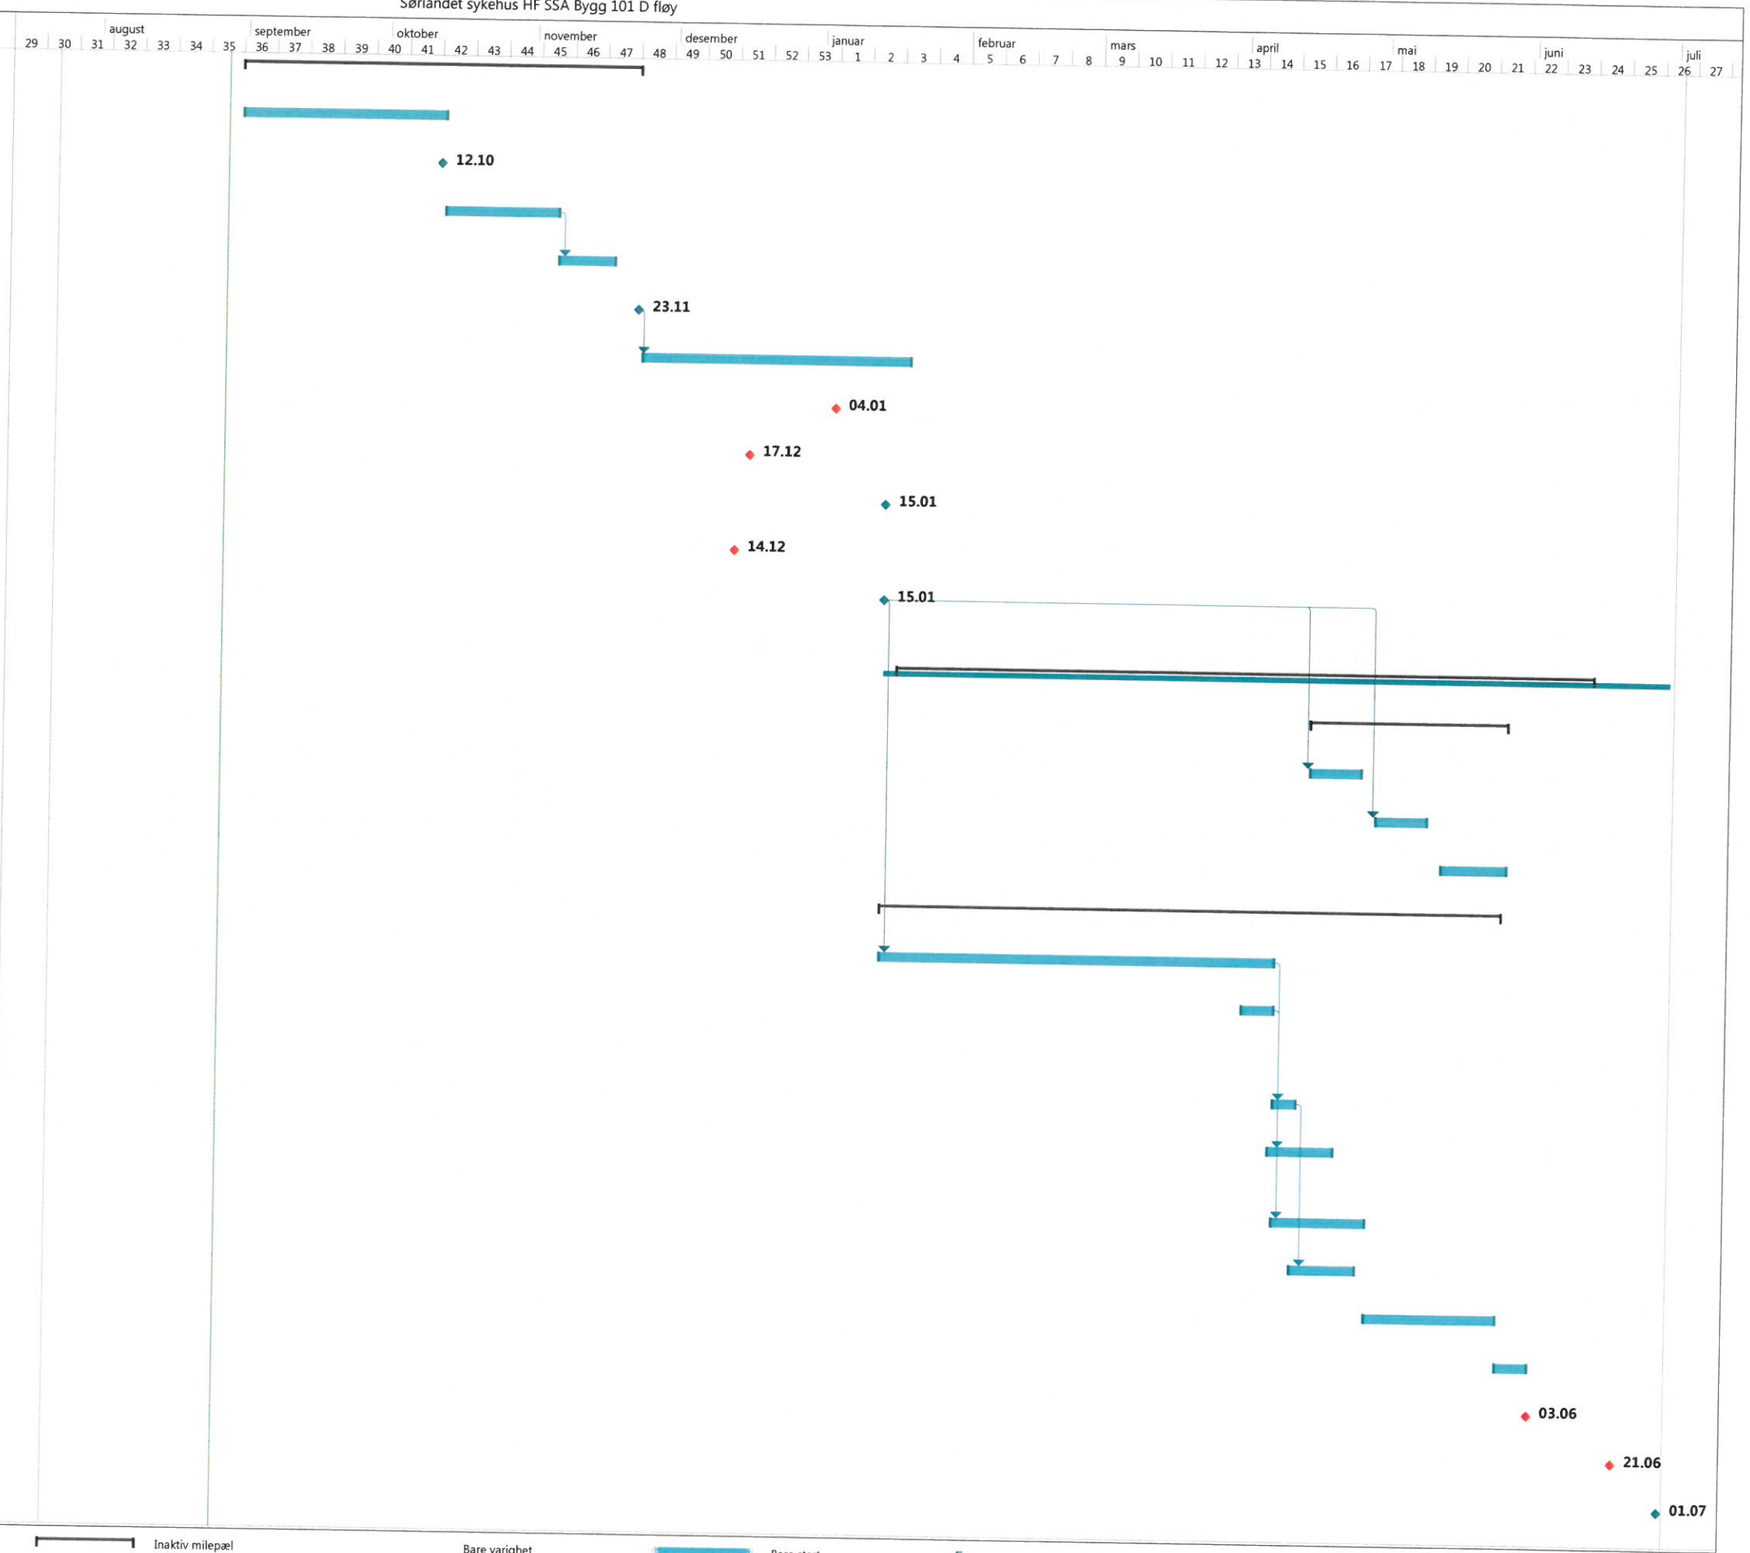

Prosjekt: Skifte vent aggr D fløy
Dato: fr 28.08.20

Aktivitet | Deling | Milepæl | Sammendrag | Prosjektsammendrag | Inaktiv aktivitet | Inaktiv milepæl | Inaktivt sammendrag | Manuell aktivitet | Bare varighet | Manuell sammendragsfremheving | Manuelt sammendrag | Bare start | Bare slutt | Eksterne aktiviteter | Ekstern milepæl | Tidsfrist | Fremdrift | Manuell fremdrift
