Nye Fjelltun skole - Fremdriftsplan innredningsarbeider

Produksjonstog i soner

	Aktivitet	Tid
0	Råbygg	
0.1	Bygelagstekking (3.etasje samtidig med stål 4.etg)	
0.2	Gesimskasser	
0.3	Yttervegger inkl vinduer	
	Tett bygg	

Fargekoding per fag (faggrupper)				
	Maler, gulvlegger	Tekniske fag (el.,rør,vent. om ikke annet er spesifisert)	Tømmer	Taktekker (underlagt tømmer)
	Betong	Elektro	Renhold	Murer
	Rør	Ventilasjon	AV, gardiner	Inventar, IT, innregulering

	Sone 3-1,3-2,3-3,3-4,4-2,2-1,1-1 - Klasseroms soner	
0.4	Støvbinding	2 dager
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping	1 dag + tørket
2.0	Fellesoppheng og hovedstrekk	5 dager
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	25 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampsperre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør,) + branntetting	10 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el) + branntetting	10dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el) + branntetting	15 dager
6.0	Dobling vegger - spesialvegger (spiler, panel)	15dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	10 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	10dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	20dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	10dager
22.0	Trinntorg oppbygging amfi	5dager
22.1	Trinntorg parkett og sliping	5dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider, mont. Lydabsorbenter	10dager
19.0	Utstyrsmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	10 dager
25.0	Sluttrengjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

	Sone 4-1 Naturfag, helsesøster, lager, renholdssentral m.m.	
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping - gulv varmesentral	1 dag + tørketid
2.0	Fellesoppheng og hovedstrekk (i kontinuitet mot sone 4-2)	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	25 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampsperre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør,) + branntetting	10 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el) + branntetting	10dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el) + branntetting	15 dager
6.0	Dobling vegger - spesialvegger (spiler, panel)	15dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	10 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	10dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	20dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	10dager
22.0	Trinntorg oppbygging amfi	5 dager
22.1	Trinntorg (amfi, lesenisje) parkett og sliping	5 dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider	20dager
19.0	Utstyrsmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	10 dager
25.0	Sluttrengjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

	Sone 2-2 kontorer, lærergarderobe, møterom, gang/bro over Amfi (amfi egen sone)	
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping	1 dag + tørketid
2.0	Fellesoppheng og hovedstrekk (i kontinuitet mot sone 2-1)	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	20 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampsperre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør,) inkl. utstikk over bro + bran	10 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el) + branntetting	10dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el) + branntetting	15 dager
6.0	Dobling vegger - spesialvegger (spiler, panel)	15 dager
30.0	Murer stillas og muring av innvendig tegl	15 dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	10 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	10 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	10dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	20dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	10dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider	10dager
19.0	Utstyrsmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	10 dager
25.0	Sluttrengjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

	Sone 2-3 Personalrom, kantinekjøkken, kantine	
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping	1 dag + tørket
1.3	Første pussing kantine	
2.0	Fellesoppheng og hovedstrekk (i kontinuitet mot sone 2-2)	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	15 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampsperre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør,) + branntetting	10dager
4.1	Tekniske fag over himling (el) + branntetting	15 dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el) + branntetting	20 dager
6.0	Dobling vegger inkl spesialvegger (spiler, panel), knevegger, skjørt	15dager
30.0	Innvendig tegl	10 dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	10 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	15dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	20dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg, fliser	10dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider inkl. kjøkkenmontasje	15dager
19.0	Utstyrsmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	15 dager
25.0	Sluttrengjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

	Sone 2-4 Mat og helse, vaskerom, kjølerom, maling/keramikk, sløyd, maskinrom	
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	7 dager
1.1	Varmerør gulv	7 dager
1.2	Gulv støping	1 dag + tørketid
2.0	Fellesoppheng og hovedstrekk (i kontinuitet mot sone 2-3)	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	30 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampsperre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør,) + branntetting	15 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el) + branntetting	15 dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el) + branntetting	20dager
6.0	Dobling vegger inkl spesialvegger (spiler, panel)	20dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	15 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	10 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	20 dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	25dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	15dager
20.0	Parkett sløyd	5 dager
20.1	Slipe parkett	5 dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	15dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider inkl kjøkkenmontasje	20 dager
19.0	Utstyrsmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	15 dager
25.0	Sluttrengjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

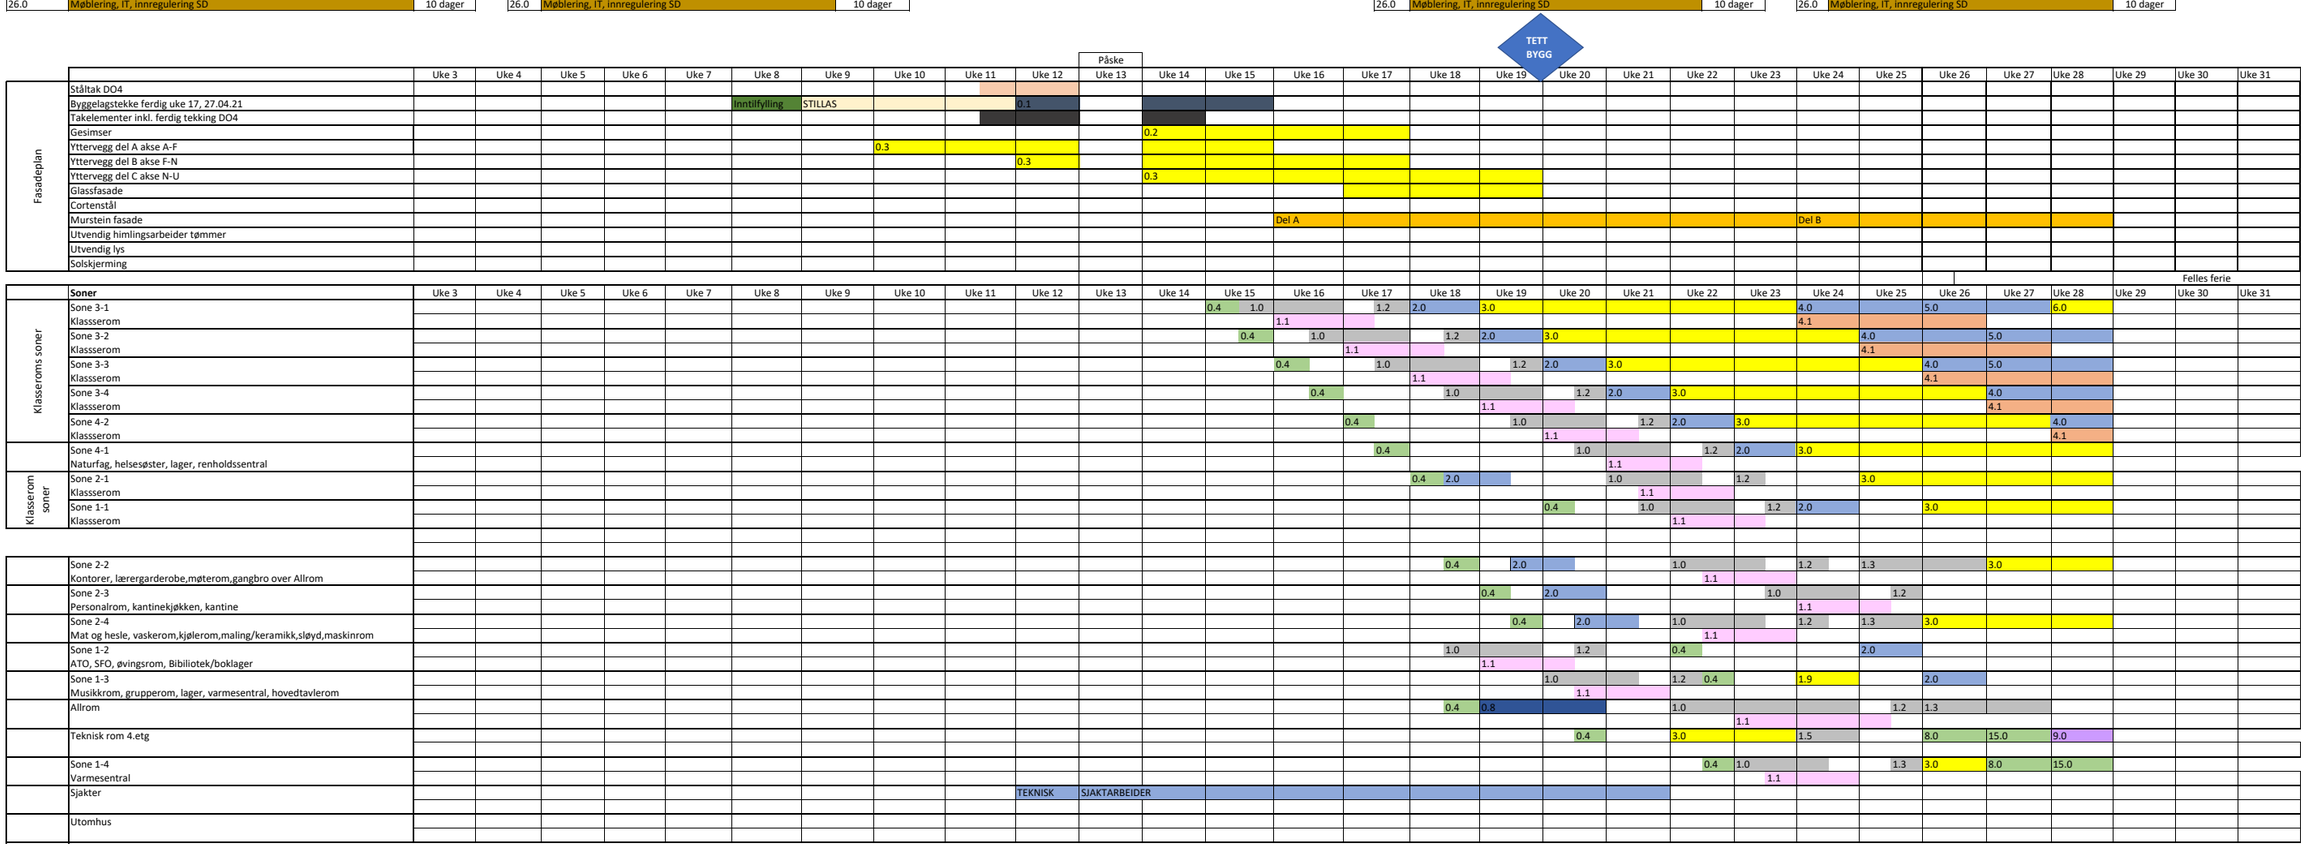

	Sone 1-2 ATO, SFO, øvingsrom, Bibiliotek/boklager	
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	5 dager
1.1	Varmerør gulv	5 dager
1.2	Gulv støping	1 dag + tørketid
2.0	Fellesoppheng og hovedstrekk (i kontinuitet mot sone 1-1)	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	15 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampsperre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør,) + branntetting	10 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el) + branntetting	10 dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el) + branntetting	10dager
6.0	Dobling vegger inkl spesialvegger (spiler, panel)	15dager
30.0	Innvendig tegl	15dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	15 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	5 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	10dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	15dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	10dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider	10dager
19.0	Utstyrsmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	10 dager
25.0	Sluttrengjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

	Sone 1-3 Musikkrom, grupperom, lager, varmesentral, hovedtavlerom	
0.4	Støvbinding	
1.0	Gulv klargjøring	5 dager
1.1	Varmerør gulv	5 dager
1.2	Gulv støping - gulv varmesentral	1 dag + tørketid
1.9	Dobbel himling over musikkrom - øverste lag	5 dager
2.0	Fellesoppheng og hovedstrekk (i kontinuitet mot sone 1-2)	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	10 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampsperre mm.	
3.2	svill	
3.3	stendring	
3.4	plater enkling, dobling over himling	
3.5	hulltaking	
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør,) + branntetting	10 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el) + branntetting	10 dager
5.0	Tekniske fag i vegg (rør, el) + branntetting	10dager
6.0	Dobling vegger inkl spesialvegger (spiler, panel)	20dager
7.0	Sparkling gulver og belegg våtrom/toaletter	5 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	10 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
10.0	Plating baderom	5 dager
11.0	Rammeverk systemhimling	5 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	10dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	15dager
14.0	Montering himlingsplater	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	10dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
17.0	Dører og listing	10dager
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider	10dager
19.0	Utstyrsmontasje (rør, el.) bad, kjøkken, stikkontakt mm.	10 dager
24.0	AV utstyr og gardiner	10 dager
25.0	Sluttrengjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

	Allrom - 1.-2.etg	
0.4	Støvbinding	
0.8	stål i dekke og bro	Før gulv i 3.etg
0.9	Glassfasade	
1.0	Gulv klargjøring inkl. trappegulv	
1.1	Varmerør gulv inkl trappegulv	
1.2	Gulv støping inkl. trappegulv	
1.3	Første pussing gulv	
3.0	Innervegger enkling + yttervegger innvendig	10 dager
3.1	yttervegg innevendig, isolasjon, dampsperre mm.	
3.1	svill	
3.2	stendring	
3.3	plater enkling, dobling over himling	
3.4	hulltaking	
5.0	Tekniske fag i vegg og gulv (rør, el) + branntetting	10dager
6.0	Dobling vegger inkl spesialvegger (spiler, panel)	5 dager
30.0	Innvendig tegl	10 dager
8.0	Sparkling og maling vegger	5 dager
1.4	Andre sliping av gulv	
20.0	Parkett	20 dager
20.1	Slipe parkett	inkl
21.0	Tildekke/bygge over grube, stillas, lift	inkl
4.0	Tekniske fag over himling (vent., rør)+ branntetting	10 dager
4.1	Tekniske fag over himling (el) inkl motor for gardiner + branntetting	15 dager
9.0	Grovrengjøring over himling	
11.0	Rammeverk systemhimling	5 dager
12.0	Tekniske fag i himling (vent., el., rør)+ hulltaking tømmer	10 dager
13.0	El arbeider vegg (utvendig)	10dager
14.0	Montering himlingsplater, spilehimling	10dager
16.0	Rengjøring - klargjør for rød sone	
18.0	Fast innredning og snekkerarbeider	10dager
24.0	AV utstyr og montering gardiner	15 dager
25.0	Sluttrengjøring	
26.0	Møblering, IT, innregulering SD	10 dager

	Teknisk rom 4.etg	
0.4	Støvbinding	
3.0	Enkling mot teknisk rom	10 dager
1.5	Tynnpuss	5 dager
8.0	Sparkling, maling vegg	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	5 dager
9.0	Grovrengjøring	
21.0	Ventilasjon	
22.0	Elektro	
25.0	Sluttrengjøring	

	Varmesentral	
0.4	Støvbinding	
3.0	Enkling mot varmesentral	10 dager
8.0	Sparkling, maling	5 dager
15.0	Sparkling gulver og gulvbelegg	5 dager
9.0	Grovrengjøring	
21.0	Rørarbeider	
22.0	Hovedtavlerom EL og IT	
25.0	Sluttrengjøring	

Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	Uke 41	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50	Uke 51	Uke 52	Uke 53	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10	Uke 11	Uke 12	Uke 13	Uke 14	Uke 15

Sjakter (fra sør)		
S1	Ventilasjon	D01-D03(DO3 må tettes)
S2	EL+IT	1.etg-3.etg
S3	Ventilasjon	D01-D03
S4	Rør, Elektro, Ventilasjon	DO1-4.etg
S5	IT rom	3.etg-4.etg
S6	Ventilasjon	2.etg-4.etg
S7	Elektro	2.etg-4.etg

Uke 16	Uke 17	Uke 18	Uke 19	Uke 20	Uke 21	Uke 22	Uke 23	Uke 24

KLART OVER-LEVERING

Uke 16	Uke 17	Uke 18	Uke 19	Uke 20	Uke 21	Uke 22	Uke 23	Uke 24
