ID		Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1			**Søknad -og tilbudsarbeid**	**107,13 dager**	**ma 09.11.20 07:00**	**to 22.04.21 08:00**
2	✓		Utarbeidelse og behandling av dispensasjonssøknad	20 dager	ma 09.11.20 07:00	fr 04.12.20 15:00
3			Utarbeidelse av beskrivelse	6 dager	to 04.02.21 08:00	fr 12.02.21 08:00
4	✓		Utarbeidelse og behandling av rammesøknad	40 dager	ma 09.11.20 07:00	on 13.01.21 15:00
5	✓		Søknad om arbeidstilsynets samtykke	40 dager	ma 09.11.20 07:00	on 13.01.21 15:00
6			Tilbudsbefaring	0,5 dager	ma 22.02.21 08:00	ma 22.02.21 12:15
7			Tilbudsregning	16 dager	fr 12.02.21 08:00	ma 08.03.21 08:00
8			Utarbeidelse av instilling	2 dager	ma 08.03.21 08:00	on 10.03.21 08:00
9			Karenstid	8 dager	on 10.03.21 08:00	ma 22.03.21 08:00
10			Beslutning og kontraktskriving	5 dager	ma 22.03.21 08:00	ma 29.03.21 08:00
11			Utarbeidelse og behandling igangsettingstillatelse	15 dager	ma 29.03.21 08:00	to 22.04.21 08:00
12			**Eksisterende lager**	**27 dager**	**fr 03.09.21 08:00**	**ti 12.10.21 08:00**
13			Renovering og ny utvendig kledning	10 dager	fr 03.09.21 08:00	fr 17.09.21 08:00
14			Renovering og ny taktekking	10 dager	fr 17.09.21 08:00	fr 01.10.21 08:00
15			Installasjon lys og øvrig EL.	7 dager	fr 01.10.21 08:00	ti 12.10.21 08:00
16			**Nytt lager**	**88 dager**	**to 22.04.21 08:00**	**fr 17.09.21 08:00**
17			Oppskjæring asfalt for fundamentering mot nord	1 dag	to 22.04.21 08:00	fr 23.04.21 08:00
18			Oppskjæring asfalt for fundamentering mot sør og øst	1 dag	ti 08.06.21 08:00	on 09.06.21 08:00
19			Graving for fundamentering mot nord	2 dager	fr 23.04.21 08:00	ti 27.04.21 08:00
20			Graving for fundamentering mot sør og øst	2 dager	on 09.06.21 08:00	fr 11.06.21 08:00
21			Fundamentering mot nord	10 dager	ti 27.04.21 08:00	ti 11.05.21 08:00
22			Fundamentering sør og øst	10 dager	on 16.06.21 08:00	on 30.06.21 08:00
23			Stålarbeid	20 dager	on 30.06.21 08:00	on 18.08.21 08:00
24			Avtaking asfalt/Oppbygging av gulv på grunn	3 dager	fr 11.06.21 08:00	on 16.06.21 08:00
25			Tetting vegg og tak	12 dager	on 18.08.21 08:00	fr 03.09.21 08:00
26			Gulv på grunn	1 dag	ma 06.09.21 08:00	ti 07.09.21 08:00
27			Lys og øvrige EL. Installasjoner	10 dager	fr 03.09.21 08:00	fr 17.09.21 08:00
28			**Diverse**	**54 dager**	**to 22.04.21 08:00**	**ma 02.08.21 08:00**
29			Senking av terreng	10 dager	to 22.04.21 08:00	to 06.05.21 08:00
30			Etablering av støttemur mot vest	8 dager	to 06.05.21 08:00	to 20.05.21 08:00
31			Etablering lasterampe mor eks. takoverbygg	12 dager	to 20.05.21 08:00	ti 08.06.21 08:00
32			Etablering av støttemur mot eks. takoverbygg (hvor det ikke er rampe)	8 dager	ti 08.06.21 08:00	fr 18.06.21 08:00
33			Montasje Lastehus	7 dager	fr 18.06.21 08:00	ti 29.06.21 08:00
34			Oppfylling av terreng for asfaltering	3 dager	ti 29.06.21 08:00	fr 02.07.21 08:00
35			Asfaltering	2 dager	fr 02.07.21 08:00	ti 06.07.21 08:00
36			Montasje av 4stk porter	4 dager	ti 06.07.21 08:00	ma 02.08.21 08:00
37			**Eksisterende produksjonshall**	**39 dager**	**ti 06.07.21 08:00**	**ma 20.09.21 08:00**
38			Demontering/rydding av produksjonslokale	10 dager	ti 06.07.21 08:00	ti 10.08.21 08:00
39			Oppbygging av ca. 480m^2 gulv på gr	12 dager	ti 10.08.21 08:00	to 26.08.21 08:00
40			Avretting nytt gulv på grunn	2 dager	to 26.08.21 08:00	ma 30.08.21 08:00
41			Isolering/armering	3 dager	ma 30.08.21 08:00	to 02.09.21 08:00
42			Legging av varmrør	1 dag	to 02.09.21 08:00	fr 03.09.21 08:00
43			Støp gulv på grunn	1 dag	fr 03.09.21 08:00	ma 06.09.21 08:00
44			Herdepeirode	10 dager	ma 06.09.21 08:00	ma 20.09.21 08:00
45			**Sponavsug**	**10 dager**	**ma 30.08.21 08:00**	**ma 13.09.21 08:00**
46			Graving for fundamentering	1 dag	ma 30.08.21 08:00	ti 31.08.21 08:00
47			Fundamentering	2 dager	ti 31.08.21 08:00	to 02.09.21 08:00
48			Tilfylling utvendig og innvendig	2 dager	to 02.09.21 08:00	ma 06.09.21 08:00
49			Støp av gulv på grunn	1 dag	ma 06.09.21 08:00	ti 07.09.21 08:00
50			Kanaler sponavsug	3 dager	on 08.09.21 08:00	ma 13.09.21 08:00
51			Flytting sponavsug	1 dag	ti 07.09.21 08:00	on 08.09.21 08:00
52			Stålarbeid	2 dager	to 02.09.21 08:00	ma 06.09.21 08:00
53			Tetting vegg og tak	3 dager	ma 06.09.21 08:00	to 09.09.21 08:00
54			El-installasjoner	2 dager	to 09.09.21 08:00	ma 13.09.21 08:00

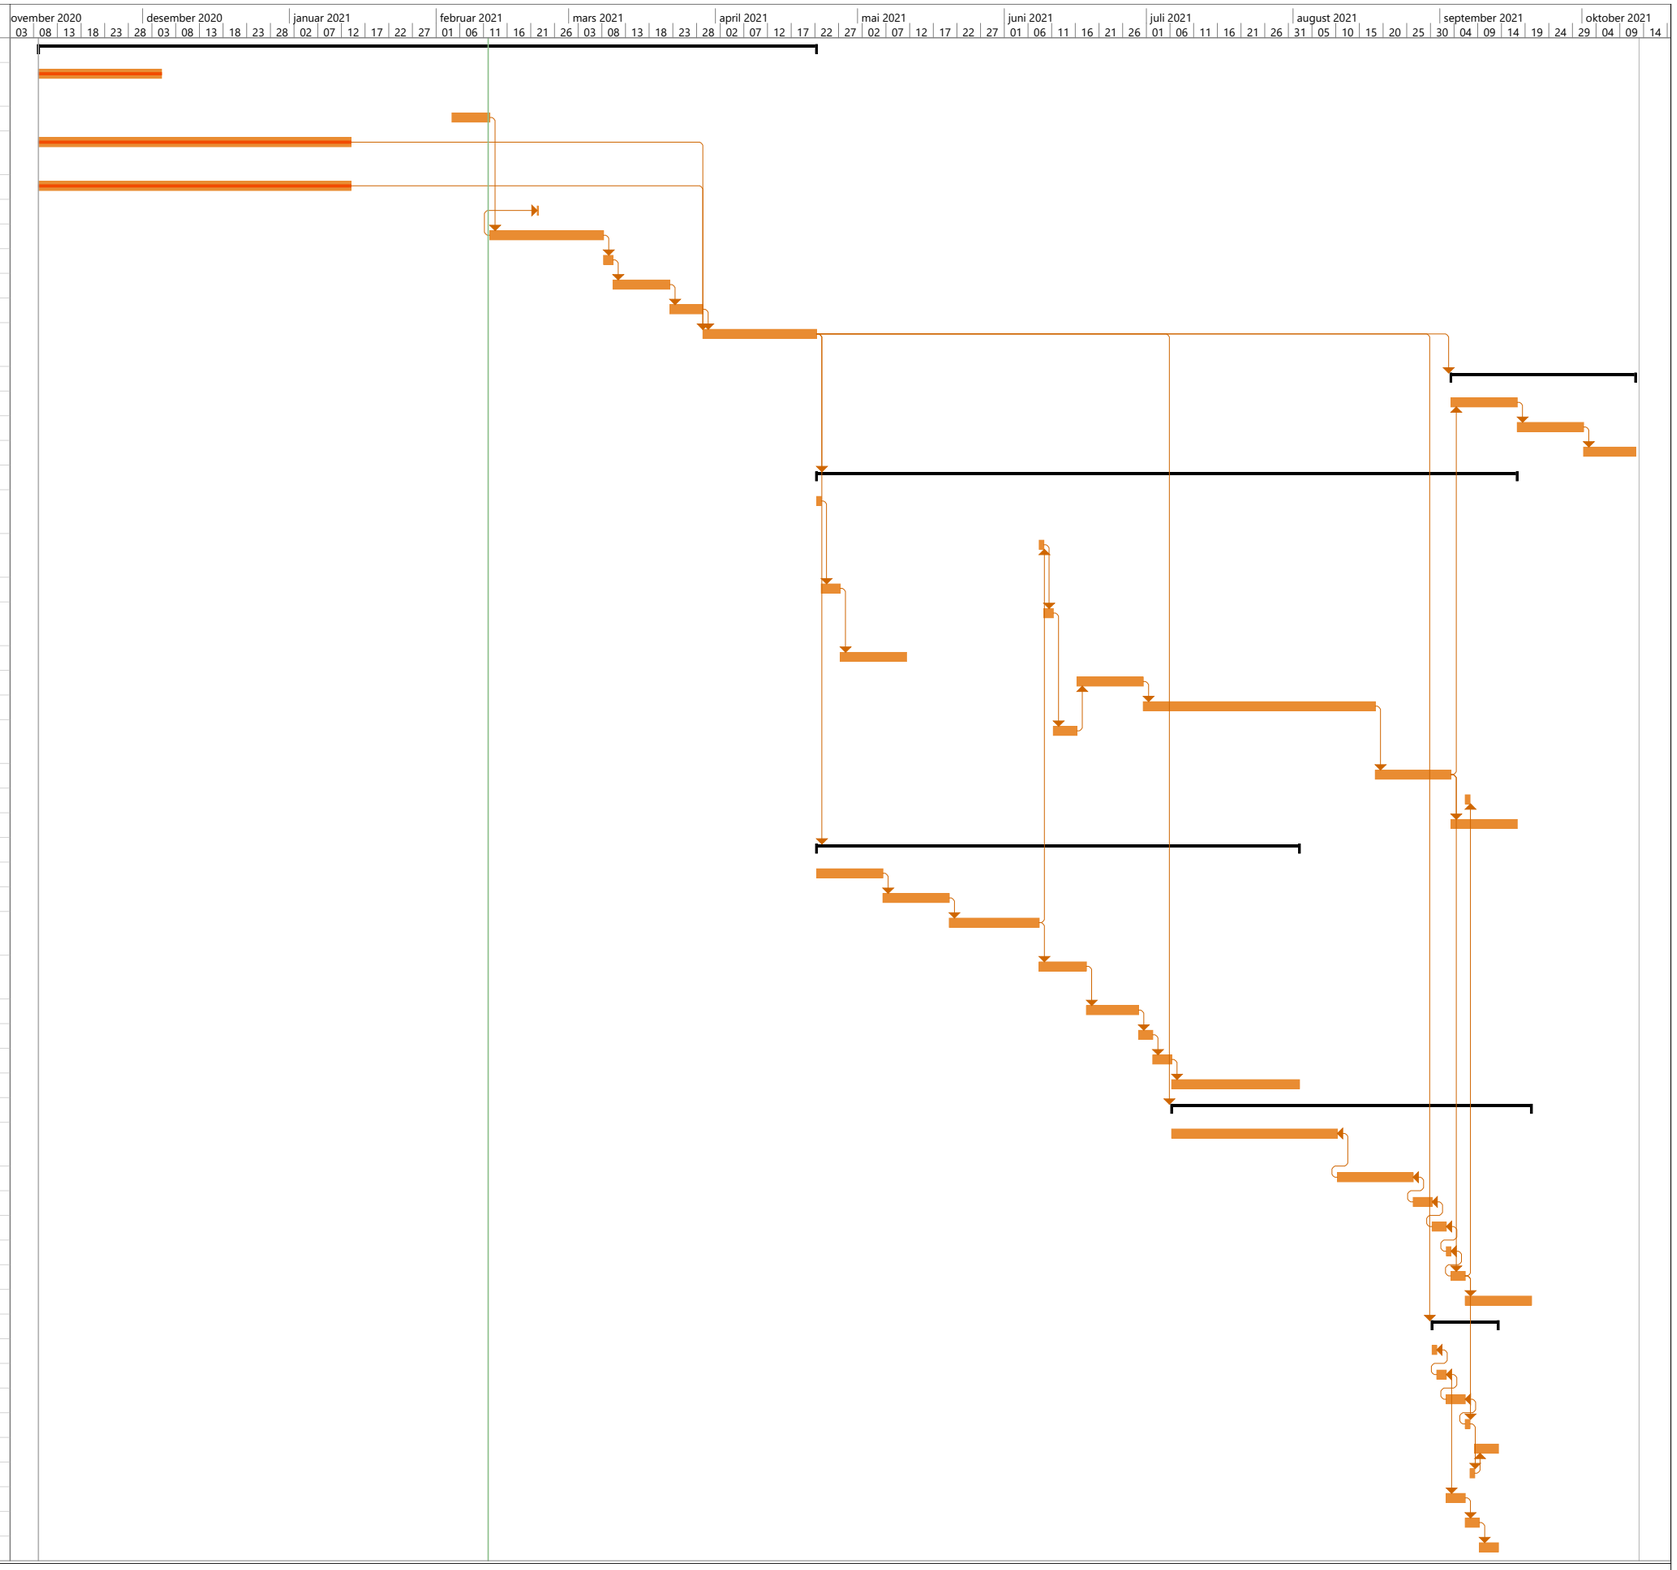

Prosjekt: Simple Project Plan
Dato: fr 12.02.21 08:21

Aktivitet · Deling · Milepæl · Sammendrag · Prosjektsammendrag · Inaktiv aktivitet · Inaktiv milepæl · Inaktivt sammendrag · Manuell aktivitet · Bare varighet · Manuell sammendragsfremheving · Manuelt sammendrag · Bare start · Bare slutt · Eksterne aktiviteter · Ekstern milepæl · Tidsfrist · Fremdrift · Manuell fremdrift
