ID	Aktivit	Task Name	Varighet	Start	Slutt	Fri slakk	Navn på ressurser
1		Prosjektgjennomføring	554 dager?	ti 04.05.21	on 23.08.23	0 dager?	
2		Fase 1 (utløpskanal og sedimentering)	84 dager	fr 14.05.21	ma 04.10.21	84 dager	
3		Utløpskanal (rom 022) og sedimentering 1 (rom 009)	84 dager	fr 14.05.21	ma 04.10.21	84 dager	
5		Arbeider med utkapp og gjennstøping av avdragsrenner (overløpsdrift)	5 dager	fr 14.05.21	on 19.05.21	541 dager	B1
6		Sveise/montere stålplate i stålrenne utløp på innsiden i sed 2 (krever overløpsdrift)	1 dag	fr 21.05.21	fr 21.05.21	0 dager	M1
7		Fjerning av stålrenne og avdragsrenner i sed 1, samt evt. andre rivearbeider	3 dager	ma 24.05.21	on 26.05.21	0 dager	M1
8		Fjerning av stengeplate i kanal	1 dag	to 27.05.21	to 27.05.21	0 dager	M1
9		Evt. demontering av alu.plank (NB! B1 må avklare)	1 dag	fr 28.05.21	fr 28.05.21	534 dager	M1
10		Bygn.messig rehab (est. Varighet) utløpskanal og sed1, utkapp til nye renner i sed 1, kjerneboring til overløp fra nytt rejektvannsbasseng	41 dager	ma 31.05.21	fr 20.08.21	56 dager	B1
11		overflatebehandling rom 005	5 dager	ma 31.05.21	fr 04.06.21	16 dager	B1
12		Sliping av basseng	5 dager	ti 29.06.21	fr 30.07.21	0 dager	B1
13		Overflatebehandling av basseng	10 dager	ma 02.08.21	fr 13.08.21	0 dager	B1
14		Arbeider med utløpskanal - Gjenstøping og utvidelse	5 dager	ma 16.08.21	fr 20.08.21	0 dager	B1
15		Montering av ny stål utløpsrenne og plater ved dagens overløpsslisser	3 dager	ma 23.08.21	on 25.08.21	0 dager	M1
16		Montere luke i kanal, og tette hull over nedløp til basseng for renset avløpsvann, montere rør m/ventil for renset avløpsvann til basseng for renset avløpsvann	1 dag	to 26.08.21	to 26.08.21	0 dager	M1
17		Modifisere flyteslamavdrag med nye spyledyser	3 dager	fr 27.08.21	ti 31.08.21	0 dager	M1
18		Service skraperverk og utskifting av nytt felles hydraulikkaggregat	5 dager	on 01.09.21	ti 07.09.21	0 dager	M1
19		Forlengelse av eksisterende avdragsrenner	3 dager	on 08.09.21	fr 10.09.21	1 dag	M1
20		Montering av flokkuleringsomrører i Flocbee	2 dager	ti 14.09.21	on 15.09.21	0 dager	M1
21		Etablering av midlertidig PAX-dosering for begge sed.linjer	2 dager	to 16.09.21	fr 17.09.21	0 dager	M1
23		Idriftssettelse sed1 og utløpskanal	5 dager	ma 27.09.21	fr 01.10.21	0 dager	M1/Byggherre
24		Anleggsteknisk overtagelse utstyr sed 1	1 dag	ma 04.10.21	ma 04.10.21	0 dager	M1/Byggherre
25		Fase 2 (Sedimentering 2 (rom 010), slamlager 1 (rom 011), CFIC (rom 012 og 013), vaskevannsbasseng (rom 014), basseng for renset avløpsvann (rom015))	168 dager?	on 08.09.21	ma 16.05.22	13 dager?	
26		Rivearbeider gammel flotasjon (rom 108a)	12 dager	ti 05.10.21	on 20.10.21	56 dager	
28		Muslinger med tilhørende utstyr	10 dager	to 07.10.21	on 20.10.21	0 dager	M1
29		Sedimentering 2 (rom 010)	87 dager?	on 08.09.21	fr 14.01.22	56 dager?	
31		Fjerning av stålrenne og avdragsrenne i sed 2, samt evt. andre rivearbeider	2 dager	fr 22.10.21	ma 25.10.21	0 dager	M1
32		Blinding/fjerning av rør fra stålrenne til bufferbasseng	1 dag	ti 26.10.21	ti 26.10.21	0 dager	M1
33		Modifisere flyteslamavdrag med nye spyledyser	3 dager	on 27.10.21	fr 29.10.21	0 dager	M1
34		Service skraperverk og tilkobling nytt felles hydraulikkaggregat	5 dager	ma 01.11.21	fr 05.11.21	0 dager	M1
35		Montering av utløpsrør fra CFIC 1/2 ut gjennom vegg til flokkulering	5 dager	ma 08.11.21	fr 12.11.21	0 dager	M1
36		Montering av flokkuleringsomrører i Flocbee	3 dager	ma 15.11.21	on 17.11.21	0 dager	M1
38		Utkapp i utløpsrenne for nye avdragsrenner/luker (krever overløpsdrift)	1 dag	to 25.11.21	to 25.11.21	0 dager	M1
39		Byggningsmessig rehabilitering av sedimentering 2 (Estimert varighet)	81 dager?	to 16.09.21	fr 14.01.22	394 dager?	B1
40		Arbeider med utkapp og gjennstøping av avdragsrenner (overløpsdrift)	5 dager	to 16.09.21	on 22.09.21	6 dager	B1
41		Sedimenrering 2 Bygg: Rengjøring - Tørketid-Sliping -Overfaltebehandling	36 dager?	fr 01.10.21	fr 19.11.21	428 dager?	B1
42		Hulltaking diverse bygningsmessig	5 dager	fr 22.10.21	to 28.10.21	444 dager	B1
43		Kanalnett i prosesshall bygges til ny layout og kobles på nytt ventilasjonssystem. Kanaler føres innefor vegg i polymerrom og plugges midlertidig.	24 dager?	ma 06.12.21	fr 14.01.22	394 dager?	B1/VVS
44		Avtrekk og tilluft fra eksisterende aggregat fjernes når nytt er igangsatt.	24 dager	ma 06.12.21	fr 14.01.22	394 dager	B1/VVS
45		Punktavsug for CFIC og septikmottak klargjøres. Alle punktavsug mot flater tilkobles.	24 dager	ma 06.12.21	fr 14.01.22	394 dager	B1/VVS
46		Forlengelse av eksisterende avdragsrenner og montering av luker	4 dager	on 08.09.21	ma 13.09.21	0 dager	M1
47		Igangkjøring utstyr i sed.basseng 2	5 dager	fr 26.11.21	to 02.12.21	0 dager	M1/Byggherre
48		Anleggsteknisk overtagelse utstyr sed. basseng 2	1 dag	fr 03.12.21	fr 03.12.21	418 dager	M1/Byggherre
49		Ombygging gammel fortykker (slamlager 1) (rom 011)	99 dager?	on 08.09.21	ti 01.02.22	13 dager?	
52		Evt. rivearbeider i basseng og kjeller	5 dager	ti 12.10.21	ma 18.10.21	452 dager	M1
53		Bygningsmessig rehabilitering inkl. nye hulltakinger (estimert varighet)	70 dager?	ti 19.10.21	ti 01.02.22	382 dager?	B1
54		Bygningsmessig arbeider - rengjøring - tørking rehablilitering	25 dager	ma 27.09.21	fr 29.10.21	443 dager	B1
55		Løftepunkt i take	1 dag?	ma 01.11.21	ma 01.11.21	442 dager?	B1
56		Installasjon av lys og brannvarsling	39 dager	on 01.12.21	ti 01.02.22	382 dager	B1/el
57		Montering av omrører, dekanteringspumpe og nye renner	5 dager	on 08.09.21	ti 14.09.21	0 dager	M1

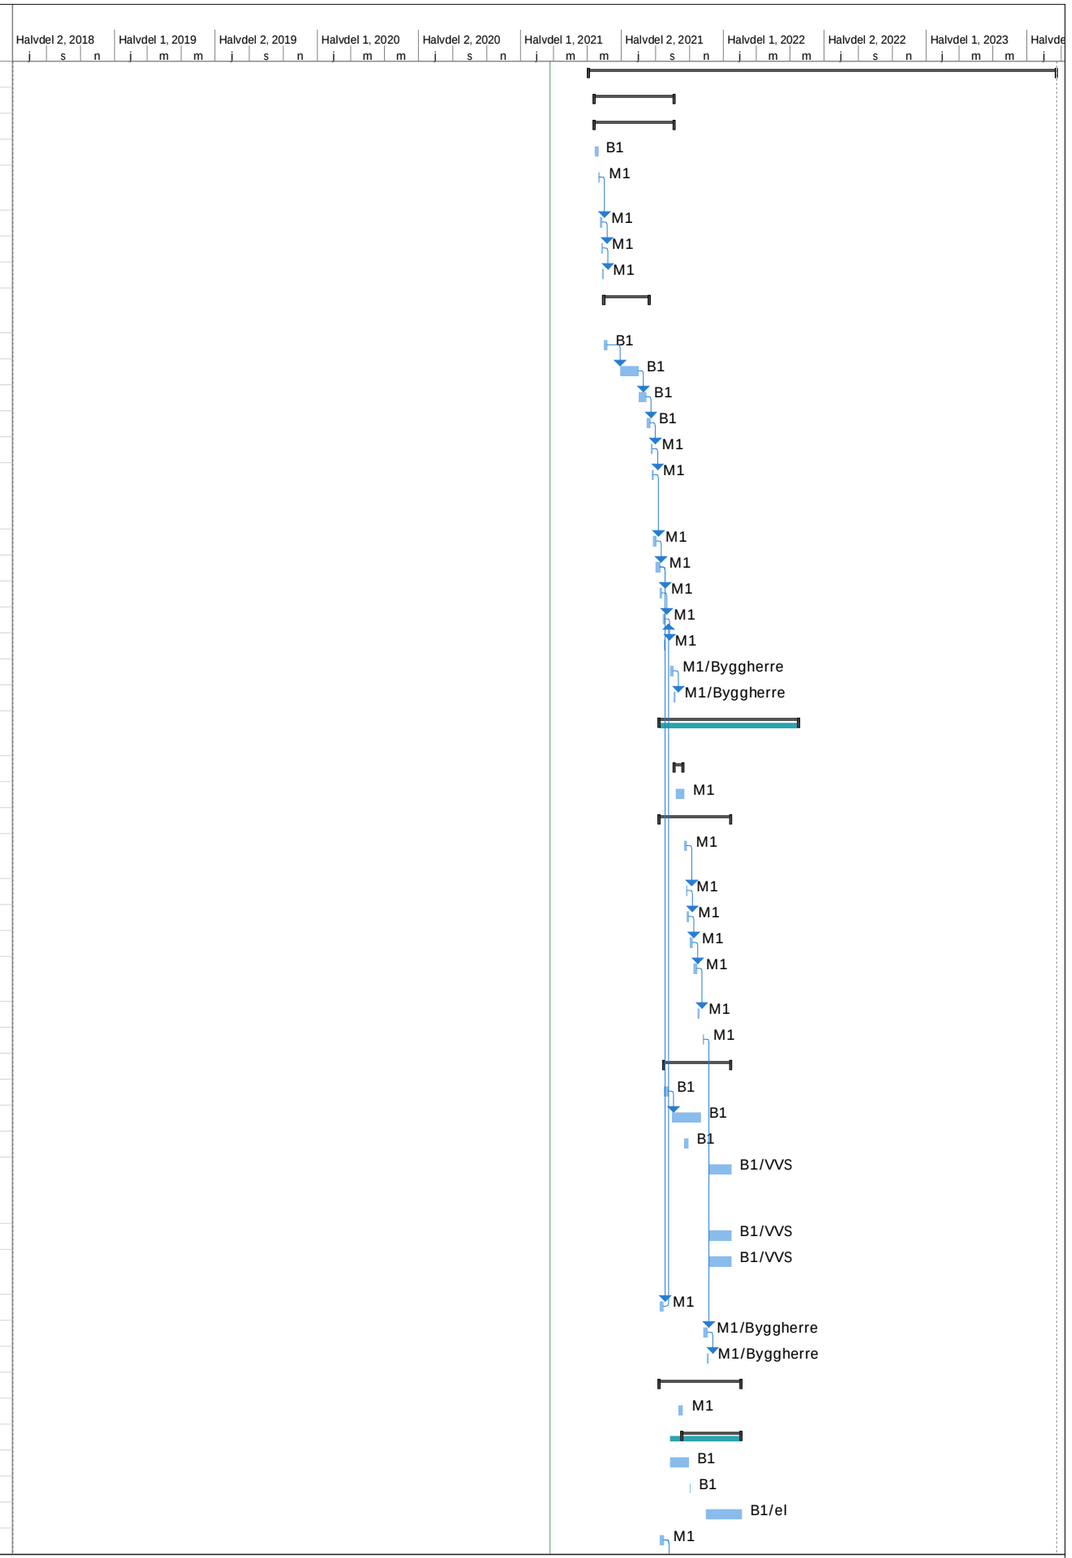

Prosjekt: Gol RA
Date: ti 23.02.21

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Critical | Critical Split | Progress | Manual Progress | Slippage

ID	Aktivit	Task Name	Varighet	Start	Slutt	Fri slakk	Navn på ressurser
58		Montasje av slampumper til fortykkemaskin	4 dager	on 15.09.21	ma 20.09.21	0 dager	M1
59		Diverse rørarbeid	3 dager	ti 21.09.21	to 23.09.21	0 dager	M1
61		Idriftssettelse	3 dager	fr 01.10.21	ti 05.10.21	0 dager	M1/Byggherre
62		Anleggsteknisk overtagelse utstyr slamlager 1	1 dag	on 06.10.21	on 06.10.21	460 dager	M1/Byggherre
63		Ombygging gammelt overløpskammer (nytt basseng for renset avløpsvann)(rom 015)	45 dager	ma 11.10.21	fr 10.12.21	56 dager	
65		Bygningsmessig rehabilitering inkl. nye hulltakinger (estimert varighet)	25 dager	ma 25.10.21	fr 26.11.21	0 dager	B1
66		Bygningsmessig arbeider - rengjøring - tørking - overflatebehandling	25 dager	ma 25.10.21	fr 26.11.21	413 dager	B1
67		Montasje av nye spylevannspumper og tilhørende røropplegg	10 dager	ma 29.11.21	fr 10.12.21	413 dager	M1
68		Ny CFIC og vaskevannsbasseng (rom 012,013 og 014)	105 dager	ma 25.10.21	ma 28.03.22	56 dager	
71		Riving av utstyr i slamlager/slamluftebassenger	3 dager	fr 29.10.21	ti 02.11.21	0 dager	M1
72		Bygningsmessige arbeider i CFIC og nytt vaskevannsbasseng (varighet estimert)	61 dager	on 03.11.21	to 03.02.22	0 dager	B1
73		Rengjøring - riving og tørking	4 dager	on 03.11.21	ma 08.11.21	0 dager	B1
74		Betongarbeider + diverse bygningsmessig	47 dager	ti 09.11.21	to 20.01.22	0 dager	B1
75		Overflatebehandling	10 dager	fr 21.01.22	to 03.02.22	56 dager	B1
76		Mekanisk installasjon i CFIC og vaskevannstank	20 dager	fr 04.02.22	to 03.03.22	0 dager	M1
77		Rørarbeid inn og ut av CFIC	5 dager	fr 04.03.22	to 10.03.22	355 dager	M1
79		I/O-test og rotasjonstest	3 dager	fr 18.03.22	ti 22.03.22	0 dager	M1/El.inst
80		Testing av luftesystem	1 dag	on 23.03.22	on 23.03.22	0 dager	M1
81		Oppfylling av biomedie	2 dager	to 24.03.22	fr 25.03.22	0 dager	M1
82		Etablering av innløp fra ny forbehandling til CFIC	1 dag	ma 28.03.22	ma 28.03.22	0 dager	M1
83		Igangkjøring CFIC og vaskevannsbasseng	30 dager	ti 29.03.22	ma 16.05.22	56 dager	
84		Visual check	5 dager	ti 29.03.22	ma 04.04.22	0 dager	M1
85		I/O-test, rotasjonstest	5 dager	ti 05.04.22	ma 18.04.22	0 dager	M1/El.inst
86		Tørrtest	5 dager	ti 19.04.22	ma 25.04.22	0 dager	M1
87		Våttest	5 dager	ti 26.04.22	ma 02.05.22	0 dager	M1
88		Opplæring	5 dager	ti 03.05.22	ma 09.05.22	0 dager	M1/Byggherre
89		Inntrimming	2 dager	ti 10.05.22	on 11.05.22	0 dager	M1/Byggherre
90		Anleggsteknisk overtagelse	3 dager	to 12.05.22	ma 16.05.22	313 dager	M1/Byggherre
91		Fase 3 (rejektvannsbasseng (rom 019), kjemikalietanker (rom 109a og 016), blåsemaskinrom (rom 020) + slamlager 2 (rom 018), sentrifuge (rom 112)	133 dager?	on 15.09.21	ma 28.03.22	19 dager?	
92		Nye kjemikalietanker (rom 109a og 016)	122 dager	ma 20.09.21	on 16.03.22	351 dager	
94		Pigging av dekke og eksisterende katastrofekar mellom dagens rom 109 og kjellerplan (varighet estimert)	43 dager	ti 12.10.21	to 09.12.21	0 dager	B1
95		Hulltaking dekke - riving av vegger kjeller - tørketid - overflatebehandling	30 dager	ti 12.10.21	ma 22.11.21	6 dager	B1
96		Rivearbeider i plan 1	7 dager	on 01.12.21	to 09.12.21	0 dager	B1
97		Fjerning av gammel kjemikalietank	3 dager	fr 10.12.21	ti 14.12.21	411 dager	M1
98		Støping av nytt katastrofekar i kjeller (varighet estimert)	43 dager	fr 10.12.21	on 16.02.22	348 dager	B1
99		Betongarbeider katastrofekar	9 dager	fr 10.12.21	on 22.12.21	18 dager	B1
100		Bygningsmessige arbeider i rom 017, overflater, golv med fall og fundamenter	16 dager	on 26.01.22	on 16.02.22	0 dager	B1
101		Etablering av transportveg for nye kjemikalietanker (varighet estimert)	5 dager	to 17.02.22	on 23.02.22	0 dager	M1
102		Installering av 2 stk nye kjemikalietanker (10 alternativt 12 m3)	5 dager	to 24.02.22	on 02.03.22	0 dager	M1
103		Kompletterende mekaniske arbeider	10 dager	to 03.03.22	on 16.03.22	0 dager	M1
104		Ombygging av pumpesump til rejektvannsbasseng (rom 019)	30 dager	ti 12.10.21	ma 22.11.21	153 dager	
106		Demontering av mekanisk utstyr	3 dager	ti 02.11.21	to 04.11.21	439 dager	M1
107		Bygningsmessig rehabilitering inkl. nye hulltakinger (estimert varighet)	30 dager	ti 12.10.21	ma 22.11.21	427 dager	B1
108		Bygningsmessig - rengjøring - pigging - tørking - overflatebehandling	29 dager	ti 12.10.21	fr 19.11.21	0 dager	B1
109		Løftepunkt i tak	1 dag	ma 22.11.21	ma 22.11.21	427 dager	B1
110		Installasjon av omrørere og pumper	5 dager	ti 12.10.21	ma 18.10.21	0 dager	M1
111		Kompletterende rørarbeider	5 dager	ti 19.10.21	ma 25.10.21	0 dager	M1
113		Bygningsmessig rehabilitering av nytt blåsemaskinrom (rom 020)	38 dager?	ma 11.10.21	on 01.12.21	119 dager?	B1|
114		Bygningsmessig rehabilitering av verksted og klargjøring for montasje Gjelder bygn.arb i rom 020. Overflater, fundamenter og fall på golv	15 dager	to 04.11.21	on 24.11.21	0 dager	B1
115		Riving og omlegging til nytt kanalnett og rørnett i polymerrom, sentrifuge, fortykkerrom, blåsemaskinrom og rom for kjemikalietanker	33 dager?	ma 11.10.21	on 24.11.21	425 dager?	B1/VVS
116		Elektrisk installasjon	13 dager?	ma 15.11.21	on 01.12.21	420 dager?	B1/el

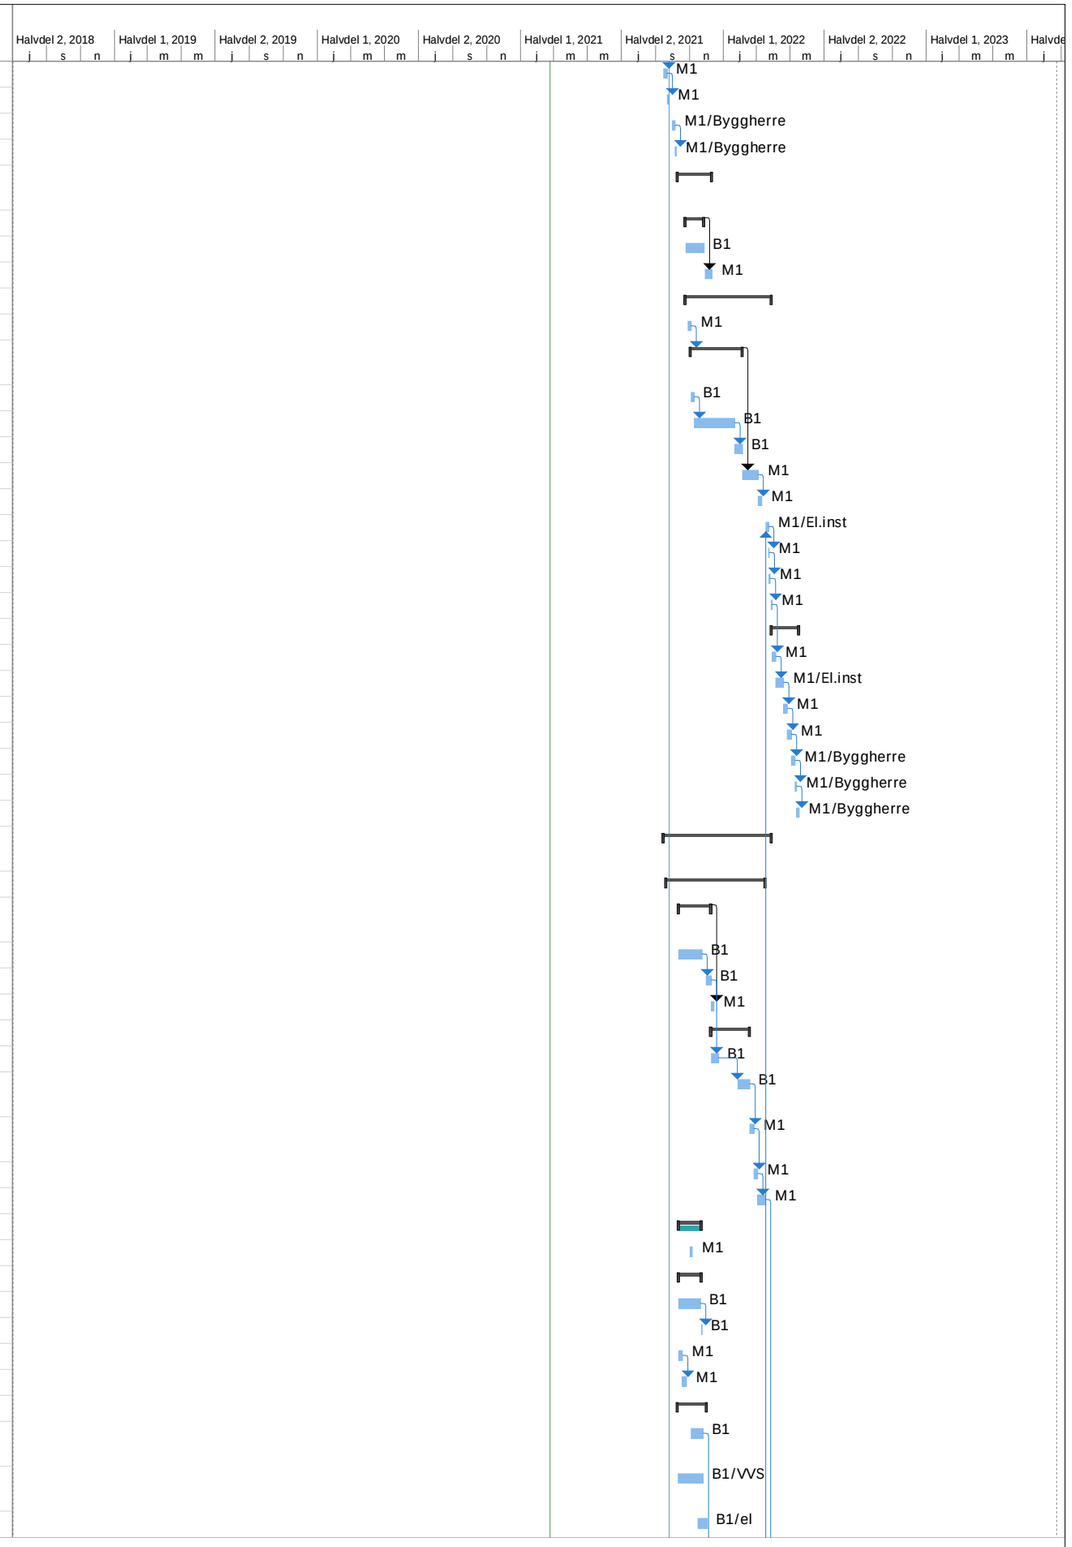

Prosjekt: Gol RA
Date: ti 23.02.21

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Critical | Critical Split | Progress | Manual Progress | Slippage

ID	Aktivit	Task Name	Varighet	Start	Slutt	Fri slakk	Navn på ressurser
117		Etablering av midlertidig plassering av nye polymerberedere	2 dager	to 25.11.21	fr 26.11.21	0 dager	M1
118		Flytting av trykktank for trykkluft	14 dager	ma 29.11.21	to 16.12.21	0 dager	M1
119		Montasje av blåsemaskiner/kompressorer	4 dager	fr 17.12.21	on 22.12.21	45 dager	M1
120		Etablering av midlertidig plassering av fortykkermaskin over slamlager 1	10 dager	on 15.09.21	ti 28.09.21	459 dager	
121		Midlertidige rørinstallasjoner fra sed. pumper til fortykker	2 dager	on 15.09.21	to 16.09.21	0 dager	M1
122		Midlertidig rørinstallasjon rejektvann til kanal foran sedimentering	2 dager	fr 17.09.21	ma 20.09.21	0 dager	M1
123		Etablering av midlertidig polymerdosering (bruke eksisterende?)	2 dager	ti 21.09.21	on 22.09.21	0 dager	M1
124		Installasjon av fortykkermaskin i midlertidig plassering	1 dag	to 23.09.21	to 23.09.21	0 dager	M1
125		Elektrisk tilkobling	2 dager	fr 24.09.21	ma 27.09.21	0 dager	M1
126		Idriftssettelse	1 dag	ti 28.09.21	ti 28.09.21	0 dager	M1
127		Ombygging slamlager 2 (rom 018)	70 dager	on 29.09.21	on 12.01.22	161 dager	
129		Utkobling og bypass slam utenom slamlager 2 fra slamlager 1 til sentrifuge	2 dager	fr 01.10.21	ma 04.10.21	0 dager	M1
130		Evt. rivearbeider i basseng og kjeller	3 dager	ti 05.10.21	to 07.10.21	459 dager	M1
131		Bygningsmessig rehabilitering (estimert varighet)	36 dager	ti 12.10.21	ti 30.11.21	152 dager	B1
132		Bygningsmessig rehabiltering	29 dager	ti 12.10.21	fr 19.11.21	428 dager	B1
133		Løftepunkt i tak	1 dag	ti 30.11.21	ti 30.11.21	0 dager	B1
134		Montasje av nye pumper til sentrifuge	2 dager	on 01.12.21	to 02.12.21	0 dager	M1
135		Montasje av fortykkermaskin	5 dager	fr 03.12.21	to 09.12.21	0 dager	M1
136		Diverse rørarbeid	3 dager	fr 10.12.21	ti 14.12.21	0 dager	M1
138		Bygningsmessig (overflater + golv med fall) i rom 111	10 dager	on 22.12.21	on 12.01.22	396 dager	B1
139		Mekanisk installasjon Sentrifuge (rom 112)	16 dager	ma 07.02.22	ma 28.02.22	84 dager	
140		Utskifting av sentrifuge	4 dager	ma 21.02.22	to 24.02.22	0 dager	M1
141		Elektrisk installasjon	2 dager	fr 25.02.22	ma 28.02.22	363 dager	M1
142		Utskifting av sentrifuge	4 dager	ma 21.02.22	to 24.02.22	0 dager	M1
143		Elektrisk installasjon	2 dager	fr 25.02.22	ma 28.02.22	363 dager	M1
144		Setrifugerom	10 dager	ma 07.02.22	fr 18.02.22	369 dager	B1
145		Utskifting av sentrifuge	4 dager	ma 07.02.22	to 10.02.22	0 dager	M1
146		Elektrisk installasjon	2 dager	fr 11.02.22	ma 14.02.22	0 dager	M1
147		Igangkjøring rejektvannsbasseng, slamlager 2, sentrifuge og kjemikaliedosering	21 dager	ti 15.02.22	ti 15.03.22	84 dager	
148		I/O-test, rotasjonstest	4 dager	ti 15.02.22	fr 18.02.22	0 dager	M1/El.inst
149		Tørrtest	5 dager	ma 21.02.22	fr 25.02.22	0 dager	M1
150		Våt-test	5 dager	ma 28.02.22	fr 04.03.22	0 dager	M1
151		Opplæring	1 dag	ti 15.03.22	ti 15.03.22	352 dager	M1/Byggherre
152		Inntrimming	5 dager	ma 07.03.22	fr 11.03.22	0 dager	M1/Byggherre
153		Anleggsteknisk overtakelse	1 dag	ma 14.03.22	ma 14.03.22	0 dager	M1/Byggherre
154		Flytting av fortykkermaskin til verksted	11 dager	ma 14.03.22	ma 28.03.22	84 dager	
158		Idriftssettelse	1 dag	fr 25.03.22	fr 25.03.22	0 dager	M1/Byggherre
160		Fase 4 (nybygg med forbehandling (rom 001,002, 003, 004, 116, 117,118), riving gammel forbehandling, slampumper sedimentering (rom 006), polymerrom (rom 110), innløpskanal sedimnetering (rom 021)	286 dager?	ti 04.05.21	fr 12.08.22	0 dager?	
161		Nybygg - Vest	170 dager?	ti 04.05.21	fr 28.01.22	0 dager?	B1
162		Byggningsmessige arbeider nytt tilbygg	170 dager	ti 04.05.21	fr 28.01.22	384 dager	B1
163		Arbeider med stål og messanin for ventilasjon	20 dager?	on 15.09.21	ti 12.10.21	456 dager?	B1
164		Legge gulvsluk og rør i støp/gulv	12 dager?	ma 16.08.21	ti 31.08.21	486 dager?	B1/VVS
165		Innheising av kullfilter før stålkonstruksjon.	53 dager?	ti 12.10.21	to 23.12.21	404 dager?	B1/VVS
166		Innheising av aggregat når stålkontsruksjon er ferdig. Før takstoler.	53 dager	ti 12.10.21	to 23.12.21	404 dager	B1/VVS
167		Legge om inntak og avkast fra eksisterende aggregat til personaldel.	53 dager	ti 12.10.21	to 23.12.21	404 dager	B1/VVS
168		Kanalføringer teknisk rom og forbehandlingsrom	53 dager	ti 12.10.21	to 23.12.21	404 dager	B1/VVS
169		Kanalføringer inn i eksisterende del klargjøres.	53 dager	ti 12.10.21	to 23.12.21	404 dager	B1/VVS
170		Avdekking av inntakskabel og flytting av eksisterende høyspentkabel	19 dager?	ti 04.05.21	to 27.05.21	535 dager?	B1
171		El.instalasjon nybygg	76 dager?	on 01.09.21	on 15.12.21	410 dager?	B1/el
172		Installasjon av nytt løfteutstyr	5 dager	ma 31.01.22	fr 04.02.22	0 dager	M1
173		Montering av fordelingskasse	1 dag	ma 07.02.22	ma 07.02.22	0 dager	M1
174		Installasjon av ristkasse og rister	4 dager	ti 08.02.22	fr 11.02.22	0 dager	M1
175		Installasjon av sandfang	4 dager	ma 14.02.22	to 17.02.22	0 dager	M1
176		Installasjon av fettoppsamler	2 dager	fr 18.02.22	ma 21.02.22	0 dager	M1
177		Montasje av blåsemaskiner med tilhørende røropplegg for sandfang	4 dager	ti 22.02.22	fr 25.02.22	0 dager	M1

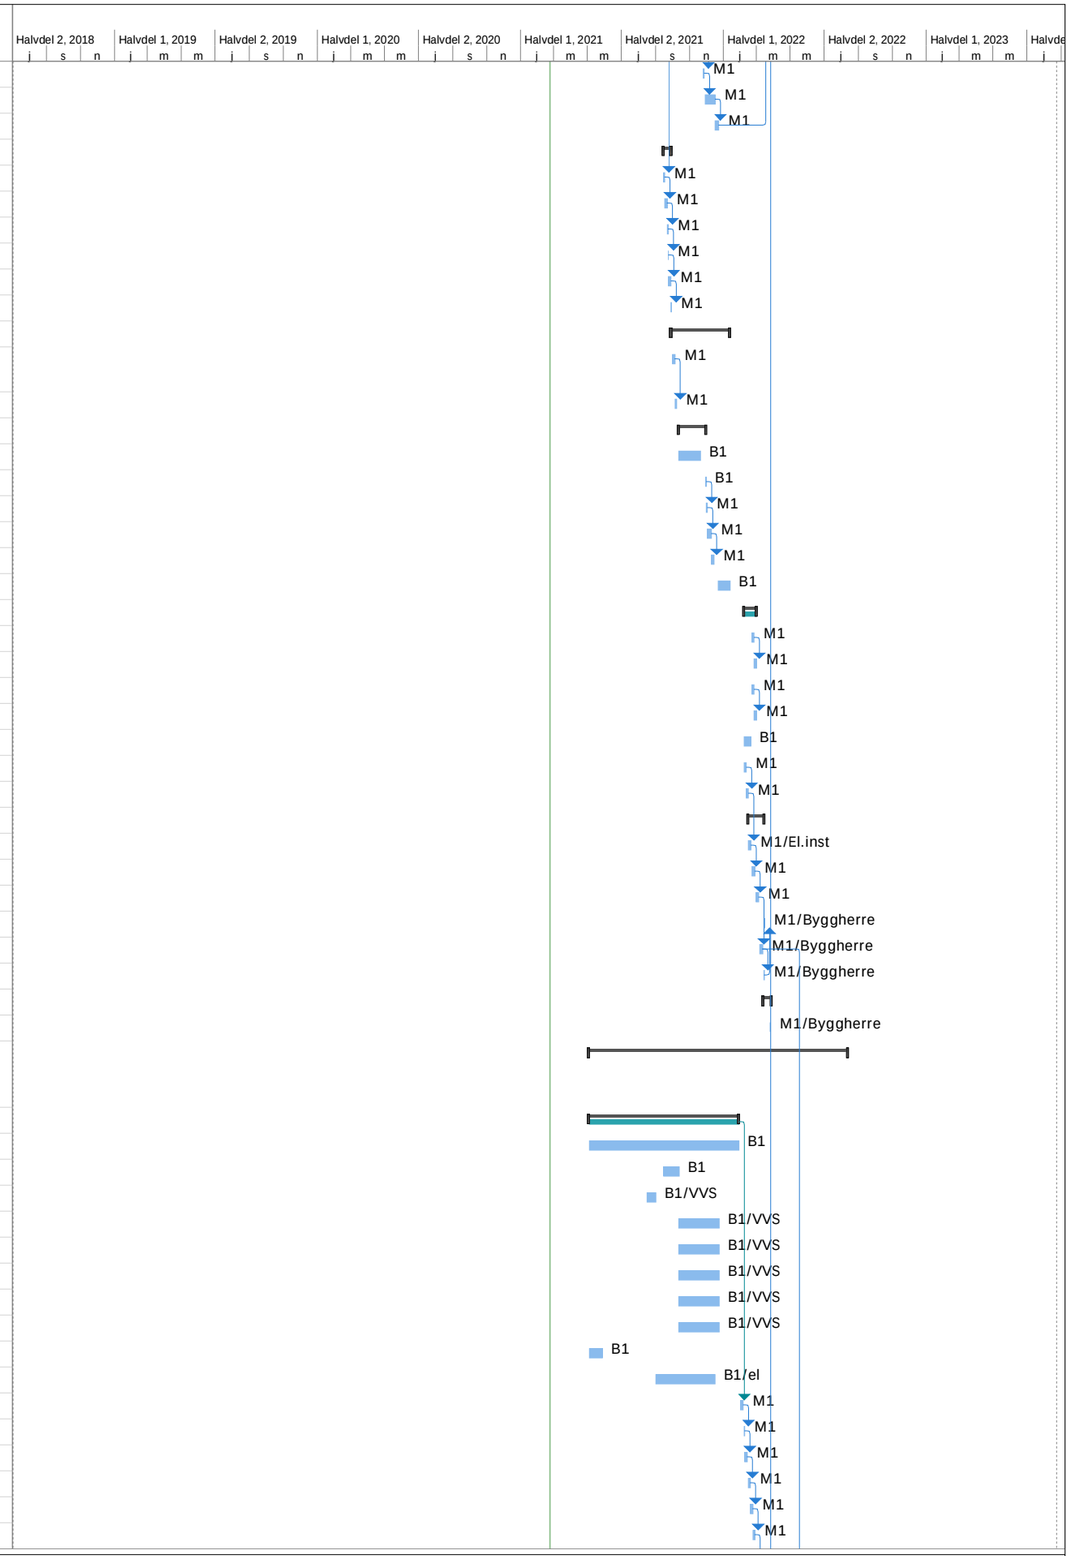

Prosjekt: Gol RA
Date: ti 23.02.21

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Critical | Critical Split | Progress | Manual Progress | Slippage

ID	Aktivit	Task Name	Varighet	Start	Slutt	Fri slakk	Navn på ressurser
178		Installasjon av sandvasker	4 dager	ma 28.02.22	to 03.03.22	0 dager	M1
179		Installasjon av nye sandpumper	2 dager	fr 04.03.22	ma 07.03.22	0 dager	M1
180		Montasje av nye innløpspumper med røropplegg fra innløpskum til ford.kasse	8 dager	ti 08.03.22	to 17.03.22	0 dager	M1
181		Montering av mikser i utjevningsbasseng	1 dag	fr 18.03.22	fr 18.03.22	0 dager	M1
182		Montasje av pumper fra utjevning med røropplegg	8 dager	ma 21.03.22	on 30.03.22	0 dager	M1
183		Kompletterende rørarbeider	10 dager	to 31.03.22	on 20.04.22	0 dager	M1
184		Installasjon av repos/trapp	2 dager	to 21.04.22	fr 22.04.22	0 dager	M1
185		Midlertidig spylevannstilførsel (rent vann)	1 dag	ma 25.04.22	ma 25.04.22	328 dager	M1/Byggherre
188		Igangkjøring ny forbehandling og CFIC	21 dager	to 21.04.22	to 19.05.22	52 dager	
189		I/O-test, rotasjonstest	4 dager	to 21.04.22	ti 26.04.22	0 dager	M1/El.inst
190		Tørrtest	5 dager	on 27.04.22	ti 03.05.22	0 dager	M1
191		Våt-test	5 dager	on 04.05.22	ti 10.05.22	0 dager	M1
192		Opplæring	1 dag	to 19.05.22	to 19.05.22	310 dager	M1/Byggherre
193		Inntrimming	5 dager	on 11.05.22	ti 17.05.22	0 dager	M1/Byggherre
194		Anleggsteknisk overtakelse	1 dag	on 18.05.22	on 18.05.22	0 dager	M1/Byggherre
195		Rivearbeider gammel forbehandling	61 dager?	ma 25.04.22	fr 12.08.22	268 dager?	
197		Sandfang	2 dager	fr 20.05.22	ma 23.05.22	0 dager	M1
198		Blåsemaskinrom	2 dager	ti 24.05.22	on 25.05.22	0 dager	M1
199		Eksisterende innløpsrister	2 dager	to 26.05.22	fr 27.05.22	304 dager	M1
200		Riving av rør/kasser i kjeller	4 dager	on 18.05.22	ma 23.05.22	0 dager	M1
201		Bygningsmessig rehabilitering av kanal mellom luker (overløpsdrift/bypass sedimentering)	31 dager?	ti 24.05.22	ma 01.08.22	268 dager?	B1
202		Overflatebehandling av kjellerrom - rom 006-008	20 dager	ti 24.05.22	ma 20.06.22	0 dager	B1
203		Nye pumpefundamenter	7 dager	ti 21.06.22	on 29.06.22	0 dager	B1
204		Understøp av pumpefundamenter	4 dager?	to 30.06.22	ma 01.08.22	0 dager?	B1
205		Montering av miksekasse og sammenkobling rør	3 dager	ti 02.08.22	to 04.08.22	0 dager	M1
206		Montering av nye PAX-omrørere i miksekasse	1 dag	fr 05.08.22	fr 05.08.22	0 dager	M1
207		Montasje av nye slampumper med røropplegg for sedimentering	5 dager	ma 08.08.22	fr 12.08.22	268 dager	M1
209		Bygningsmessig rehabilitering nytt polymerrom	38 dager?	ma 25.04.22	on 15.06.22	291 dager?	B1
210		Riving av eksisterende ventilasjonsaggregat og kanaler i polymerrom.	5 dager?	ma 25.04.22	fr 29.04.22	324 dager?	B1/VVS
211		Ny fangdam - overflatebehandling - div bygningsmessig	12 dager	ma 02.05.22	ti 17.05.22	0 dager	B1
212		Ny kledning vegger - maling tak	10 dager	on 18.05.22	ti 31.05.22	302 dager	B1
213		El.installasjon	23 dager?	ma 16.05.22	on 15.06.22	291 dager?	B1/el
214		Flytting av polymerberedere og komplettering av installasjon	5 dager	to 26.05.22	on 01.06.22	301 dager	M1
215		Ny utvendig innløpskum/innløpsledning og overløpsledning til utløpskum	35 dager	ti 04.05.21	fr 18.06.21	519 dager	B1
216		Graving og legging av ny innløpskum og innløpsledning til anlegget (varighet estimert)	15 dager	ti 04.05.21	fr 21.05.21	0 dager	B1
217		Graving og legging av ny overløpsledning utenom anlegget (varighet estimert)	20 dager	ma 24.05.21	fr 18.06.21	519 dager	B1
218		Legging av overløp til grensesnitt veggliv (varighet estimert)	2 dager	ma 24.05.21	ti 25.05.21	537 dager	B1
219		Fase 5 septikslamlager (rom 007) og septikmottak (rom 108b))	67 dager?	to 28.04.22	to 25.08.22	36 dager?	
220		Mekanisk installasjon Septikmottak (rom 108b) og septikslamlager (rom 007)	67 dager?	to 28.04.22	to 25.08.22	36 dager?	
221		Bygningsmessige arbeider inkl. fjerning av fundament (antatt varighet)	59 dager	to 28.04.22	ma 15.08.22	36 dager	B1
222		Septikslamlager: rengjøring - gjenstøping i bunn - tørketid - ...	25 dager	to 28.04.22	on 01.06.22	0 dager	B1
223		Riving og bygge rom for septik inkl gjenstøping golv med fall og nye vegger	25 dager	to 28.04.22	on 01.06.22	301 dager	B1
224		Bygn.arb. For golvoverflater i prosesshall:	12 dager	fr 17.06.22	fr 08.07.22	0 dager	B1
225		Tilkobling av punktavsug	2 dager	fr 12.08.22	ma 15.08.22	267 dager	B1/VVS
226		Mekanisk installasjon septikmottak og septikslamlager	10 dager	ma 01.08.22	fr 12.08.22	0 dager	M1
228		Idriftssettelse	3 dager	ma 22.08.22	on 24.08.22	0 dager	M1/Byggherre
229		Anleggsteknisk overtagelse septikmottak	1 dag?	to 25.08.22	to 25.08.22	259 dager?	M1/Byggherre
230		Elektrisk installasjon	285 dager	ma 10.05.21	on 17.08.22	265 dager	
235		Elektro installasjon eksisterende bygg	285 dager	ma 10.05.21	on 17.08.22	265 dager	
236		Installasjon PAX påfyllingskap	3 dager	to 17.03.22	ma 21.03.22	348 dager	M1
237		Installasjon Septik påfyllingskap	3 dager	ma 15.08.22	on 17.08.22	265 dager	M1

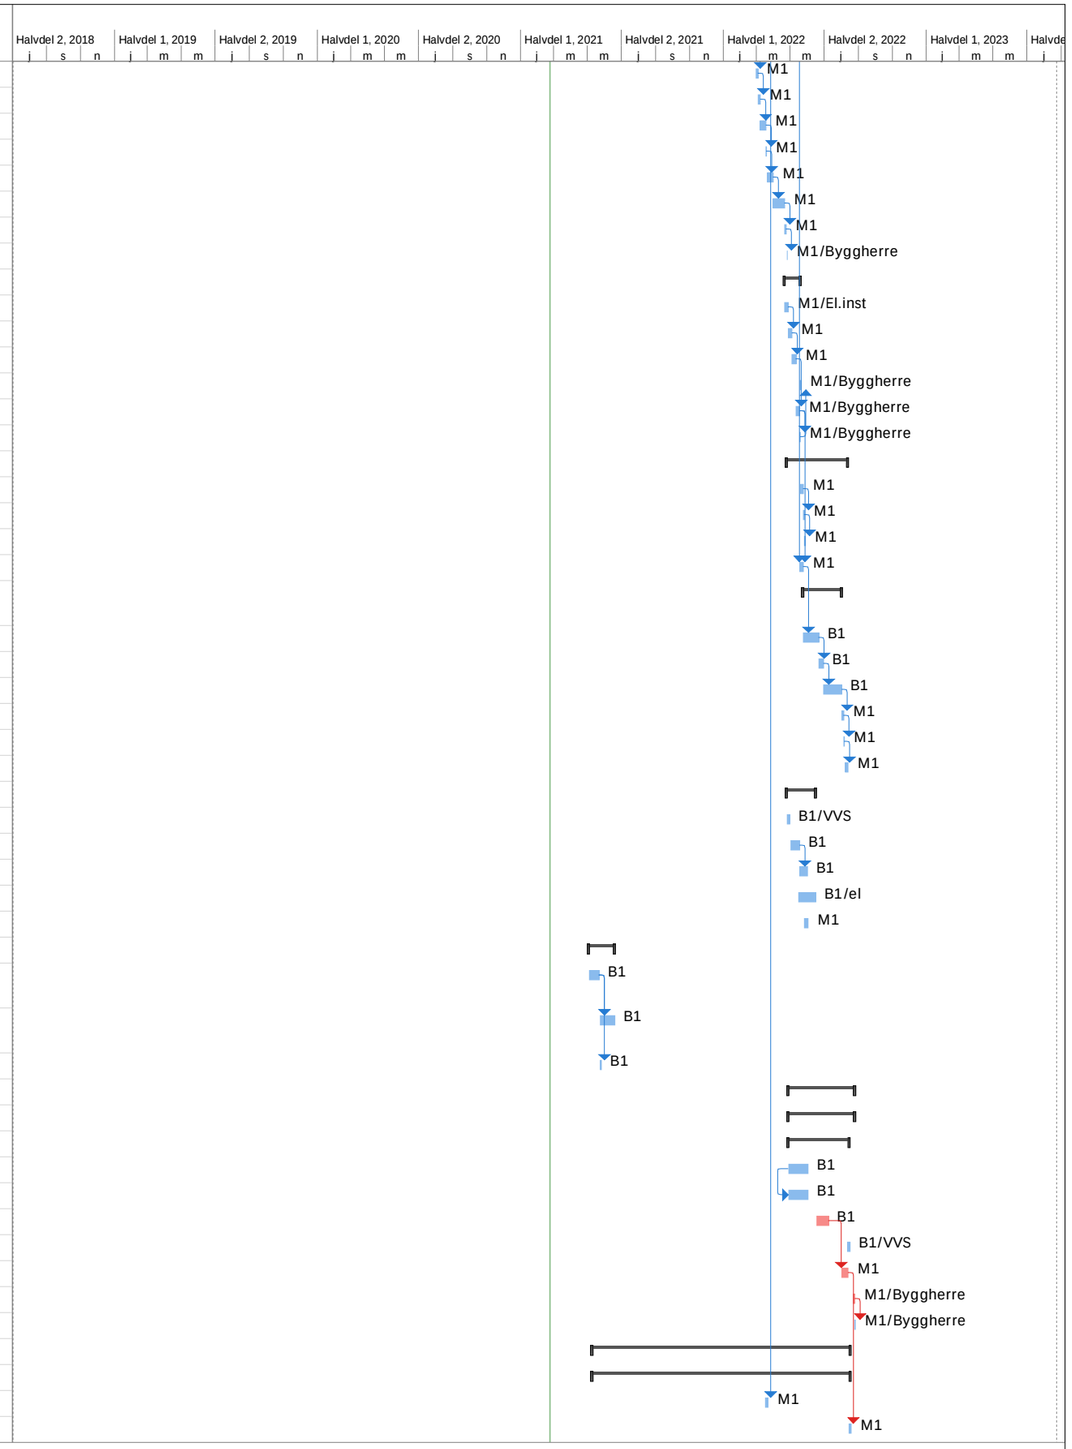

Prosjekt: Gol RA
Date: ti 23.02.21

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Critical Split		Slippage	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline		Progress			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Critical		Manual Progress			
