Stavanger Kommune

Foreløpig overordnet utførelses tidsplan i stengningsperiode

STAVANGER DOMKIRKE 2025

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser
1	Flytting utstyr og inventar	1431 dager	ma 01.01.18	fr 01.12.23		
2	Stengningsperiode	660 dager	on 20.01.21	fr 01.12.23		
3	UTFØRELSER:	1401 dager	ma 01.01.18	fr 20.10.23		
4	E01 Grave og grunnarbeider Torjussen	750 dager	ma 08.06.20	to 28.09.23		
5	Sør side	202 dager	ma 08.06.20	fr 30.04.21		
10	Nord og park	586 dager	ma 01.03.21	to 28.09.23		
11	Etablere rigg grunn i park, for brønner inkl sikre trær mm	7 dager	ma 01.03.21	ti 09.03.21	8	
12	Fase 3.1 Brønnboringer og rør trasser i park	20 dager	on 10.03.21	to 15.04.21	11	
13	Nedrigging park rigg	5 dager	fr 14.05.21	to 20.05.21	14	
14	Fase 3.2 Nordside, VA grøfter, inkludert rør trasse inn i kjeller DK	20 dager	fr 16.04.21	to 13.05.21	12	
15	Fase 3.3 Vest gjennom hoved trapp mm (etter brakkerigg)	20 dager	fr 01.09.23	to 28.09.23	141	
16	E02 Betongarbeider Hako total	220 dager	ma 31.08.20	to 19.08.21		
28	E03 Tømmerarbeider Faber Bygg	601 dager	ti 05.01.21	fr 25.08.23		
29	Tilfarer gulv skipet	30 dager	on 01.03.23	to 20.04.23		
30	Montere tilfarer gulv over tekniske rom	15 dager	fr 21.04.23	to 11.05.23	29	
31	Legge tre gulv skip	40 dager	fr 12.05.23	fr 28.07.23	30	
32	Behandle gulv	20 dager	ma 31.07.23	fr 25.08.23	31	
33	Utbedring trapp til loft, sikring korloft dekker og trapp til tårn loft	40 dager	ti 05.01.21	ma 01.03.21		
34	Arbeider i sakristier	20 dager	ma 01.11.21	fr 26.11.21		
35	Krypten lager teknisk rom	25 dager	on 04.01.23	ti 07.02.23		
36	Demontering musikker loft	15 dager	ma 08.03.21	fr 26.03.21		
37	Opparbeidelse av musikkrom ombygginger	40 dager	ti 01.02.22	ma 28.03.22		
38	E04 Snekkerarbeider	515 dager	ma 02.08.21	fr 20.10.23		
39	Montere trapp ned til krypt	20 dager	ma 02.08.21	fr 27.08.21		
40	Dører rahabilitering og montering	60 dager	ma 06.02.23	ti 09.05.23		
41	Vinduer	60 dager	ma 02.08.21	fr 22.10.21		
42	Innventar	40 dager	ma 28.08.23	fr 20.10.23	32	
43	E04 A Snekkerarbeider Stoler	483 dager	on 01.09.21	fr 06.10.23		
44	Rehabilitering stoler	50 dager	on 01.09.21	ti 09.11.21		
45	Stoler settes ut i kirkerommet før åpning	5 dager	ma 02.10.23	fr 06.10.23		
46	E04 B Snekkerarbeider Liturgiske møbler	582 dager	on 07.04.21	fr 20.10.23		
47	Hoved alter	20 dager	on 07.04.21	ti 04.05.21		
48	Innventar	40 dager	ma 28.08.23	fr 20.10.23	32	
49	E05 Murarbeider Murmester Meling	860 dager	ti 07.01.20	fr 29.09.23		
50	Refuging fasader Søndre tårn	234 dager	ti 07.01.20	fr 18.12.20		
51	Demontere blyglass vinduer i skipet nede v. felter	207 dager	ma 01.02.21	fr 17.12.21		
52	Nord tårn	227 dager	ti 05.01.21	ti 04.01.22		
53	Nord side ikke avklart	0 dager	ma 01.08.22	ma 01.08.22		
54	Vest fasade tidspunkt ikke avklart, ved tak over tak?	330 dager	ma 19.04.21	fr 30.09.22		
55	Kapellet	208 dager	ti 01.11.22	fr 29.09.23		
56	E06 Kleberstein konservering dokumentasjon Amuis	1337 dager	ma 01.01.18	fr 30.06.23		
57	Innvendig:	71 dager	ma 04.05.20	ti 01.09.20		
58	Tilpasset oversiktsplanene til AMUIS Innvendige arbeider	0 dager	ti 01.09.20	ti 01.09.20		
59	Koret	0 dager	ma 04.05.20	ma 04.05.20		
60	Skipet	0 dager	ma 04.05.20	ma 04.05.20		
61	Forhall	0 dager	ma 04.05.20	ma 04.05.20		
62	Tårn innvendig	0 dager	ma 04.05.20	ma 04.05.20		
63	Utvendig:	1337 dager	ma 01.01.18	fr 30.06.23		
64	Nord fasade	370 dager	ti 23.11.21	fr 30.06.23		
65	Vest fasade portal	124 dager	ti 05.05.20	fr 13.11.20		
66	Vest fasade	255 dager	ti 01.06.21	ma 01.08.22		
67	Øst fasade	703 dager	ma 01.01.18	on 30.09.20		
68	Kapellet	0 dager	ma 09.01.23	ma 09.01.23		
69	E07 Malerarbeider	0 dager	ma 10.01.22	ma 10.01.22		
70	Invendige malerarbeider	0 dager	ma 10.01.22	ma 10.01.22		
71	E08 Stillasarbeider Alustar	909 dager	ti 01.10.19	fr 01.09.23		
72	Østfasade demontasje	15 dager	ma 02.11.20	fr 20.11.20		Alustar
73	Sørtårn	23 dager	ti 01.10.19	to 31.10.19		Alustar
74	Sørtårn demontasje	2 dager	on 30.06.21	to 01.07.21		Alustar
75	Nord tårn montasje av stillas	10 dager	ti 22.09.20	ma 05.10.20		Alustar
76	Stillas bispeinngang inkludert trappe adkomst via tak	6 dager	ma 28.09.20	ma 05.10.20		Alustar
77	Tak over tak	51 dager	ma 11.01.21	ma 22.03.21		Alustar
78	Innvendige stillasarbeider kor	10 dager	ma 02.11.20	fr 13.11.20		Alustar

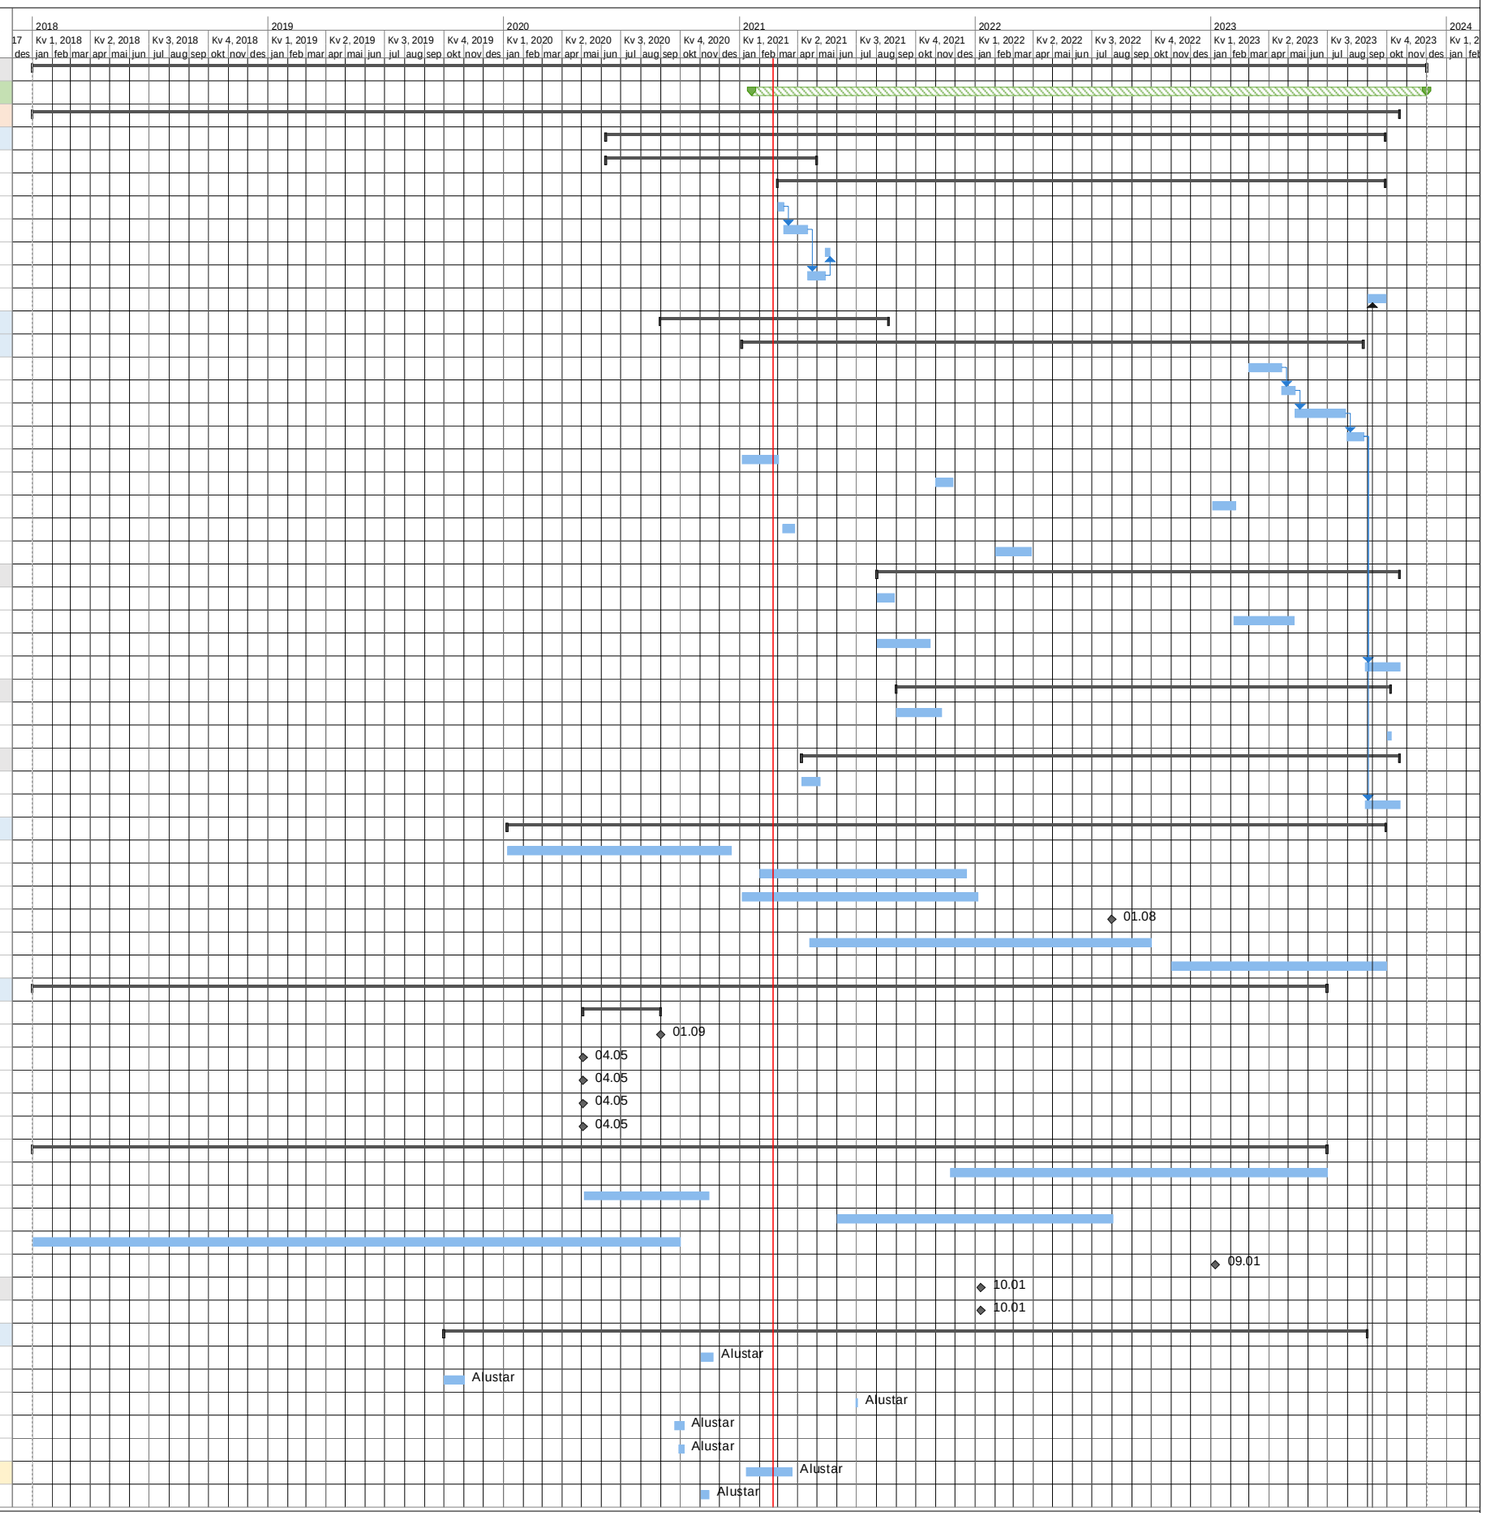

Stavanger Kommune

Foreløpig overordnet utførelses tidsplan i stengningsperiode

STAVANGER DOMKIRKE 2025
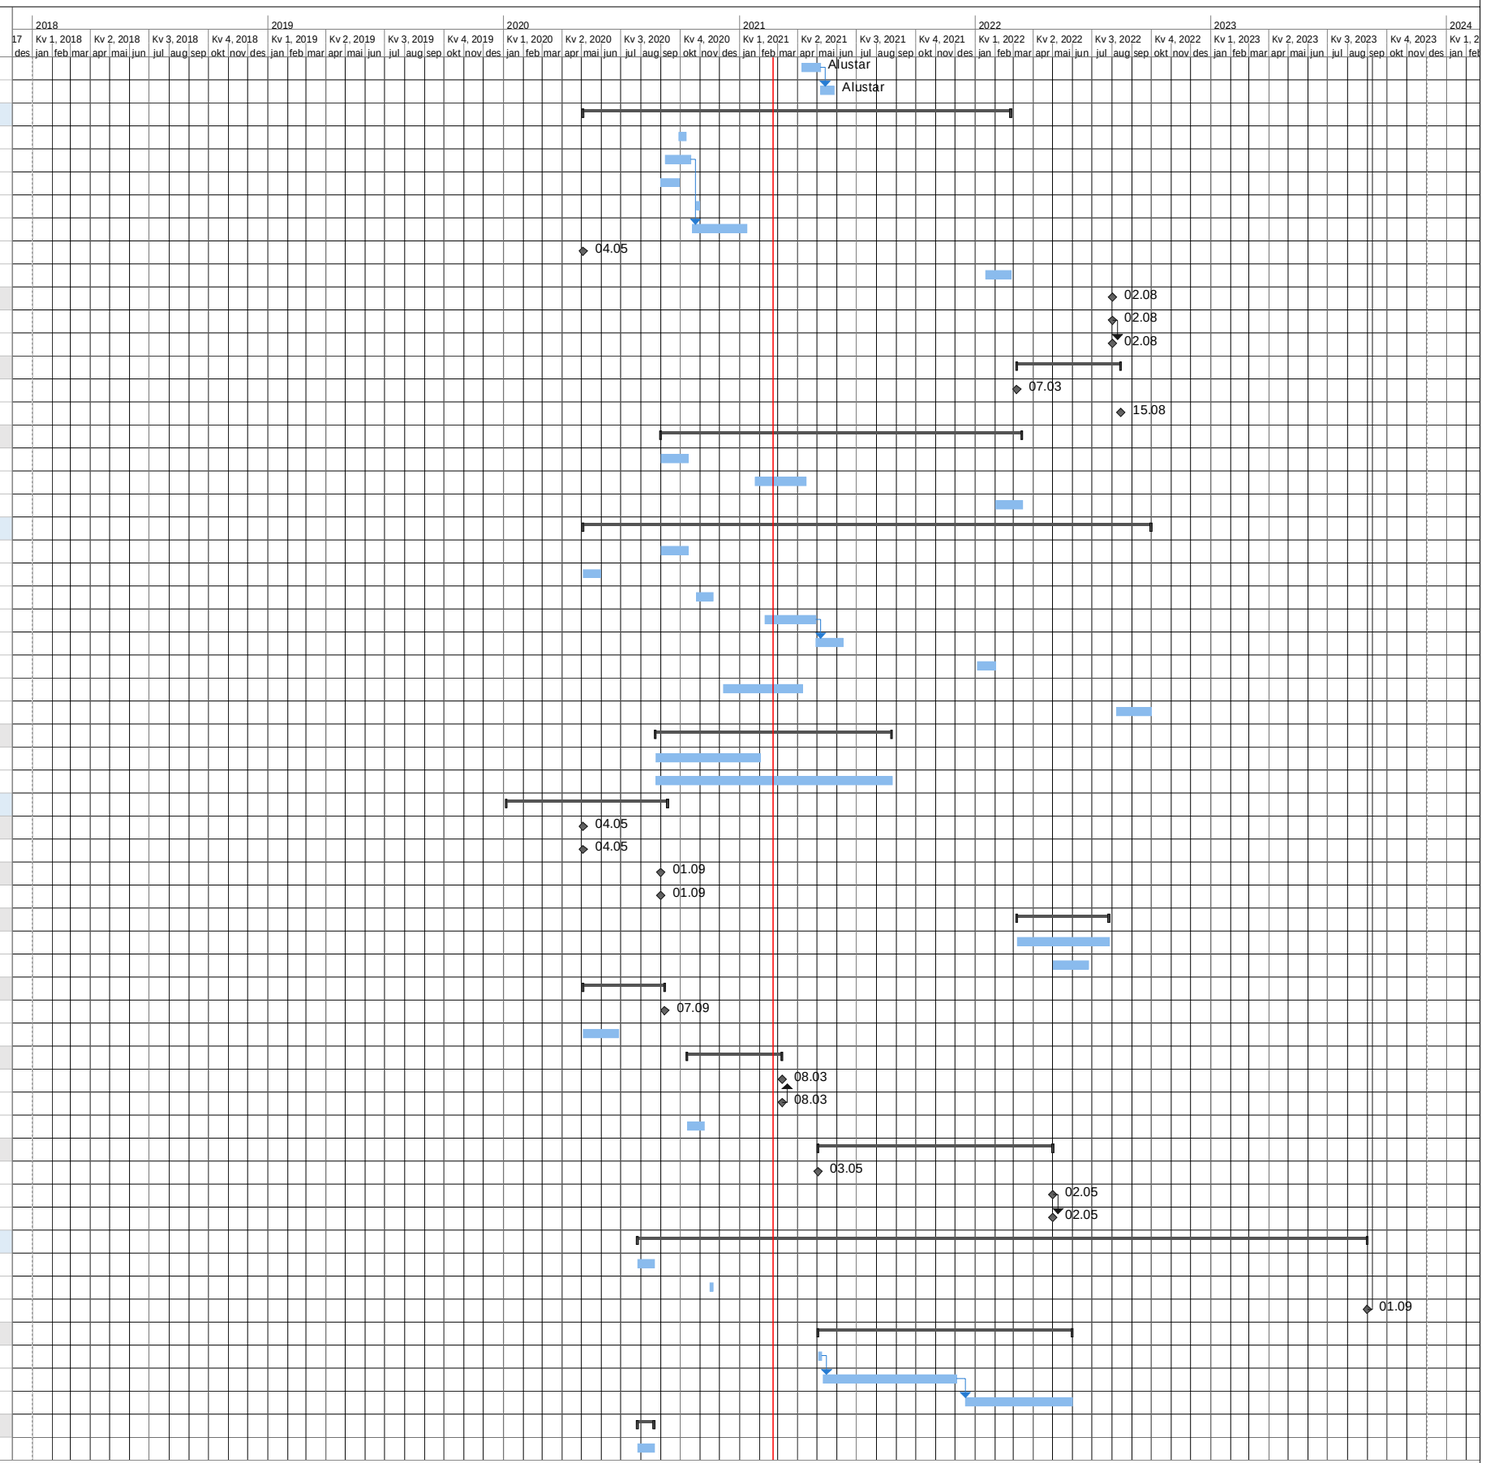
ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser
79	Stillas i skip	21 dager	on 07.04.21	on 05.05.21	21	Alustar
80	Forhall	15 dager	to 06.05.21	on 26.05.21	79	Alustar
81	E09 Elektro Rogaland Elektro	415 dager	ma 04.05.20	fr 25.02.22		
82	Rigg strøm og belysning innvendig	10 dager	ma 28.09.20	fr 09.10.20		
83	Demontasje av eksisterende kabler og utstyr oppstart	30 dager	ma 07.09.20	fr 16.10.20		
84	Teknisk rom, prov og fordelinger	21 dager	ma 31.08.20	ma 28.09.20		
85	Føringer i fyllmasser	5 dager	ma 26.10.20	fr 30.10.20	17AS-20 dag	
86	Nytt annlegg kabel føringer oppstart	50 dager	ma 19.10.20	ma 11.01.21	83	
87	Lynvern anlegg tak (oppstart med takarbeider)	0 dager	ma 04.05.20	ma 04.05.20		
88	Musikk rom	30 dager	ma 17.01.22	fr 25.02.22		
89	E10 Sceneteknikk	0 dager	ti 02.08.22	ti 02.08.22		
90	Montering av lys rigg	0 dager	ti 02.08.22	ti 02.08.22		
91	Montering av scenelys	0 dager	ti 02.08.22	ti 02.08.22	90	
92	E11 SD anlegg	92 dager	ma 07.03.22	ma 15.08.22		
93	Sentarl anlegg inkl toppsystem	0 dager	ma 07.03.22	ma 07.03.22		
94	Tilkoblinger og utstyrs montasje	0 dager	ma 15.08.22	ma 15.08.22		
95	E12 Ventilasjon	355 dager	ti 01.09.20	ma 14.03.22		
96	Deomontasje eksisterende anlegg	30 dager	ti 01.09.20	ma 12.10.20		
97	Montasje nytt rør opplegg (oppstart deler av annlegg)	50 dager	ma 25.01.21	ti 13.04.21	25	
98	Montasje anlegg teknisk rom	30 dager	ti 01.02.22	ma 14.03.22		
99	E13 Rørlegger Torgeresen	547 dager	ma 04.05.20	fr 30.09.22		
100	Demontasje av eksisterende rør anlegg, div prov	30 dager	ti 01.09.20	ma 12.10.20		
101	Demontering av røranlegg i grunn før masse fylling	20 dager	ma 04.05.20	fr 29.05.20		
102	Varme rør i fyllmasser	20 dager	ma 26.10.20	fr 20.11.20	17AS-20 dag	
103	Varmeanlegg gulv skip silencio inkl rør	50 dager	ti 09.02.21	on 28.04.21	20	
104	Vameanlegg gulv kor Silencio inkl rør	30 dager	to 29.04.21	on 09.06.21	103	
105	Røranlegg musikk rom	20 dager	ti 04.01.22	ma 31.01.22		
106	Montasje rør anlegg generelt vannforsyninger pumper mm	70 dager	ma 07.12.20	on 07.04.21		
107	Utstyrs leveranse/ montasjer	40 dager	ma 08.08.22	fr 30.09.22		
108	E14 Slukkeanlegg	228 dager	ma 24.08.20	ti 24.08.21		
109	Demontasje eksisterende slukkeanlegg	105 dager	ma 24.08.20	ma 01.02.21		
110	Nytt slukke anlegg	228 dager	ma 24.08.20	ti 24.08.21		
111	E15 Konservering historisk inventar AMUIS	165 dager	ma 06.01.20	fr 11.09.20		
120	E16 Byggrengjøring	0 dager	ma 04.05.20	ma 04.05.20		
121	Oppstart	0 dager	ma 04.05.20	ma 04.05.20		
122	E17 Blyglassvinduer	0 dager	ti 01.09.20	ti 01.09.20		AMUIS
123	Restaureringsarbeider blyglass oppstart	0 dager	ti 01.09.20	ti 01.09.20		
124	E18 Utomhusarbeider	80 dager	ma 07.03.22	on 27.07.22		
125	Opparbeidelse utomhus dekker	80 dager	ma 07.03.22	on 27.07.22		
126	Utvendig trapp vest	40 dager	ma 02.05.22	fr 24.06.22		
127	E19 Smedarbeider	75 dager	ma 04.05.20	ma 07.09.20		
128	Blyglass vinduer skip	0 dager	ma 07.09.20	ma 07.09.20		
129	Ramper forhall	40 dager	ma 04.05.20	fr 26.06.20		
130	E20 Blikkenslager	94 dager	ma 12.10.20	ma 08.03.21		
131	Taknedløp	0 dager	ma 08.03.21	ma 08.03.21	132	
132	Renner	0 dager	ma 08.03.21	ma 08.03.21		
133	Beslag øst fasade	20 dager	ma 12.10.20	fr 06.11.20		
134	E21 Dør- og vindusfelt i metall	226 dager	ma 03.05.21	ma 02.05.22		
135	Varevinduer kor og forhall	0 dager	ma 03.05.21	ma 03.05.21		
136	Indre ytterdør	0 dager	ma 02.05.22	ma 02.05.22		
137	Klimaskille skip forhall	0 dager	ma 02.05.22	ma 02.05.22	136	
138	E22 Rigg UCO	710 dager	ma 27.07.20	fr 01.09.23		
139	Opparbeidelse rigg utvendig	20 dager	ma 27.07.20	fr 21.08.20		
140	Montere brakkerigg vest	5 dager	ma 16.11.20	fr 20.11.20	8	
141	Demontasje brakkerigg vest	0 dager	fr 01.09.23	fr 01.09.23		
142	E23 Tak	248 dager	ma 03.05.21	ti 31.05.22		
143	Tilrigg takarbeider	5 dager	ma 03.05.21	fr 07.05.21		
144	Vest til senter	133 dager	ma 10.05.21	to 02.12.21	143	
145	Senter til øst	100 dager	fr 17.12.21	ti 31.05.22	144	
146	E24 Historiske dører rehabilitering og lås	20 dager	ma 27.07.20	fr 21.08.20		
147	Rehab av eksisterende dører lås og beslag	20 dager	ma 27.07.20	fr 21.08.20
