Norconsult

Åkrehamn Renseanlegg_Fremdriftsplan byggefase.mpp
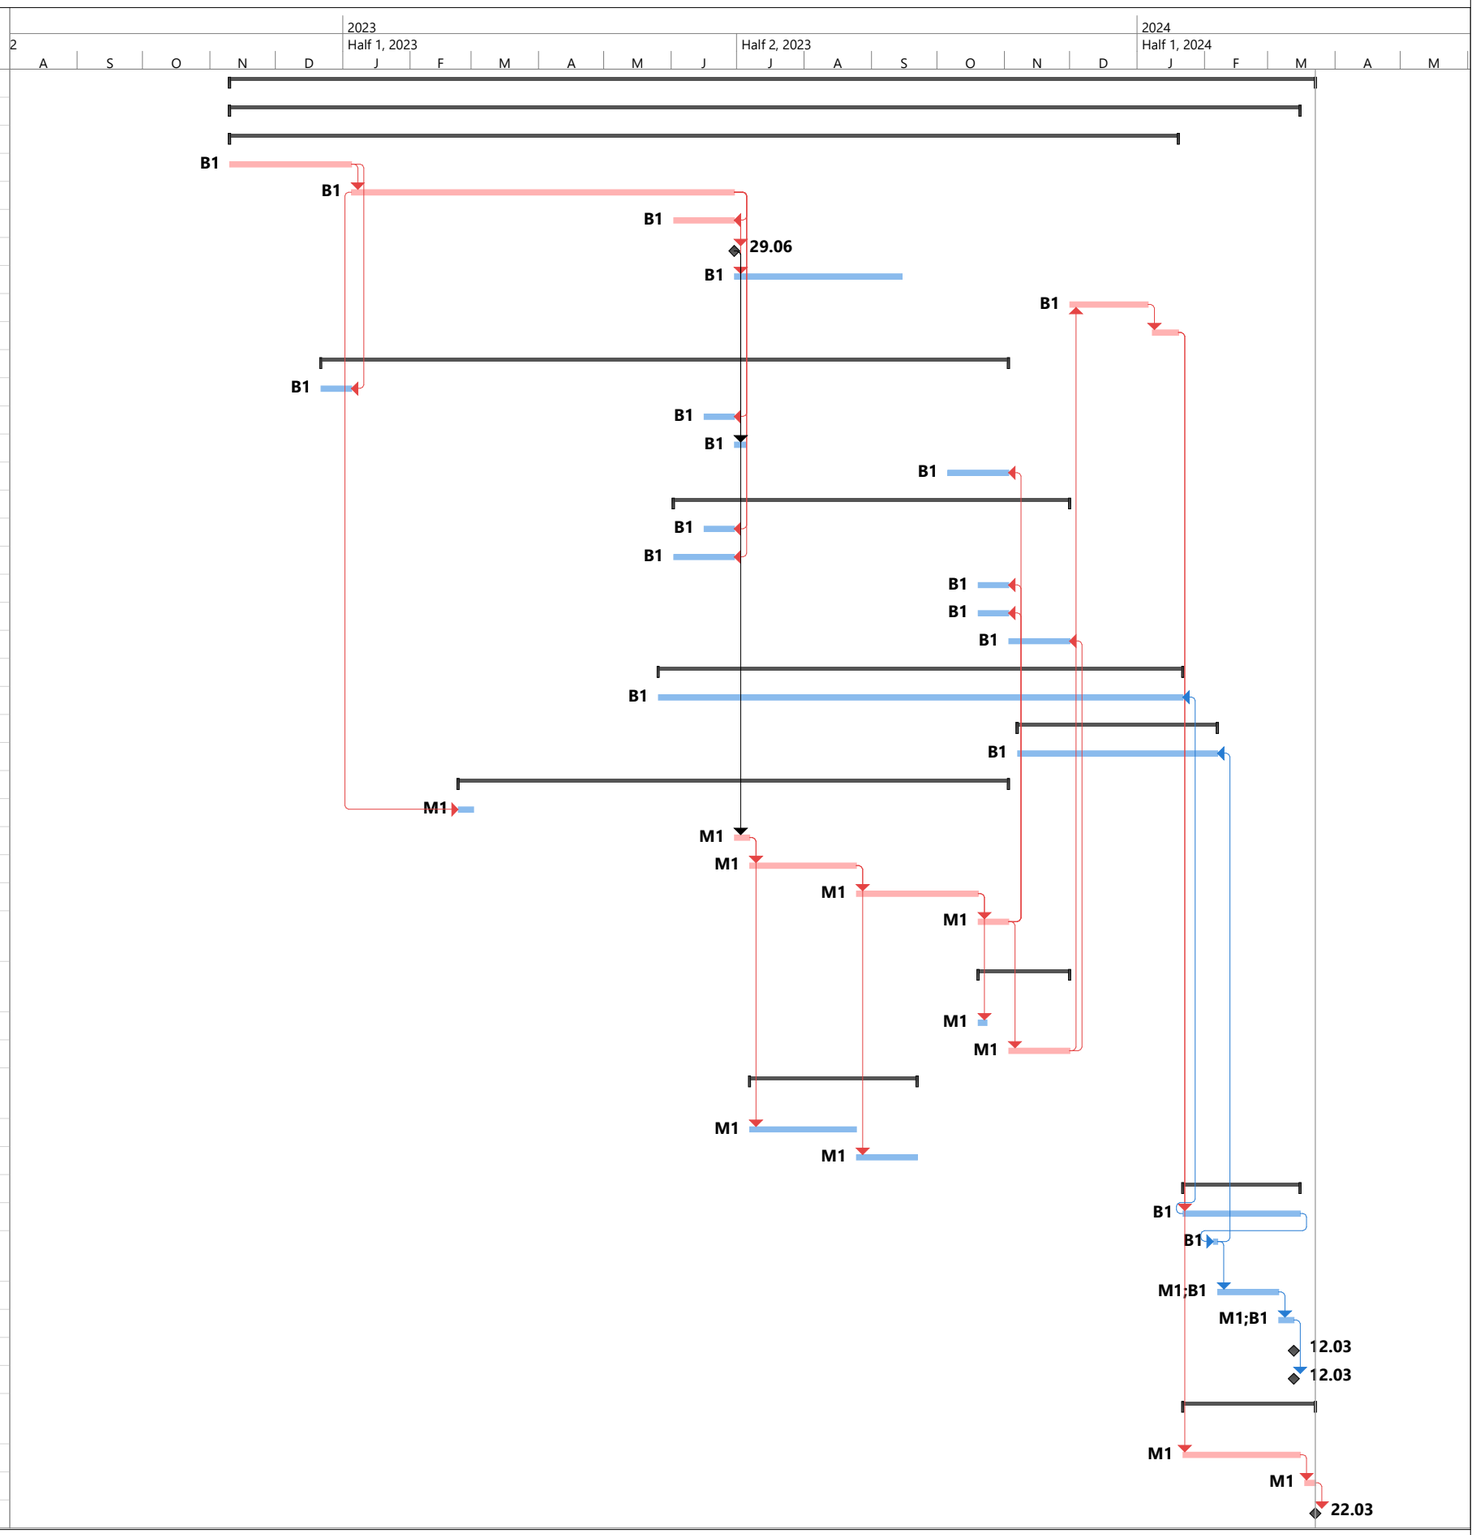
ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Åkrehamn avløpsrenseanlegg**	**325 days**	**Thu 10.11.22**	**Fri 22.03.24**	
2		**Byggefase B1 og M1**	**320 days**	**Thu 10.11.22**	**Fri 15.03.24**	
3		**Byggefase B1 Prosesshall bygg**	**280 days**	**Thu 10.11.22**	**Fri 19.01.24**	
4		Grunnarbeider og grøfter	35 days	Thu 10.11.22	Wed 04.01.23	
5		Betongarbeider/stålarbeider	120 days	Thu 05.01.23	Thu 29.06.23	4
6		Overflatebehandling del 1	20 days	Fri 02.06.23	Thu 29.06.23	5FF
7		Bygg klar for maskinmontasje (M1)	0 days	Thu 29.06.23	Thu 29.06.23	6
8		Bygningsmessige arbeider	40 days	Fri 30.06.23	Thu 14.09.23	6
9		Overflatebehandling del 2	20 days	Fri 01.12.23	Fri 05.01.24	34
10		Kompletterende arbeider	10 days	Mon 08.01.24	Fri 19.01.24	9
11		**Byggefase B1 Prosesshall VVS**	**200 days**	**Thu 22.12.22**	**Thu 02.11.23**	
12		Bunnledninger	5 days	Thu 22.12.22	Wed 04.01.23	4FF
13		Ventilasjon i fagverk	10 days	Fri 16.06.23	Thu 29.06.23	5FF
14		Ventilasjonsaggregat	3 days	Fri 30.06.23	Tue 04.07.23	7
15		Øvrig ventilasjon	20 days	Fri 06.10.23	Thu 02.11.23	31FF
16		**Byggefase B1 Prosesshall Elektro**	**115 days**	**Fri 02.06.23**	**Thu 30.11.23**	
17		Hovedtavle	10 days	Fri 16.06.23	Thu 29.06.23	5FF
18		Føringsveier og belysning	20 days	Fri 02.06.23	Thu 29.06.23	5FF
19		Montasje instrumenter	10 days	Fri 20.10.23	Thu 02.11.23	31FF
20		Lys og stikk	10 days	Fri 20.10.23	Thu 02.11.23	31FF
21		Føringer, termingering og signaltest	20 days	Fri 03.11.23	Thu 30.11.23	34FF
22		**Byggefase B1 Personaldel**	**150 days**	**Fri 26.05.23**	**Mon 22.01.24**	
23		Komplette arbeider	150 days	Fri 26.05.23	Mon 22.01.24	39SF
24		**Byggefase B1 Utomhus**	**60 days**	**Tue 07.11.23**	**Tue 06.02.24**	
25		Komplette arbeider	60 days	Tue 07.11.23	Tue 06.02.24	40FF
26		**Byggefase M1 maskin/prosess**	**160 days**	**Thu 23.02.23**	**Thu 02.11.23**	
27		Innsjauing flotasjon (og slamlagre?)	5 days	Thu 23.02.23	Wed 01.03.23	5SS+35 days
28		Innsjauing øvrig utstyr	5 days	Fri 30.06.23	Thu 06.07.23	7
29		Montasje større komponenter	20 days	Fri 07.07.23	Thu 24.08.23	28
30		Montasje rør og ventiler	40 days	Fri 25.08.23	Thu 19.10.23	29
31		Montasje instrumenter og resterende	10 days	Fri 20.10.23	Thu 02.11.23	30
32		**Byggefase M1 elektro og automatisering**	**30 days**	**Fri 20.10.23**	**Thu 30.11.23**	
33		Tavlemontasje	2 days	Fri 20.10.23	Mon 23.10.23	30
34		Føringer, terminering og signaltest	20 days	Fri 03.11.23	Thu 30.11.23	31
35		**Byggefase M1 ventilasjon/luktbehandling**	**40 days**	**Fri 07.07.23**	**Thu 21.09.23**	
36		Montasje luktreduksjonsanlegg	20 days	Fri 07.07.23	Thu 24.08.23	28
37		Kanalmontasje og punktavsug	20 days	Fri 25.08.23	Thu 21.09.23	29
38		**Sluttfase**	**40 days**	**Mon 22.01.24**	**Fri 15.03.24**	
39		Testdrift	40 days	Mon 22.01.24	Fri 15.03.24	10
40		Testing ventilasjon- og brannalarmanlegg	2 days	Mon 05.02.24	Tue 06.02.24	39FS-30 days
41		Øvrige tester (varmepumpe mm.)	20 days	Wed 07.02.24	Tue 05.03.24	40
42		Ferdigbefaringer	5 days	Wed 06.03.24	Tue 12.03.24	41
43		**Overtakelse (brukstillatelse)**	**0 days**	**Tue 12.03.24**	**Tue 12.03.24**	
44		Overtakelse bygg og utomhus	0 days	Tue 12.03.24	Tue 12.03.24	42
45		**Oppstart igangkjøring og prøvedriftperiode**	**45 days**	**Mon 22.01.24**	**Fri 22.03.24**	
46		Tørrtest, våttest, funksjonstester	40 days	Mon 22.01.24	Fri 15.03.24	10
47		Igangkjøring og inntrimming	5 days	Mon 18.03.24	Fri 22.03.24	46
48		Oppstart prøvedriftsperiode	0 days	Fri 22.03.24	Fri 22.03.24	47
