NUNNKH

Beskrivelse	Start	Slutt	Actual	Baseline Planned Progress	Current Planned Progress	Baseline Early Start	Baseline Early Finish
Kontraktsmilepæler	**08.Jun.2020**	**09.Aug.2024**	**21,1**	**33,3**	**33,3**	**08.Jun.2020**	**09.Aug.2024**
Oppstart byggeplass	08.Mar.2021	05.Mar.2021		100,0	100,0	08.Mar.2021	05.Mar.2021
Overlevering sykehus	08.Aug.2024	07.Aug.2024				08.Aug.2024	07.Aug.2024
Overlevering helsehus	08.Aug.2024	07.Aug.2024				08.Aug.2024	07.Aug.2024
Sykehus	**08.Jun.2020**	**07.Aug.2024**	**25,9**	**37,0**	**37,0**	**08.Jun.2020**	**07.Aug.2024**
A Kontrahering	08.Jun.2020	05.Jun.2020	100,0	100,0	100,0	08.Jun.2020	05.Jun.2020
B1 Totalentreprenørens garantistillelse	22.Jun.2020	19.Jun.2020	100,0	100,0	100,0	22.Jun.2020	19.Jun.2020
B2 Dokumentplan/systeminndeling sluttdokumentasjon	20.Jul.2020	17.Jul.2020	100,0	100,0	100,0	20.Jul.2020	17.Jul.2020
B4 Totalentreprenørens forsikringsattester	06.Jul.2020	03.Jul.2020	100,0	100,0	100,0	06.Jul.2020	03.Jul.2020
B5 Totalentreprenørens kvalitetsplan	20.Jul.2020	17.Jul.2020	100,0	100,0	100,0	20.Jul.2020	17.Jul.2020
B6 Totalentreprenørens fremdriftsplaner og kostnadsbudsje	20.Jul.2020	17.Jul.2020	100,0	100,0	100,0	20.Jul.2020	17.Jul.2020
B7 Kontrollplan og prosedyre for egen kontroll av FDVU	03.Aug.2020	31.Jul.2020	100,0	100,0	100,0	03.Aug.2020	31.Jul.2020
C1 Sluttdokumentasjon (FDVU), 10 %	17.Dec.2020	16.Dec.2020		100,0	100,0	17.Dec.2020	16.Dec.2020
C2 Igangsettingstillatelse	08.Mar.2021	05.Mar.2021		100,0	100,0	08.Mar.2021	05.Mar.2021
C3 Virtuell ferdigbefaring	21.Feb.2022	18.Feb.2022				21.Feb.2022	18.Feb.2022
D1 Oppstart byggeplass	08.Mar.2021	05.Mar.2021		100,0	100,0	08.Mar.2021	05.Mar.2021
E1 Tett bygg	14.Oct.2022	13.Oct.2022				14.Oct.2022	13.Oct.2022
E2 50 % Mekanisk ferdigstilt	26.Jun.2023	23.Jun.2023				26.Jun.2023	23.Jun.2023
E3 Mekanisk ferdigstilt	11.Dec.2023	08.Dec.2023				11.Dec.2023	08.Dec.2023
E4 Site acceptance test(SAT)	22.Apr.2024	19.Apr.2024				22.Apr.2024	19.Apr.2024
E5 Integrerte systemtester	22.Apr.2024	19.Apr.2024				22.Apr.2024	19.Apr.2024
E6 Fullskalatest av enteprise	06.May.2024	03.May.2024				06.May.2024	03.May.2024
F Opplæringsplan	01.Jun.2021	31.May.2021				01.Jun.2021	31.May.2021
G Sluttdokumentasjon (FDVU), 90%	12.Oct.2023	11.Oct.2023				12.Oct.2023	11.Oct.2023
H1 Oppstart idriftsettelse	22.Apr.2024	19.Apr.2024				22.Apr.2024	19.Apr.2024
H2 Virksomhetstester	20.May.2024	17.May.2024				20.May.2024	17.May.2024
H3 Ny fullskalatest/kapasitetstest under prøvedrift	24.Jun.2024	21.Jun.2024				24.Jun.2024	21.Jun.2024
J Delovertagelse dødt bygg	13.May.2024	10.May.2024				13.May.2024	10.May.2024
K Midlertidlig brukstilltatelse	10.Jun.2024	07.Jun.2024				10.Jun.2024	07.Jun.2024
L Klinisk drift	20.May.2024	17.May.2024				20.May.2024	17.May.2024
M Siste delovertagelse	08.Aug.2024	07.Aug.2024				08.Aug.2024	07.Aug.2024
N Ferdigattest	04.Jul.2024	03.Jul.2024				04.Jul.2024	03.Jul.2024
Helsehus	**28.Sep.2020**	**09.Aug.2024**	**18,5**	**29,6**	**29,6**	**28.Sep.2020**	**09.Aug.2024**
A Kontrahering	28.Sep.2020	25.Sep.2020	100,0	100,0	100,0	28.Sep.2020	25.Sep.2020
B1 Totalentreprenørens garantistillelse	12.Oct.2020	09.Oct.2020	100,0	100,0	100,0	12.Oct.2020	09.Oct.2020
B2 Dokumentplan/systeminndeling sluttdokumentasjon	09.Nov.2020	06.Nov.2020		100,0	100,0	09.Nov.2020	06.Nov.2020
B4 Totalentreprenørens forsikringsattester	26.Oct.2020	23.Oct.2020	100,0	100,0	100,0	26.Oct.2020	23.Oct.2020
B5 Totalentreprenørens kvalitetsplan	09.Nov.2020	06.Nov.2020	100,0	100,0	100,0	09.Nov.2020	06.Nov.2020
B6 Totalentreprenørens fremdriftsplaner og kostnadsbudsje	09.Nov.2020	06.Nov.2020	100,0	100,0	100,0	09.Nov.2020	06.Nov.2020
B7 Kontrollplan og prosedyre for egen kontroll av FDVU	23.Nov.2020	20.Nov.2020		100,0	100,0	23.Nov.2020	20.Nov.2020
C1 Sluttdokumentasjon (FDVU), 10 %	18.Jan.2021	15.Jan.2021		100,0	100,0	18.Jan.2021	15.Jan.2021
C2 Igangsettingstillatelse	09.Aug.2021	06.Aug.2021				09.Aug.2021	06.Aug.2021
C3 Virtuell ferdigbefaring	05.Apr.2022	04.Apr.2022				05.Apr.2022	04.Apr.2022
D1 Oppstart byggeplass	09.Aug.2021	06.Aug.2021				09.Aug.2021	06.Aug.2021
E1 Tett bygg	23.Jan.2023	20.Jan.2023				23.Jan.2023	20.Jan.2023
E2 50 % Mekanisk ferdigstilt	18.Dec.2023	15.Dec.2023				18.Dec.2023	15.Dec.2023
E3 Mekanisk ferdigstilt	04.Mar.2024	01.Mar.2024				04.Mar.2024	01.Mar.2024
E4 Site acceptance test(SAT)	03.Jun.2024	31.May.2024				03.Jun.2024	31.May.2024
E5 Integrerte systemtester	03.Jun.2024	31.May.2024				03.Jun.2024	31.May.2024
E6 Fullskalatest av enteprise	29.Jul.2024	05.Jul.2024				29.Jul.2024	05.Jul.2024
F Opplæringsplan	01.Jun.2021	31.May.2021				01.Jun.2021	31.May.2021
G Sluttdokumentasjon (FDVU), 90%	04.Jan.2024	03.Jan.2024				04.Jan.2024	03.Jan.2024
H1 Oppstart idriftsettelse	24.Jun.2024	21.Jun.2024				24.Jun.2024	21.Jun.2024

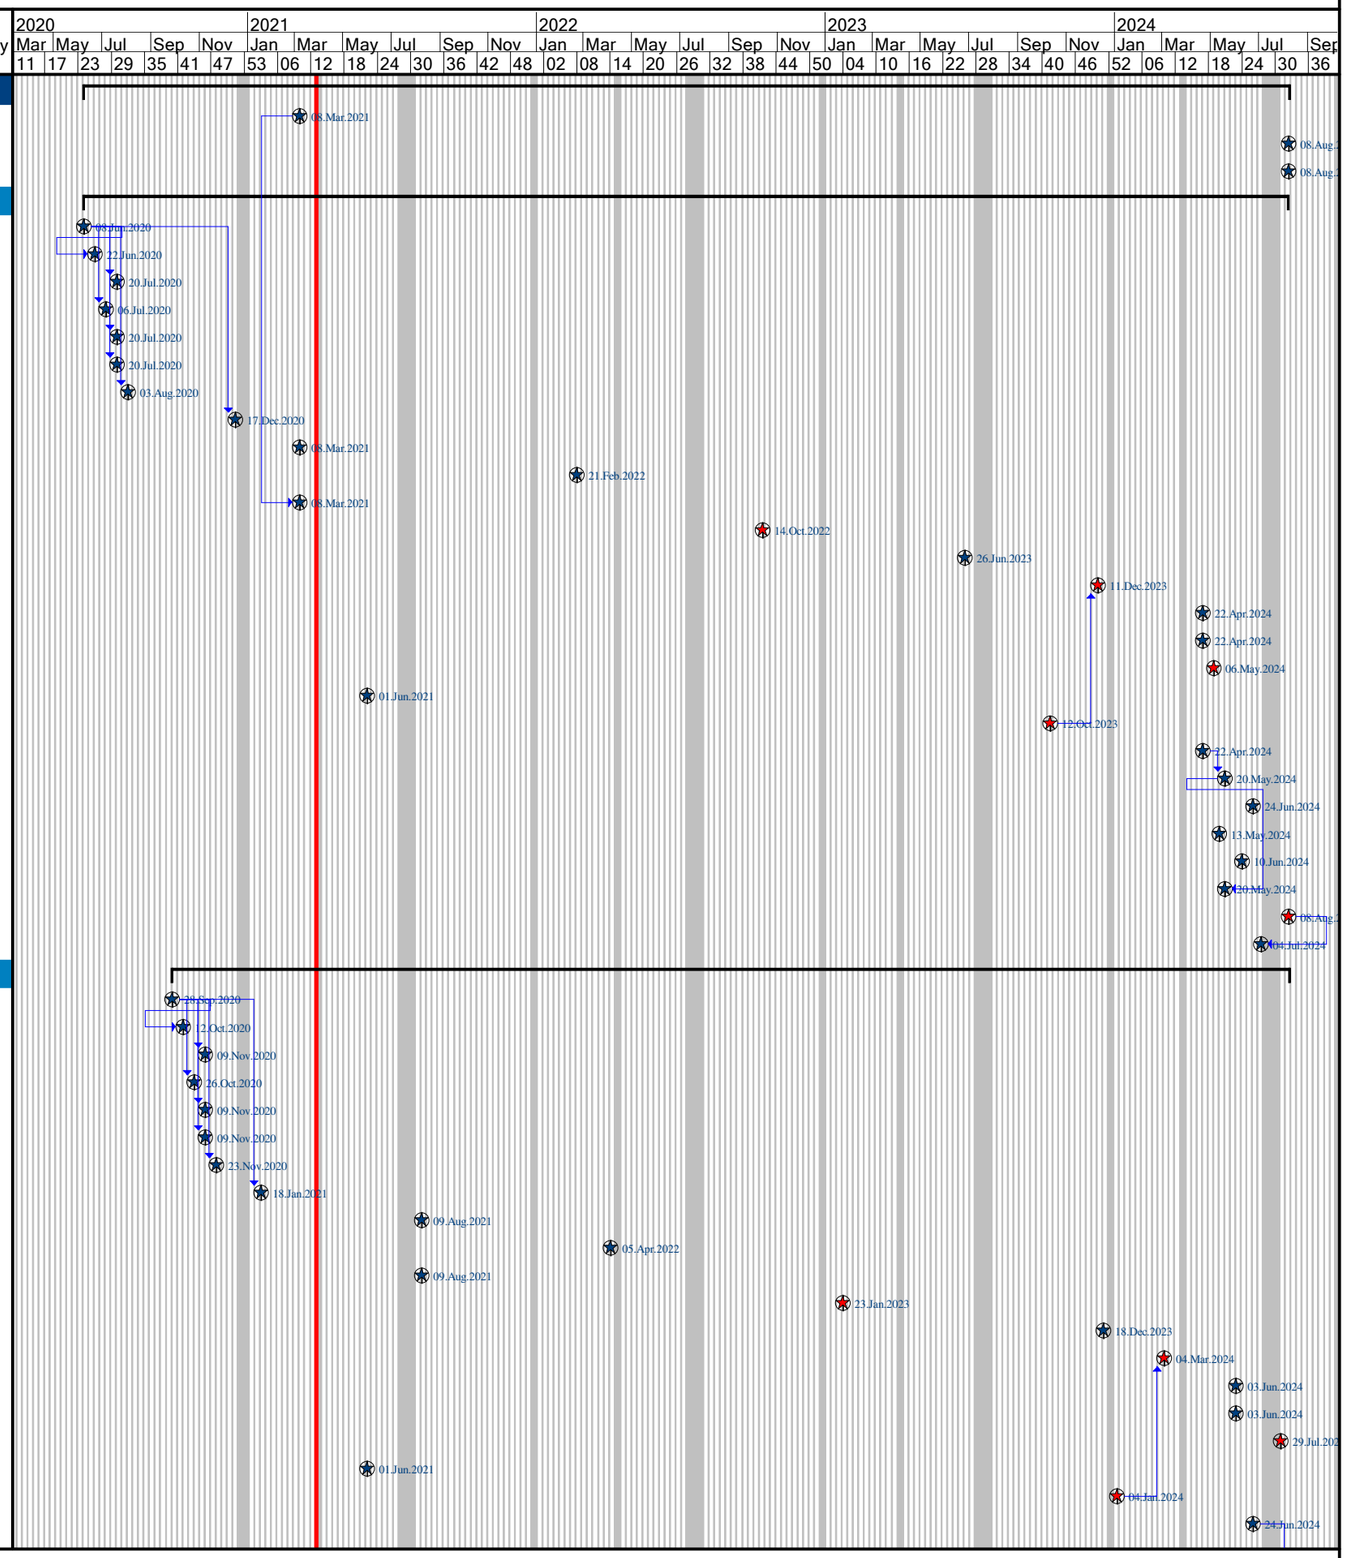

Sammendrag | Fremdriftsplan | Milepel | Dagmulktbelagt frist

Cutoff: 28.03.21

NUNNKH

Beskrivelse	Start	Slutt	Actual	Baseline Planned Progress	Current Planned Progress	Baseline Early Start	Baseline Early Finish
H2 Virksomhetstester	12.Aug.2024	09.Aug.2024				12.Aug.2024	09.Aug.2024
H3 Ny fullskalatest/kapasitetstest under prøvedrift	29.Jul.2024	05.Jul.2024				29.Jul.2024	05.Jul.2024
J Delovertagelse dødt bygg	29.Jul.2024	05.Jul.2024				29.Jul.2024	05.Jul.2024
K Midlertidlig brukstilltatelse	29.Jul.2024	05.Jul.2024				29.Jul.2024	05.Jul.2024
L Klinisk drift	12.Aug.2024	09.Aug.2024				12.Aug.2024	09.Aug.2024
M Siste delovertagelse	08.Aug.2024	07.Aug.2024				08.Aug.2024	07.Aug.2024
N Ferdigattest	01.Aug.2024	31.Jul.2024				01.Aug.2024	31.Jul.2024
Entreprenørprosjektering	13.Apr.2020	09.Sep.2022	54,3	54,3	54,3	13.Apr.2020	09.Sep.2022
Sykehus	13.Apr.2020	19.Aug.2022	55,4	55,4	55,4	13.Apr.2020	19.Aug.2022
Bemanning	13.Apr.2020	19.Aug.2022	55,4	55,4	55,4	13.Apr.2020	19.Aug.2022
Offentlig saksbehandling	30.Oct.2020	11.Feb.2022	0,0	0,0	0,0	30.Oct.2020	11.Feb.2022
Grunn og fundamentering	31.Aug.2020	07.Jun.2021	0,0	0,0	0,0	31.Aug.2020	07.Jun.2021
Råbygg	14.Sep.2020	25.Feb.2022	0,0	0,0	0,0	14.Sep.2020	25.Feb.2022
Tett bygg	21.Oct.2020	07.Mar.2022	0,0	0,0	0,0	21.Oct.2020	07.Mar.2022
Innredning	12.Oct.2020	07.Mar.2022	0,0	0,0	0,0	12.Oct.2020	07.Mar.2022
Utenomhus	05.Oct.2020	22.Apr.2022	0,0	0,0	0,0	05.Oct.2020	22.Apr.2022
Helsehus	25.May.2020	09.Sep.2022	44,3	44,3	44,3	25.May.2020	09.Sep.2022
Bemanning	25.May.2020	19.Aug.2022	44,3	44,3	44,3	25.May.2020	19.Aug.2022
Offentlig saksbehandling	30.Nov.2020	09.Sep.2022	0,0	0,0	0,0	30.Nov.2020	09.Sep.2022
Grunn og fundamentering	26.May.2021	06.Sep.2021	0,0	0,0	0,0	26.May.2021	06.Sep.2021
Råbygg	03.Nov.2021	06.May.2022	0,0	0,0	0,0	03.Nov.2021	06.May.2022
Tett bygg	03.Dec.2021	21.Mar.2022	0,0	0,0	0,0	03.Dec.2021	21.Mar.2022
Innredning	03.Jan.2022	04.Apr.2022	0,0	0,0	0,0	03.Jan.2022	04.Apr.2022
Kontrahering	27.Apr.2020	26.Nov.2021	0,0	0,0	0,0	27.Apr.2020	26.Nov.2021
Sykehus	27.Apr.2020	12.Nov.2021	0,0	0,0	0,0	27.Apr.2020	12.Nov.2021
Helsehus	27.Apr.2020	26.Nov.2021	0,0	0,0	0,0	27.Apr.2020	26.Nov.2021
Gjennomføring	15.Jun.2020	14.Sep.2024	1,0	0,9	0,9	15.Jun.2020	14.Sep.2024
Tomtearbeider	15.Jun.2020	25.Dec.2020	91,6	100,0	100,0	15.Jun.2020	25.Dec.2020
Etablering	11.Jan.2021	19.Apr.2024	24,1	28,6	28,6	11.Jan.2021	19.Apr.2024
Sykehus	16.Nov.2020	10.Aug.2024	0,6	0,3	0,3	16.Nov.2020	10.Aug.2024
Grunn og fundamentering	05.Apr.2021	11.Feb.2022	0,0	0,0	0,0	05.Apr.2021	11.Feb.2022
Råbygg	02.Aug.2021	12.Aug.2022	0,0	0,0	0,0	02.Aug.2021	12.Aug.2022
Tett bygg	29.Nov.2021	09.Sep.2022	0,0	0,0	0,0	29.Nov.2021	09.Sep.2022
Innredning	22.Nov.2021	16.Feb.2024	0,0	0,0	0,0	22.Nov.2021	16.Feb.2024
Utenomhus	16.Nov.2020	31.May.2024	15,3	8,4	8,4	16.Nov.2020	31.May.2024
Avslutningsfase	08.Jan.2024	10.Aug.2024	0,0	0,0	0,0	08.Jan.2024	10.Aug.2024
Helsehus	09.Aug.2021	14.Sep.2024	0,0	0,0	0,0	09.Aug.2021	14.Sep.2024
Grunn og fundamentering	09.Aug.2021	17.Jun.2022	0,0	0,0	0,0	09.Aug.2021	17.Jun.2022
Råbygg	01.Aug.2022	11.Nov.2022	0,0	0,0	0,0	01.Aug.2022	11.Nov.2022
Tett bygg	03.Oct.2022	16.Dec.2022	0,0	0,0	0,0	03.Oct.2022	16.Dec.2022
Innredning	31.Oct.2022	31.May.2024	0,0	0,0	0,0	31.Oct.2022	31.May.2024
Avslutningsfase	08.Apr.2024	14.Sep.2024	0,0	0,0	0,0	08.Apr.2024	14.Sep.2024
Riggmannskap	08.Mar.2021	07.Aug.2024	1,9	1,9	1,9	08.Mar.2021	07.Aug.2024

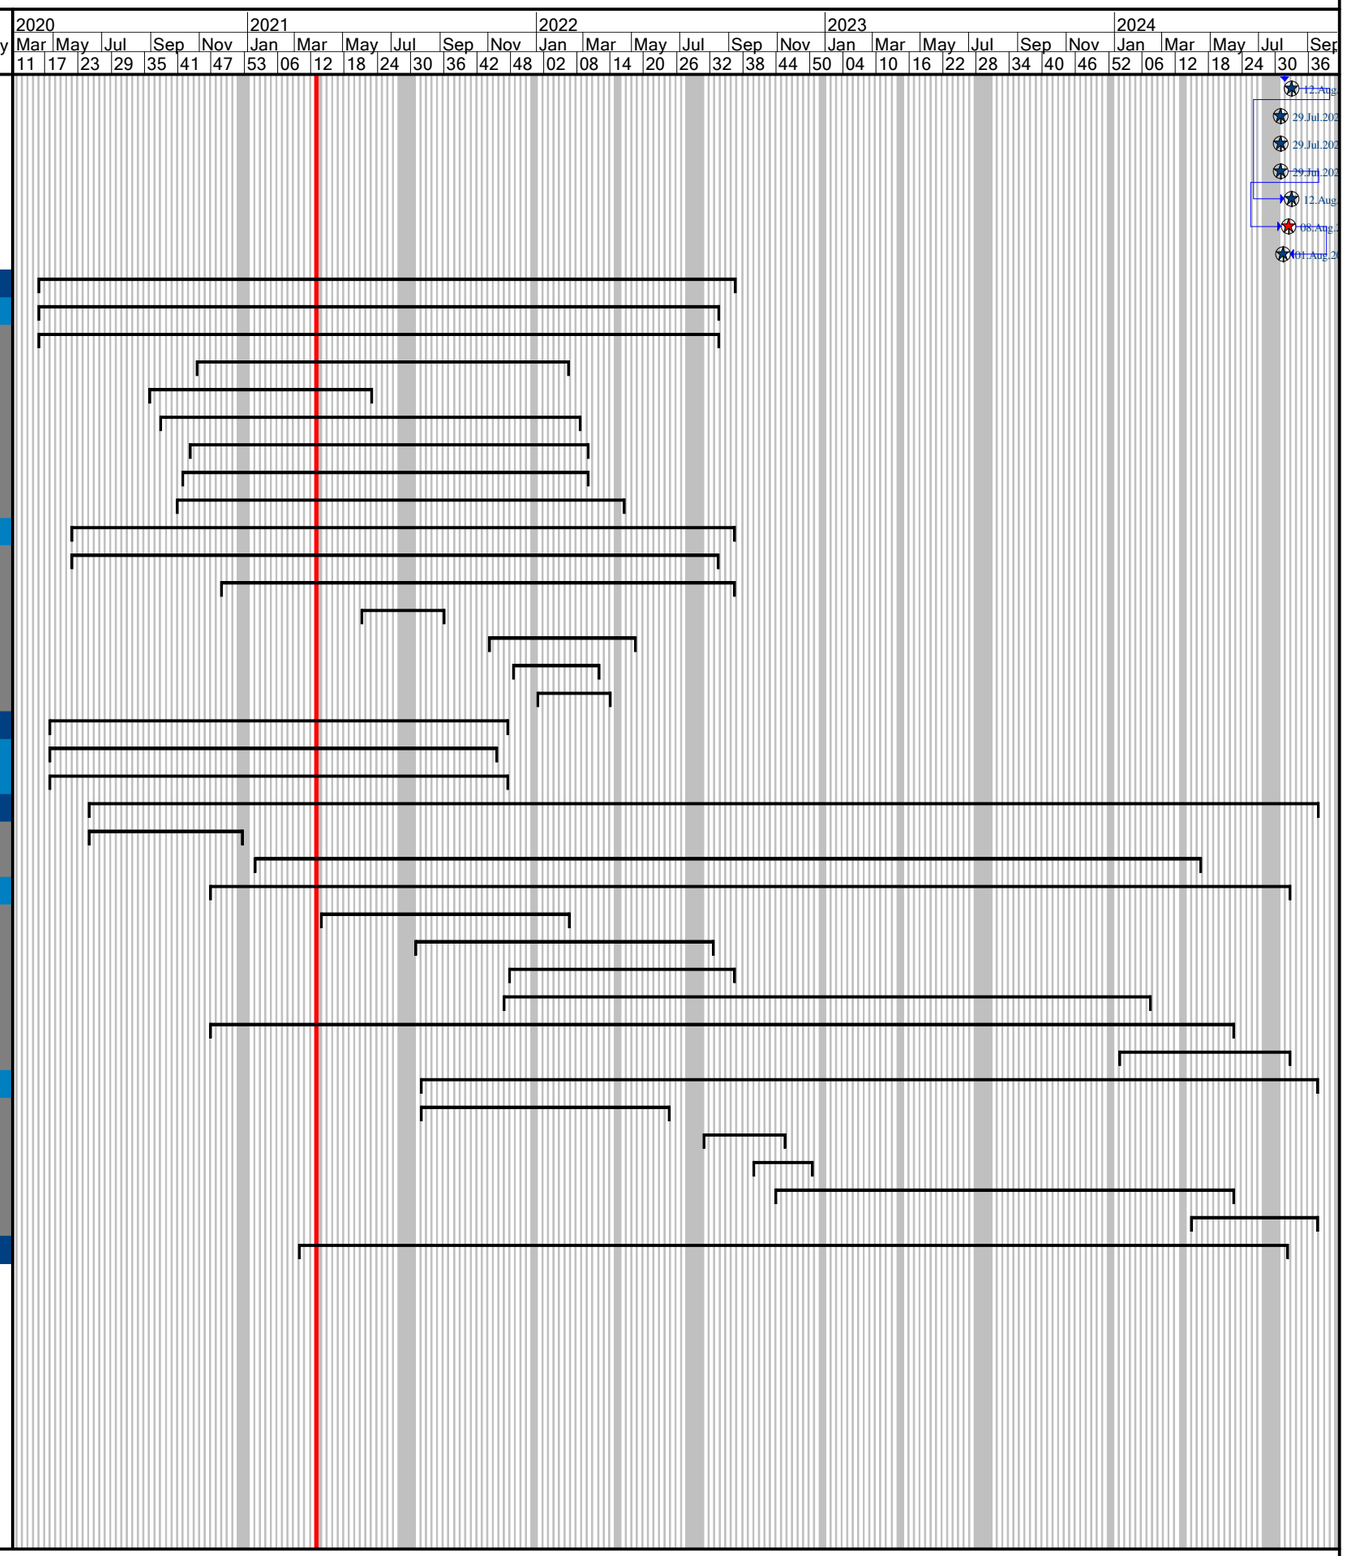

Sammendrag | Fremdriftsplan | Milepel | Dagmulktbelagt frist

Cutoff: 28.03.21
