Dato: ########

Planleggingskalender

Sweco Rehabilitering Avløpsstasjoner PK3/PK4

NRA 10230306
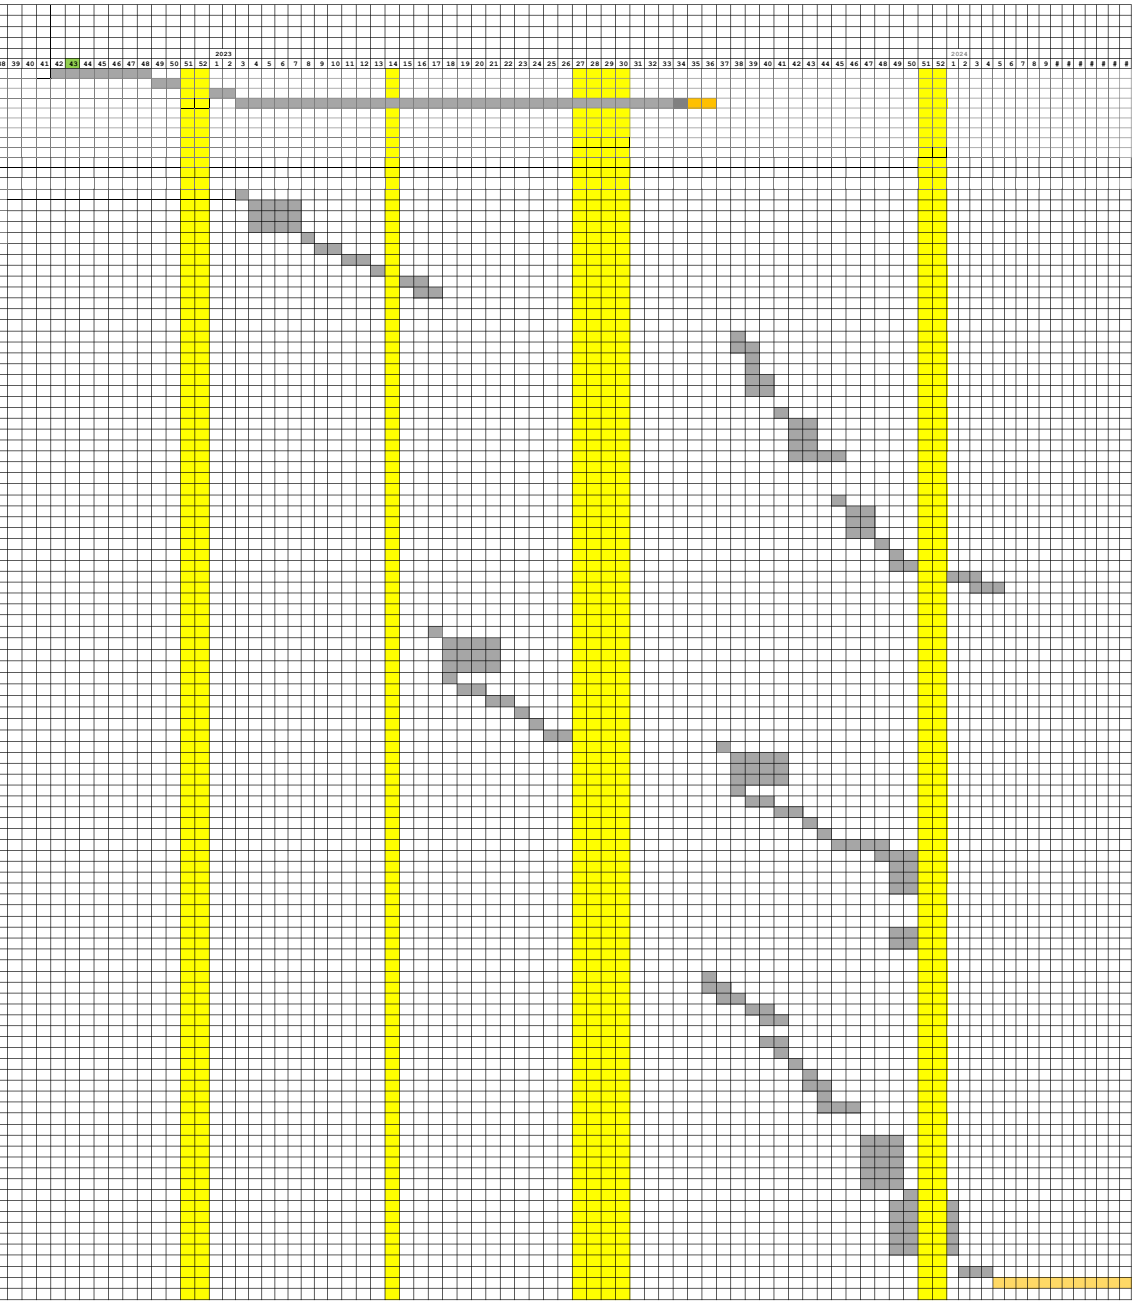
		Kontrakt	ID	Aktivitet	Ansvar	Start	Varighet
Felles ytelser				Utlysning utførende ENTR			
Felles ytelser				Antatt tidspunkt tildeling LK			
Felles ytelser				Kontrollmåling utførende ENTR			
Felles ytelser				Produksjon og leveringstid long lead items - skrue pumpe			
Felles ytelser				Juleferie 2022			
Felles ytelser				Påske 2023			
Felles ytelser				Sommerferie 2023			
Felles ytelser				Juleferie 2023			
Felles ytelser				Påskeferie 2024 uke 14			
P01 og P0	**Forberedende arbeider**			**PK3 Arbeider**			
		B1		Grave fram PK3			
		B1		Etablere ny adkomst/hus			
		B1		Rive glassvegger etablere pro dekke pumpe 1 og 2			
		B1		Klargjøre/pigge rengjøre for P3			
		B1		Sandblåsing vegger i pumperom			
		B1		Slipe, impregnere vegger under dekke			
		B1		Støpe lukevegg			
		B1		Legge opp provrør for P04 til maskinrom			
		M1		Etablere prov.rør gjennom luke			
		M1		Støpe fundament for P03 i maskinrom			
P01 og P0	**Montasje P03/P04 og vanntettet dører**						
(tak av)		B1		Løfte av tak heisekran			
(tak av)		B1		Sage betong for vanntette dører, løfte ut sageblokker			
(tak av)		B1		Heise inn og Montere vanntette dører			
(tak av)		B1		Heise inn P03			
(tak av)		B1		Etablere prov. tak/tildekking PK3			
		B1		Understøpte trau P03			
		B1		Understøpte motor hvis behov for P03			
		B1		Montere ny luke HL03			
		B1		Heise ned P04 (provpumpe), kople til			
		B1		Prov strøm og styring inkl nivågiver for P03 og P04			
		B1		Prov tildekking av kanal/pumpe P03 med tre el stål?			
		B1		SAT1 - Testdrift av P03 og P04 uten avløpsvann			
P01, P02,	**Idriftsetting prov drift P03 og P04**						
		M1		Bytte ventil V02 nødoverløp DN600 i kum via nye dører			
Overlepsdrift		M1		Montere ny innløsventil V01			
Overlepsdrift		B1		Kjernebore i vegg mot P03			
Overlepsdrift		M1		Montere platekasse og rør inn til P03 fra V01			
		M1		Åpne V01			
Start ny pumpe P3		M1		Idriftsetting av P03 (Kapslet inn og kjøres tildekket med tilluft)			
		M1		Prøvedrift P03 1 uke, mens P01 og P02 er avstengt			
		M1		Stenge V03			
		B1		Spyle, rengjøre og tørke opp P01 og P02			
P03 og P0	**Rivearbeider**			**PK4 Arbeider**			
		B1		Grave fram PK4			
		B1		Etablere ny adkomst/hus			
		B1		Rive glassvegger etablere pro dekke pumpe 1 og 2			
		B1		Klargjøre/pigge rengjøre for P3			
		B1		Sandblåsing vegger i pumperom			
		B1		Slipe, impregnere vegger under dekke			
		B1		Støpe lukevegg			
		B1		Legge opp provrør for P04 til maskinrom			
		B1		Etablere prov.rør gjennom luke			
		B1		Støpe fundament for P03 i maskinrom			
(tak av)		B1		Heise av prov. tak PK3			
(tak av)		B1		Heise ut P01 og P02			
(tak av)		B1		Reetablere prov. tak PK3			
		B1		Klargjøre/sage/pigge rømmer for nye P01 og P02, uttransport via maskinrom			
		B1		Rive alt teknisk i maskinrom (komplett riving)			
		B1		Klargjøre/modifisere fundamenter for P01 og P02			
		B1		Tette hull i yttervegger og mellom vegger			
		B1		Slipe/sandblåse vegger og gulv i maskinrom			
		B1		Slipe vegger i kanal 1 og 2			
		B1		Hullta i vegg mellom P02 og P03, forberede for vaiersag av vegg			
		B1		Støpe nye lukevegger i kanal 1 og 2			
		B1		Impregnere vegger under dekke i pumperom			
		B1		Sprøytesmale vegger i pumperom			
		B1		Sandblåse/Sprøytesmale elementer for tak ute før montering			
P03 og P0	**Maskinrom**						
		B1		Male vegger og tak			
		B1		Male gulv (strøk nr 1)			
		B1		Montere nye tavler og annet teknisk utstyr og ventilasjon luft inn i maskinrom			
P03 og P0	**Montasje P01 og P02**						
Tak av		B1		Heise av prov tildekking PK3			
Tak av		B1		heise inn og montere luker HL01 og HL02			
Tak av		B1		Heise inn og montere P01			
Tak av		B1		Heise inn og montere P02			
Tak av		B1		Reetablere prov. tak PK3			
		B1		Understøpe evt. motorer i maskinrom			
		B1		Understøpe P01 og P02			
		B1		Etablere instrumentering i innløpskanal (Nivåmåling)			
		B1		Etablere tildekking P01 og P02 ALU tildekning på			
		B1		Kople til P01 og P02 -til nye tavler			
				SAT2 - test av P01 og P02 uten avløpsvann			
P01, P02,	**Idriftsetting av P01 og P02**						
Overlepsdrift				Stenge V01			
Overlepsdrift		B1		Rive rør inn til P03 (pro bygget)			
Overlepsdrift		B1		Sage vegg med vaiersag innløp P03 (elementer slik at denne kan heises ut)			
Overlepsdrift		B1		Forsegle armering i sagesnitt			
Overlepsdrift		B1		Åpne V03 og V01			
P01, P02 (P03, P04 i backup)				Idriftsetting P01 og P02 med avløpsvann og ny styring			
				Prøvedrift P01 og P02 i 1 uke			
		B1		Fjerne P04 og pumperør			
		B1		Fjerne prov. pumperør			
		B1		Bygge om strøm for P03 til perm tavle			
		B1		SAT3 - P03			
	Tildekking P03						
P01 og P02		B1		Dekke til P03 ALU overdekning som P01 og P02			
Prøvedrift							
P01, P02	Normal drift
