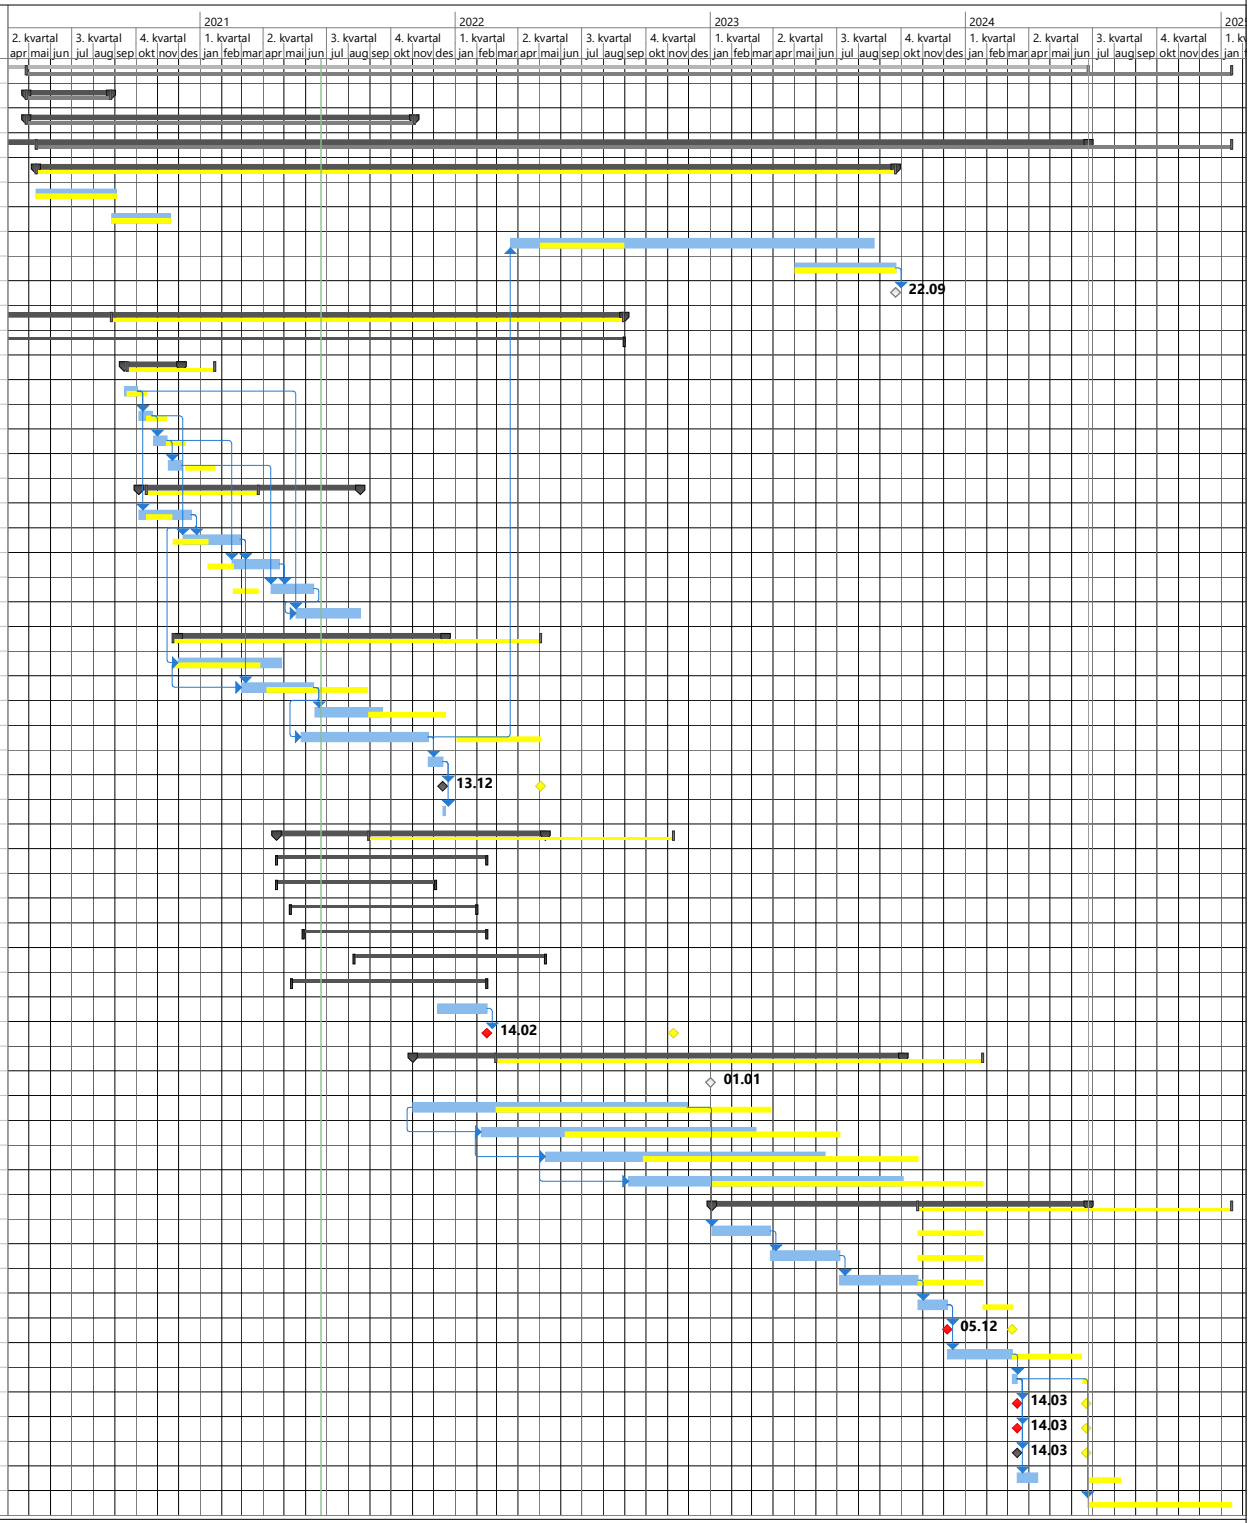ID	Aktiv	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
0		**NHS Fremdriftsplan**	**941 dager**	**ma 23.03.20**	**ma 24.06.24**
1		**Byggherre**	**63 dager**	**ma 27.04.20**	**on 26.08.20**
12		**Prosjektering**	**333 dager**	**ma 27.04.20**	**ti 02.11.21**
43		**Byggefase**	**941 dager**	**ma 23.03.20**	**ma 24.06.24**
44		**Rigg, VA, Bølgevoll og Utomhus**	**735 dager**	**ma 11.05.20**	**fr 22.09.23**
45		Rigging Hammerfest	3 mndr	ma 11.05.20	on 02.09.20
46		VA arbeid	3 mndr	to 27.08.20	on 18.11.20
47		Bølgevoll (Opphold vinter 22/23)	15 mndr	ma 21.03.22	ti 22.08.23
48		Utomhus	4 mndr	ti 02.05.23	fr 22.09.23
49		Utomhus ferdig	0 dager	fr 22.09.23	fr 22.09.23
50		**Grunn og fundamenter**	**526 dager**	**ma 23.03.20**	**ti 30.08.22**
51		**Grunnarbeid/gravearbeid**	**526 dager**	**ma 23.03.20**	**ti 30.08.22**
58		**Peling**	**60 dager**	**ma 14.09.20**	**fr 04.12.20**
59		Peling B1	15 dager	ma 14.09.20	fr 02.10.20
60		Peling B2	15 dager	ma 05.10.20	fr 23.10.20
61		Peling B3	15 dager	ma 26.10.20	fr 13.11.20
62		Peling B4	15 dager	ma 16.11.20	fr 04.12.20
63		**Fundamentering**	**187 dager**	**ma 05.10.20**	**ti 17.08.21**
64		Fundamentering B1	55 dager	ma 05.10.20	fr 18.12.20
65		Fundamentering B2	50 dager	ma 07.12.20	fr 26.02.21
66		Fundamentering B3	44 dager	ma 15.02.21	fr 23.04.21
67		Fundamentering B4	41 dager	ma 12.04.21	fr 11.06.21
68		Fundamentering B1 Del3 (trenger avklaringer energisentra	45 dager	ti 18.05.21	ti 17.08.21
69		**Råbygg**	**235 dager**	**ma 30.11.20**	**fr 17.12.21**
70		Bæresystem B1	18 ukr	ma 30.11.20	ma 26.04.21
71		Bæresystem B2	13 ukr	ma 01.03.21	fr 11.06.21
72		Bæresystem B3	10 ukr	ma 14.06.21	fr 17.09.21
73		Bæresystem B4	22 ukr	ti 25.05.21	ma 22.11.21
74		Bæresystem B1 Del3 (trenger avklaringer energisentral)	3 ukr	ti 23.11.21	ma 13.12.21
75		Komplett bæresystem	0 dager	ma 13.12.21	ma 13.12.21
76		Balkonger (3stk) B4	4 dager	ti 14.12.21	fr 17.12.21
77		**Klimaskjerm**	**235 dager**	**ti 20.04.21**	**ma 09.05.22**
78		**YV-elementer**	**181 dager**	**ti 20.04.21**	**ma 14.02.22**
79		**Forberedelse - sviller/vinkler etc.**	**140 dager**	**ti 20.04.21**	**fr 03.12.21**
108		**Montasje elementer**	**157 dager**	**ma 10.05.21**	**ma 31.01.22**
141		**Etterarbeid - taping/dytt etc.**	**157 dager**	**fr 28.05.21**	**ma 14.02.22**
166		**Fasadekledning**	**180 dager**	**ma 09.08.21**	**ma 09.05.22**
171		**Taktekking (hovedbygg)**	**165 dager**	**on 12.05.21**	**ma 14.02.22**
176		Alufasade	40 dager	ti 07.12.21	ma 14.02.22
177		**Tett bygg**	0 dager	ma 14.02.22	ma 14.02.22
178		**Innredning**	**420 dager**	**ma 01.11.21**	**ti 03.10.23**
179		Stabil varme og kjøling fra varmesentral (BH-ansvar)	0 dager	sø 01.01.23	sø 01.01.23
180		Innredning B1 (taktplan under utarbeiding)	12 mndr	ma 01.11.21	ma 28.11.22
181		Innredning B2 (taktplan under utarbeiding)	12 mndr	ma 07.02.22	ma 06.03.23
182		Innredning B3 (taktplan under utarbeiding)	12 mndr	ti 10.05.22	ti 13.06.23
183		Innredning B4 (taktplan under utarbeiding)	12 mndr	ti 06.09.22	ti 03.10.23
184		**Systematisk ferdigstillelse**	**336 dager**	**ti 03.01.23**	**ma 24.06.24**
185		Systemtester B1 (avklaringer pågår)	3 mndr	ti 03.01.23	ma 27.03.23
186		Systemtester B2 (avklaringer pågår)	3 mndr	ti 28.03.23	ti 04.07.23
187		Systemtester B3 (avklaringer pågår)	3 mndr	on 05.07.23	ti 24.10.23
188		Systemtester B4 (avklaringer pågår)	1,5 mndr	on 25.10.23	ti 05.12.23
189		**Ferdigmelding arbeider/ mekanisk ferdigstilt**	0 dager	ti 05.12.23	ti 05.12.23
190		Systematisk ferdigstillelse / stabilitetstester	3 mndr	on 06.12.23	to 07.03.24
191		Byggherrens fullskalatest	1 uk	fr 08.03.24	to 14.03.24
192		**Utført systematisk ferdigstillelse**	0 dager	to 14.03.24	to 14.03.24
193		**Godkjent dokumentasjon**	0 dager	to 14.03.24	to 14.03.24
194		Delovertakelse "igangkjørt bygg"	0 dager	to 14.03.24	to 14.03.24
195		Byggherrens verifikasjonsfase	3 ukr	fr 15.03.24	fr 12.04.24
196		Oppstart prøvedrift	1 dag	ma 24.06.24	ma 24.06.24
