ORIENTERENDE FREMDRIFTSPLAN SYKEHUSUTBYGGING STAVANGER

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors
1	**INFRASTRUKTUR- OG LARK-ENTREPRISER**	1466 days?	Wed 02.05.18	Fri 27.09.24		
2	**INFRASTRUKTUR**	1466 days?	Wed 02.05.18	Fri 27.09.24		
3	**K7801 - Anleggsveier**	174 days?	Wed 16.05.18	Fri 15.02.19		
7	**K7802 - Teknisk kulvert sykehus**	453 days	Fri 26.10.18	Fri 16.10.20		
13	**K7803 - R.J. gate og Torg 24/25**	934 days?	Wed 02.05.18	Fri 27.05.22		
37	**K7804 - Ny adkomstvei**	1009 days?	Wed 10.04.19	Mon 18.09.23		
38	**Detaljregulering**	577 days?	Wed 10.04.19	Tue 26.10.21		
57	**Konkurransegrunnlag**	639 days	Mon 05.08.19	Fri 29.04.22		
74	**Anskaffelse**	90 days	Fri 14.01.22	Wed 01.06.22		
81	**Byggefase (iht. faseplaner)**	292 days	Wed 01.06.22	Mon 18.09.23		
82	Fase 0	43 days	Wed 01.06.22	Fri 29.07.22		
83	Fase 1	151 days	Thu 07.07.22	Thu 02.02.23		
84	Fase 2	130 days	Thu 08.09.22	Thu 16.03.23		85
85	Fase 3	60 days	Fri 17.03.23	Thu 22.06.23	84	86
86	Fase 4	47 days	Fri 23.06.23	Mon 18.09.23	85	
87	**K7805 - Torg 21/22**	455 days	Thu 06.10.22	Fri 27.09.24		
88	**Konkurransegrunnlag**	155 days	Thu 06.10.22	Thu 01.06.23		
89	Avklaring opparbeidelsesnivå	0 days	Thu 06.10.22	Thu 06.10.22		90
90	Oppdatere modell	40 days	Thu 06.10.22	Wed 30.11.22	89	92;91
91	TMK + tegningsproduksjon	59 days	Thu 01.12.22	Wed 01.03.23	90	93
92	Oppdatere beskrivelse	20 days	Thu 02.02.23	Wed 01.03.23	90	93
93	Innlevering Stavanger kommune	0 days	Fri 03.03.23	Fri 03.03.23	91;92	94
94	Gjennomsyn Stavanger kommune	20 days	Fri 03.03.23	Thu 30.03.23	93	95
95	Oppdatere etter gjennomsyn	10 days	Fri 31.03.23	Fri 21.04.23	94	96
96	Andre gjennomsyn Stavanger kommune	20 days	Mon 24.04.23	Wed 24.05.23	95	97
97	Oppdatere etter andre gjennomsyn	5 days	Thu 25.05.23	Thu 01.06.23	96	98
98	Varsle tiltredelse Ipark	0 days	Thu 01.06.23	Thu 01.06.23	97	100;107FS+1
99	**Anskaffelse**	110 days	Thu 01.06.23	Thu 23.11.23		
100	Kunngjøring av konkurranse	0 days	Thu 01.06.23	Thu 01.06.23	98	103FS+70 da
101	Tilbudsfase	45 days	Fri 02.06.23	Thu 24.08.23	100	102
102	Utarbeide arbeidsgrunnlag	20 days	Fri 25.08.23	Thu 21.09.23	101	
103	Kontrahering	30 days	Fri 29.09.23	Thu 09.11.23	100FS+70 da	104
104	Arbeidsgrunnlag til byggherrekontroll	0 days	Thu 09.11.23	Thu 09.11.23	103	105FS+10 da
105	Arbeidsgrunnlag til entreprenør	0 days	Thu 23.11.23	Thu 23.11.23	104FS+10 da	
106	**Byggefase**	180 days	Fri 08.12.23	Fri 27.09.24		
107	Tilrigging	10 days	Fri 08.12.23	Thu 21.12.23	98FS+120 da	108;109
108	Torg 22	80 days	Fri 22.12.23	Mon 29.04.24	107	110;111
109	VA kollektivtrase	40 days	Fri 22.12.23	Fri 23.02.24	107	
110	Torg 21	90 days	Tue 30.04.24	Fri 27.09.24	108	113
111	Torg 25	35 days	Tue 30.04.24	Fri 21.06.24	108	112
112	Slitelag, ledelinjer og vegmerking K7803	15 days	Mon 24.06.24	Fri 12.07.24	111	
113	Ferdigstillelse	0 days	Fri 27.09.24	Fri 27.09.24	110	
114	**K7806 - Forbelastning og kartlegging kulvert**	101 days	Tue 01.11.22	Wed 29.03.23		
115	**Konkurransegrunnlag**	22 days	Tue 01.11.22	Wed 30.11.22		
117	**Anskaffelse**	15 days	Thu 01.12.22	Wed 21.12.22		
119	**Byggefase**	63 days	Mon 02.01.23	Wed 29.03.23		
120	Tilrigging	23 days	Mon 02.01.23	Wed 01.02.23		121
121	Forbelastning kollektivakse	40 days	Thu 02.02.23	Wed 29.03.23	120	123
122	Kartlegging kulvert iPark	14 days	Thu 12.01.23	Tue 31.01.23		
123	Ferdigstillelse	0 days	Wed 29.03.23	Wed 29.03.23	121	
124	**K7807 - OV-kulvert Hafrsfjord**	870 days	Wed 18.03.20	Mon 08.01.24		
125	**Detaljregulering**	285 days	Wed 18.03.20	Thu 17.06.21		
130	**Konkurransegrunnlag**	204 days	Fri 25.06.21	Mon 16.05.22		
143	**Anskaffelse**	72 days	Wed 22.06.22	Thu 20.10.22		
151	**Byggefase (iht. Faseplaner)**	279 days	Mon 24.10.22	Mon 08.01.24		
152	Fase 0	10 days	Mon 24.10.22	Fri 04.11.22		153
153	Fase 1	30 days	Mon 07.11.22	Fri 16.12.22	152	154
154	Fase 2	120 days	Mon 19.12.22	Mon 26.06.23	153	155
155	Fase 3	51 days	Tue 27.06.23	Tue 26.09.23	154	156
156	Fase 4	68 days	Wed 27.09.23	Mon 08.01.24	155	
157	**K7808 - Kollektivakse nord og sør**	461 days	Thu 01.09.22	Mon 02.09.24		
158	**Konkurransegrunnlag**	131 days	Thu 01.12.22	Fri 23.06.23		
159	Modellering	45 days	Thu 01.12.22	Thu 09.02.23		160

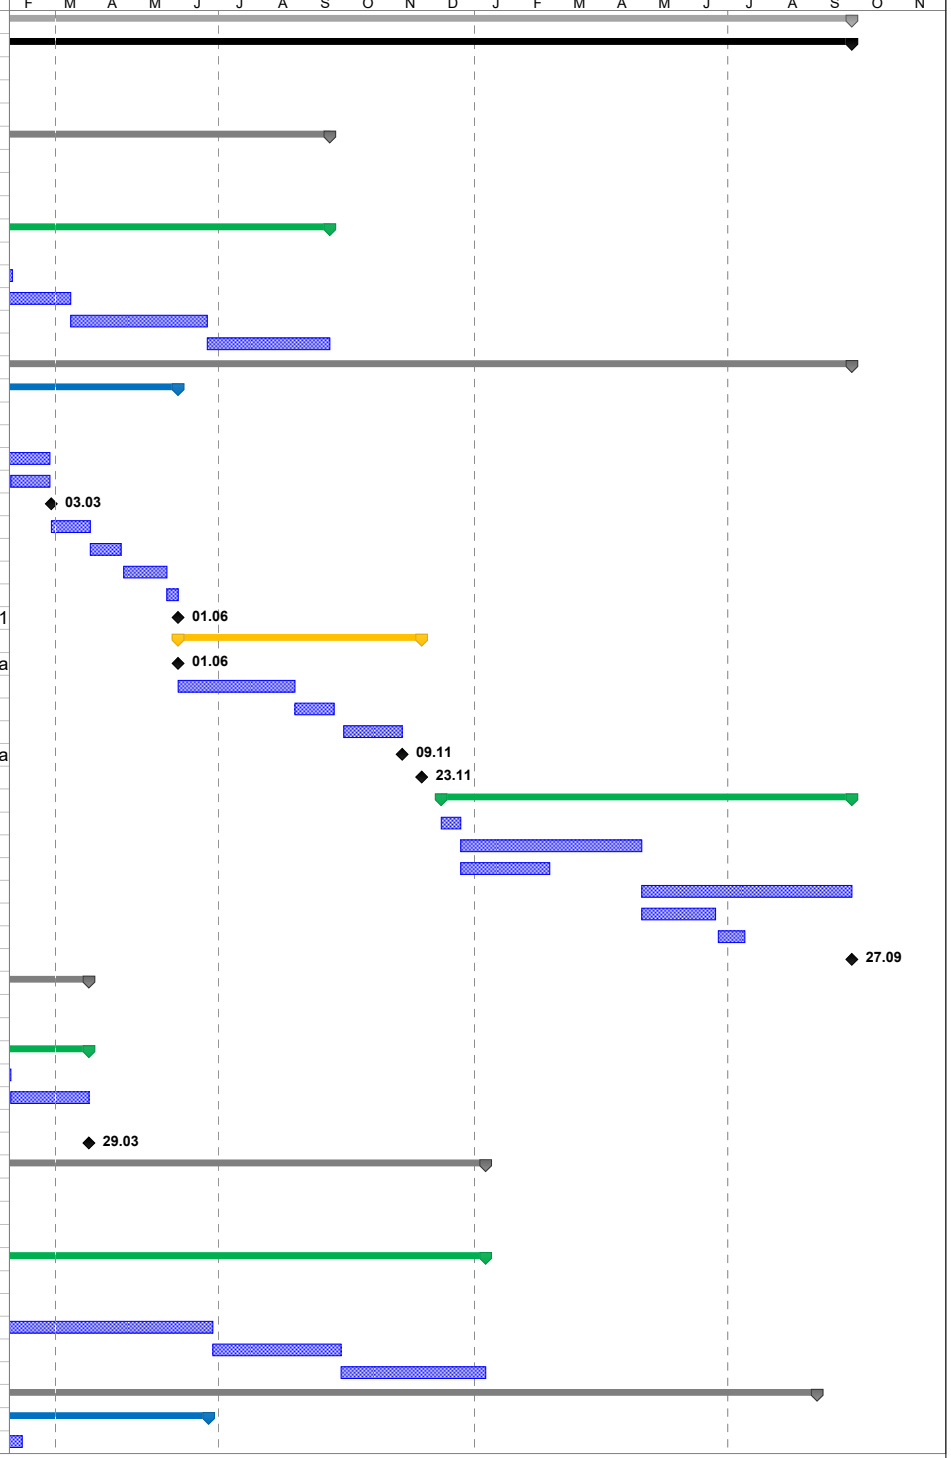

ORIENTERENDE FREMDRIFTSPLAN SYKEHUSUTBYGGING STAVANGER
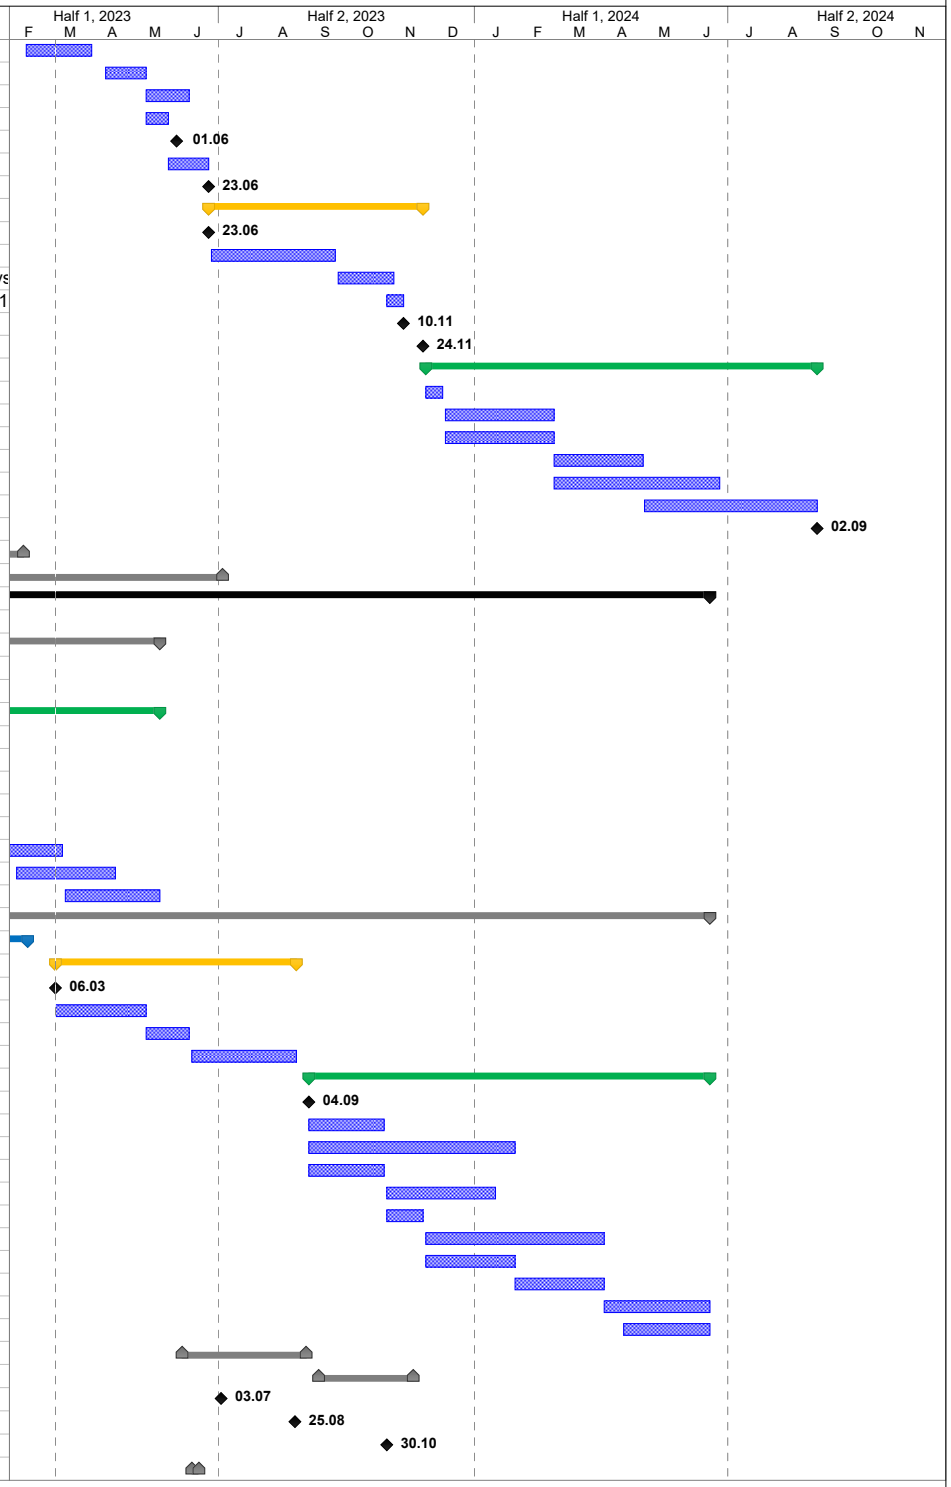
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors
160	TMK + tegningsproduksjon	35 days	Mon 13.02.23	Fri 31.03.23	159	161
161	Gjennomsyn RFK	20 days	Tue 11.04.23	Tue 09.05.23	160	163;162
162	Beskrivelse	20 days	Wed 10.05.23	Fri 09.06.23	161	
163	Revisjon etter gjennomsyn	10 days	Wed 10.05.23	Thu 25.05.23	161	164;165
164	Varsle tiltredelse Ipark	0 days	Thu 01.06.23	Thu 01.06.23	163	
165	2. gjennomsyn RFK	20 days	Fri 26.05.23	Fri 23.06.23	163	166
166	Konkurransegrunnlag ferdigstilt	0 days	Fri 23.06.23	Fri 23.06.23	165	168
167	**Anskaffelse**	95 days	Fri 23.06.23	Fri 24.11.23		
168	Kunngjøring av konkurranse	0 days	Fri 23.06.23	Fri 23.06.23	166	169
169	Tilbudsfase	50 days	Mon 26.06.23	Fri 22.09.23	168	170
170	Kontrahering	30 days	Mon 25.09.23	Fri 03.11.23	169	171FS-5 days
171	Utarbeide arbeidsgrunnlag	10 days	Mon 30.10.23	Fri 10.11.23	170FS-5 days	172;173FS+1
172	Arbeidsgrunnlag til byggherrekontroll	0 days	Fri 10.11.23	Fri 10.11.23	171	
173	Arbeidsgrunnlag klar til entreprenør	0 days	Fri 24.11.23	Fri 24.11.23	171FS+10 da	175
174	**Byggefase**	170 days	Mon 27.11.23	Mon 02.09.24		
175	Tilrigging	10 days	Mon 27.11.23	Fri 08.12.23	173	176;177
176	Kollektivakse Kjell Arholms gate	50 days	Mon 11.12.23	Mon 26.02.24	175	178
177	Kollektivakse grensesnitt Rfk - Torg 24/25	50 days	Mon 11.12.23	Mon 26.02.24	175	179
178	Kollektivakse Arkivenes Hus	40 days	Tue 27.02.24	Tue 30.04.24	176	180
179	Kollektivakse Torg 24/25 - grensesnitt K7702	75 days	Tue 27.02.24	Mon 24.06.24	177	
180	Kollektivakse Ipark + POH veg	70 days	Thu 02.05.24	Mon 02.09.24	178	181
181	Ferdigstillelse	0 days	Mon 02.09.24	Mon 02.09.24	180	
182	**Ny nettstasjon NRK-tomt (L-nett)**	**30 days**	**Mon 02.01.23**	**Fri 10.02.23**		
183	**Flytting vernet bygg Amerikatelegrafen**	**202 days**	**Thu 01.09.22**	**Mon 03.07.23**		
187	**LARK**	901 days?	Mon 03.08.20	Mon 17.06.24		
188	**K7704 Overbygning Torg 23B**	**94 days?**	**Thu 05.11.20**	**Fri 26.03.21**		
192	**K7703 - Gårdsrom og helikopterlanding**	**652 days?**	**Mon 03.08.20**	**Fri 19.05.23**		
193	**Konkurransegrunnlag**	85 days?	Mon 03.08.20	Fri 27.11.20		
196	**Anskaffelse**	120 days?	Mon 14.12.20	Tue 22.06.21		
200	**Byggefase**	424 days	Mon 02.08.21	Fri 19.05.23		
201	Helikopterlanding	80 days	Mon 02.08.21	Fri 19.11.21		
202	Gårdsrom Bygg 81 S	61 days	Mon 21.03.22	Fri 24.06.22		
203	Gårdsrom Bygg 81 N	51 days	Tue 19.04.22	Fri 01.07.22		
204	Gårdsrom Bygg 71	65 days	Mon 13.06.22	Fri 30.09.22		
205	Gårdsrom Bygg 21	80 days	Mon 12.09.22	Mon 09.01.23		
206	Gårdsrom Bygg 11 vest	45 days	Mon 09.01.23	Fri 10.03.23		
207	Gårdsrom Bygg 11 midt	45 days	Mon 06.02.23	Mon 17.04.23		
208	Gårdsrom Bygg 11 øst	41 days	Mon 13.03.23	Fri 19.05.23		
209	**K7705 - Hovedtorget og parker**	**739 days?**	**Tue 06.04.21**	**Mon 17.06.24**		
210	**Konkurransegrunnlag**	**430 days?**	**Tue 06.04.21**	**Mon 13.02.23**		
223	**Anskaffelse**	**100 days**	**Mon 06.03.23**	**Fri 25.08.23**		
224	Kunngjøring	0 days	Mon 06.03.23	Mon 06.03.23		225
225	Tilbudsfase	40 days	Mon 06.03.23	Tue 09.05.23	224	226
226	Kontrahering	20 days	Wed 10.05.23	Fri 09.06.23	225	227
227	Koordinering byggeplass/oppstart	40 days	Mon 12.06.23	Fri 25.08.23	226	
228	**Byggefase**	**190 days**	**Mon 04.09.23**	**Mon 17.06.24**		
229	Oppstart	0 days	Mon 04.09.23	Mon 04.09.23		230;231;232
230	Varegården + veg	40 days	Mon 04.09.23	Fri 27.10.23	229	
231	Våtmarken + akuttvei	100 days	Mon 04.09.23	Mon 29.01.24	229	
232	Kollektivakse nord	40 days	Mon 04.09.23	Fri 27.10.23	229	233;234
233	Bygg 11 nord	50 days	Mon 30.10.23	Mon 15.01.24	232	
234	Uteservering	20 days	Mon 30.10.23	Fri 24.11.23	232	235;236
235	Hovedtorget	80 days	Mon 27.11.23	Tue 02.04.24	234	
236	Kollektivakse sør	40 days	Mon 27.11.23	Mon 29.01.24	234	237
237	Torg 23c	40 days	Tue 30.01.24	Tue 02.04.24	236	239;238
238	Torg 23a	50 days	Wed 03.04.24	Mon 17.06.24	237	
239	Parkareal Bygg 81	40 days	Wed 17.04.24	Mon 17.06.24	237	
240	**Energibrønner Torg 23C**	**50 days**	**Mon 05.06.23**	**Fri 01.09.23**		
241	**Energibrønner våtmark**	50 days	Mon 11.09.23	Fri 17.11.23		
242	**Oppstart MTU**	**0 days**	**Mon 03.07.23**	**Mon 03.07.23**		
243	**Rigg 7 fjernet**	**0 days**	**Fri 25.08.23**	**Fri 25.08.23**		
244	**Rigg 6 fjernet**	**0 days**	**Mon 30.10.23**	**Mon 30.10.23**		
245	**Prøvelanding helikopter**	**5 days**	**Mon 12.06.23**	**Fri 16.06.23**
