ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1	**Begrensninger**	**523 dager**	**ma 01.01.24**	**on 31.12.25**
2	Hekkeperiode, rovfugl, 2024 (M7 - M22)	131 dager	to 01.02.24	to 01.08.24
3	Hekkeperiode, rovfulg, 2025 (M7 - M22)	131 dager	lø 01.02.25	fr 01.08.25
4	Utkobling fjordspenn ikke mulig	88 dager	ma 01.01.24	on 01.05.24
5	Utkobling fjordspenn ikke mulig	153 dager	ti 01.10.24	to 01.05.25
6	Utkobling fjordspenn ikke mulig	66 dager	on 01.10.25	on 31.12.25
7				
8				
9	**Byggeperiode, Seksjon 1 (Stålmaster M1-M5)**	**358 dager**	**to 02.05.24**	**ma 15.09.25**
10	Mulig oppstart forberedende arbeider, bygging M1+M2	0 dager	to 02.05.24	to 02.05.24
11	Mast M1+M2 ferdigstilt	0 dager	on 30.04.25	on 30.04.25
12	Tidsvindu for arbeider som krever utkobling	97 dager	fr 02.05.25	ma 15.09.25
13	Fjordspenn klart for spenningsetting	0 dager	ma 15.09.25	ma 15.09.25
14				
15	**Byggeperiode, Seksjon 2 (Tremaster M6-M22)**	**193 dager**	**fr 02.08.24**	**on 30.04.25**
16	Oppstart	0 dager	fr 02.08.24	fr 02.08.24
17	Endemast M22 ferdigstilt og klar for kabel	0 dager	to 05.12.24	to 05.12.24
18	Støyende arbeider som må utføres utenfor hekkeperiode hubro ferdigstilt (krav i MTA-plan)	0 dager	fr 31.01.25	fr 31.01.25
19	Linje ferdig bygd og godkjent av Fagne	0 dager	on 30.04.25	on 30.04.25
20				
21	**Ombygging 22kV linje Klovning**	**260 dager**	**to 02.05.24**	**on 30.04.25**
22	Mulig oppstart ombyggingsarbeider	0 dager	to 02.05.24	to 02.05.24
23	Linje ferdig bygd, koblet og godkjent av Fagne	0 dager	on 30.04.25	on 30.04.25
24				
25				
26	**Kabelgrøft HNP - Endemast M22**	**130 dager**	**fr 02.08.24**	**fr 31.01.25**
27	Mulig oppstart kabelgrøft	0 dager	fr 02.08.24	fr 02.08.24
28	Ferdigstilt kabelgrøft	0 dager	fr 31.01.25	fr 31.01.25
29				
30	**Kabelgrøft Klovning-M1**	**66 dager**	**to 01.08.24**	**to 31.10.24**
31	Oppstart graving av grøft Klovning - M1 - 22 kV mast	0 dager	to 01.08.24	to 01.08.24
32	Oppstart trekking av kabler 132 kV, 22 kV ++	0 dager	sø 15.09.24	sø 15.09.24
33	Ferdig montasje av endeavslutning + arbeid i kabelmast	0 dager	to 31.10.24	to 31.10.24
34				
35	**Stasjonsarbeid Klovning**	**348 dager**	**ma 01.01.24**	**on 30.04.25**
36	Oppstart montasje kabelstativ ute	0 dager	ma 01.01.24	ma 01.01.24
37	Oppstart montasje 22 kV kabel	0 dager	ma 16.09.24	ma 16.09.24
38	Oppstart montasje endeavslutninger 132 kV	0 dager	fr 01.11.24	fr 01.11.24
39	Ferdig gjennomføringer og ombygging inne i stasjonen	0 dager	on 30.04.25	on 30.04.25
40				
41				
42				
43				
44				

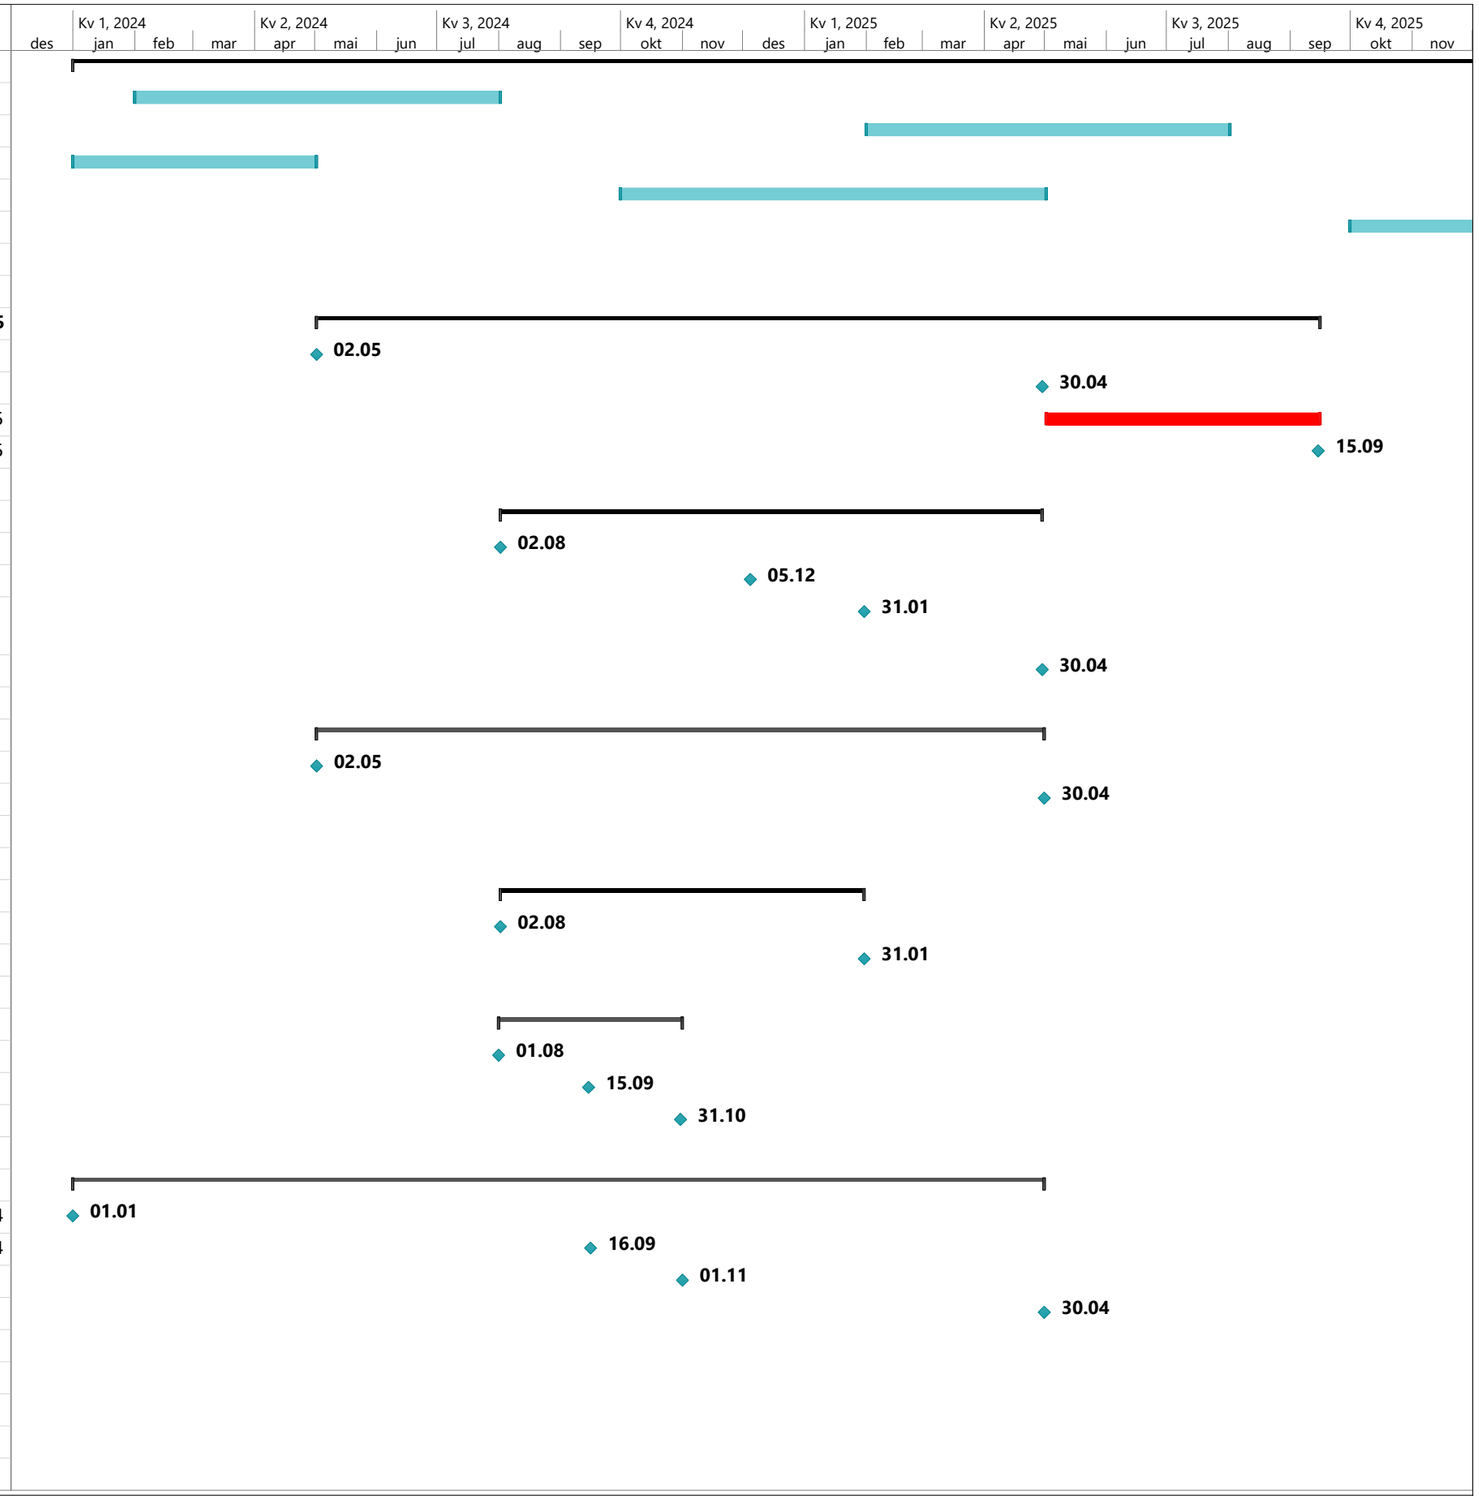

Prosjekt: Overordnet byggeplan
Dato: fr 27.10.23

Aktivitet	Prosjektsammendrag	Manuell aktivitet	Bare start	Tidsfrist
Deling	Inaktiv aktivitet	Bare varighet	Bare slutt	Fremdrift
Milepæl	Inaktiv milepæl	Manuell sammendragsfremheving	Eksterne aktiviteter	Manuell fremdrift
Sammendrag	Inaktivt sammendrag	Manuelt sammendrag	Ekstern milepæl	
