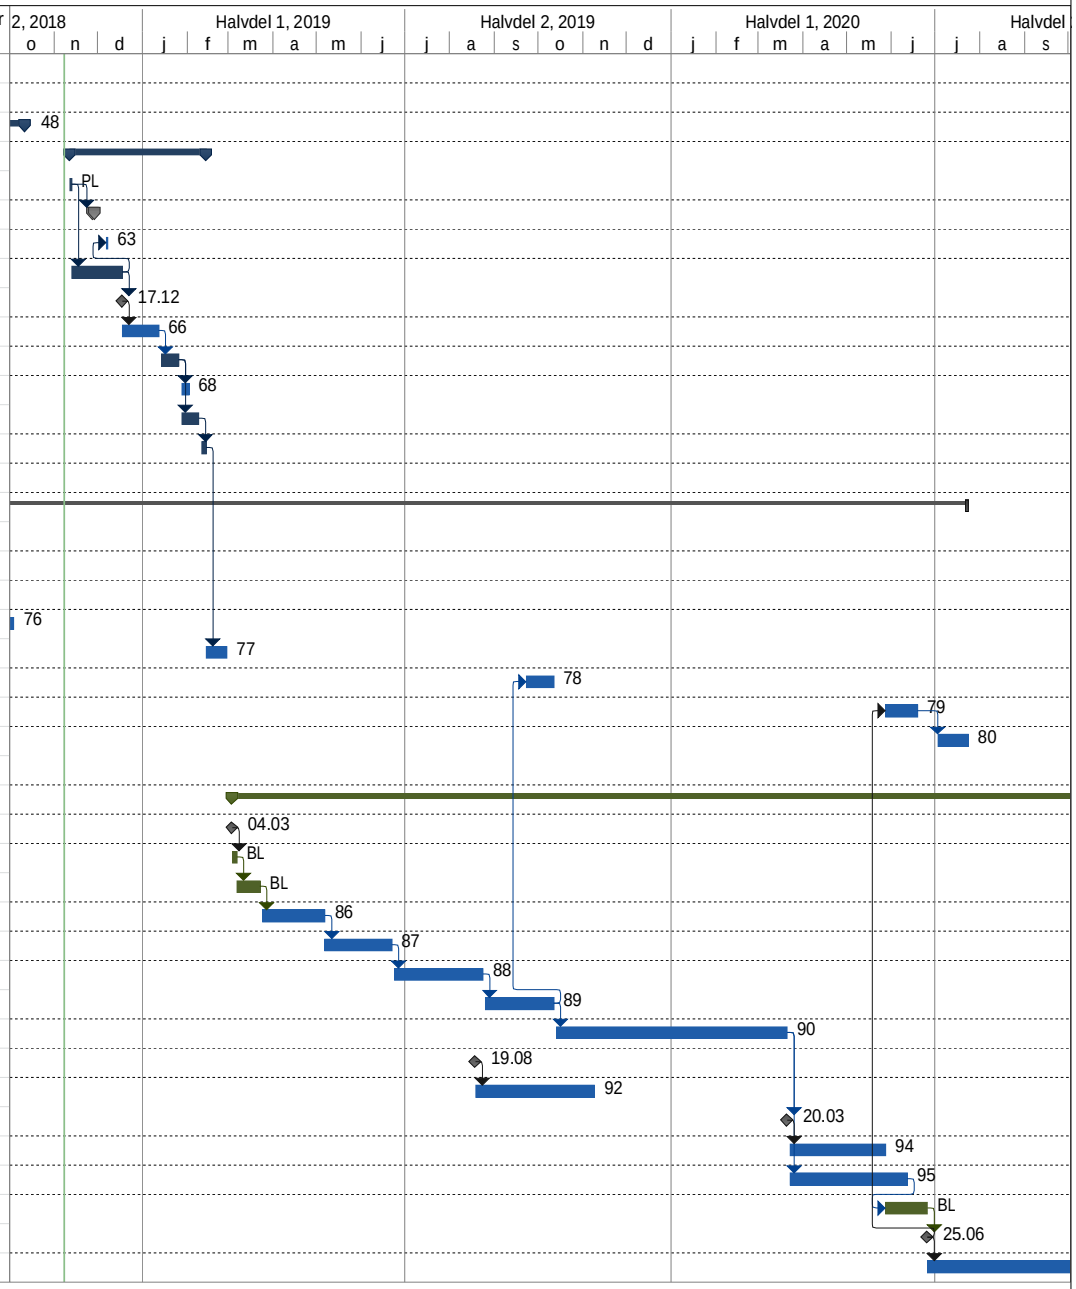ID	Aktivit	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Navn på ressurser
1		**Prosjektering**	**150 dager**	**ma 09.01.17**	**fr 08.09.17**	
35		**REVIDERT FORPROSJEKT**	94 dager	ma 12.02.18	fr 29.06.18	
48		**DETAJLPROSJEKTERING**	**71 dager**	**on 13.06.18**	**fr 12.10.18**	
60		**ANBUDSPROSESS**	61 dager	ma 12.11.18	on 13.02.19	
61		Utlysning	1 dag	ma 12.11.18	ma 12.11.18	PL
62		Anbudsbefaring	1 dag	on 28.11.18	on 28.11.18	
63		Frist til å stille spørsmål	1 dag	fr 07.12.18	fr 07.12.18	
64		Tilbydere kalulerer	25 dager	ti 13.11.18	ma 17.12.18	
65		Frist for å levere tilbud	0 dager	ma 17.12.18	ma 17.12.18	
66		Evaluering hos konsulenter	12 dager	ti 18.12.18	fr 11.01.19	
67		Evaluering BH	10 dager	ma 14.01.19	fr 25.01.19	
68		**Godkjenning MUST**	**5 dager**	**ma 28.01.19**	**fr 01.02.19**	
69		Karensperiode	10 dager	ma 28.01.19	fr 08.02.19	
70		Kontrahering	3 dager	ma 11.02.19	on 13.02.19	
71						
72		**BYGGESAK / SØK**	508 dager	ma 21.05.18	to 23.07.20	
73		Disp.søknad revidert byggelinje	10 dager	ma 21.05.18	fr 01.06.18	ARK/SØK
74		Godkjent tilbygg/heis - Hermetikkmusee	15 dager	ma 04.06.18	fr 22.06.18	ARK/SØK
75		Nabovarsel sendes ut	10 dager	to 21.06.18	on 04.07.18	ARK/SØK
76		Rammesøknad	50 dager	to 05.07.18	on 03.10.18	ARK/SØK
77		IG 1 - Grunn og Råbygg (E01 og E02)	10 dager	to 14.02.19	on 27.02.19	ARK/SØK
78		IG 2 - Resterende	15 dager	ma 23.09.19	fr 11.10.19	ARK/SØK
79		Brukstillatelse	15 dager	to 28.05.20	to 18.06.20	ARK/SØK
80		Ferdigattest	15 dager	fr 03.07.20	to 23.07.20	ARK/SØK
81						
82		**BYGGING OG INSTALLASJON**	**425 dager**	**ma 04.03.19**	**to 10.12.20**	
83		Oppstart byggearbeider	0 dager	ma 04.03.19	ma 04.03.19	
84		Rigging	3 dager	ma 04.03.19	on 06.03.19	BL
85		Rive lagerbygg og felle trær	12 dager	to 07.03.19	fr 22.03.19	BL
86		Graving og sprenging, sikring mot vei	25 dager	ma 25.03.19	ma 06.05.19	BL
87		Fundamenter Bunnplate og betongveg	30 dager	ti 07.05.19	fr 21.06.19	BL
88		Råbygg - stål og betongelementer	30 dager	ma 24.06.19	fr 23.08.19	BL
89		Fasade og taktekking	35 dager	ma 26.08.19	fr 11.10.19	BL
90		Innvendige arbeid og tekn.installasjon	110 dager	ma 14.10.19	fr 20.03.20	BL
91		**Hermetikkmuseet(NHM) stenges**	0 dager	ma 19.08.19	ma 19.08.19	MUST
92		Passasje gjennom NHM etableres	60 dager	ma 19.08.19	fr 08.11.19	BL
93		1. og 2.etg - klar for mediainstallasjon	0 dager	fr 20.03.20	fr 20.03.20	BL
94		Mediainstallasjon - Atelier Brükner	40 dager	ma 23.03.20	on 27.05.20	Atelier Brükner
95		3.etg Komplettering kontorarealer	50 dager	ma 23.03.20	to 11.06.20	BL
96		Innregulering / Testing	20 dager	to 28.05.20	to 25.06.20	BL
97		**Klart for åpning av NGM**	0 dager	to 25.06.20	to 25.06.20	BL
98		Prøvedrift tekniske anlegg	120 dager	fr 26.06.20	to 10.12.20
