


# Entreprise C01

## Tilbudsgrunnlag totalentreprise for etablering av nye ventilasjonsaggregat i bygg 10 SSK

### Del D Fremdrift/dagmulktsbelagte milepæler

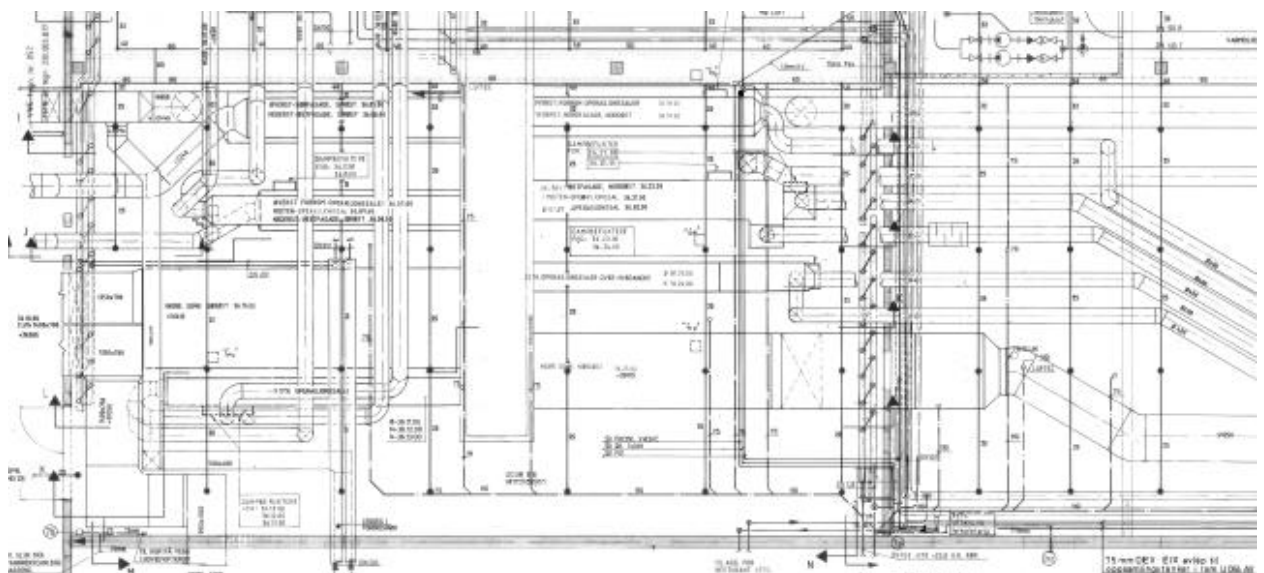

**D1 Byggherrens overordnede fremdriftsplan**

Vedlagt er byggherrens overordnede fremdriftsplan.

Operasjonsavdelingen kan bare frigjøre operasjonsstuer i lavaktivitetsperioder.

Dette innebærer at utskiftning av ventilasjonsanlegg kan foregå i vinterferien, påskeferien og fra ca St- hans til medio august 2021.

Detaljert fremdriftsplan må entreprenør utvikle i samarbeide med somatisk klinikk SSK/ teknisk seksjon SSK

Isolat aggregat utføres vår 2021.

**D2 Dagmulksbelagte milepæler**

Følgende milepæler er dagmulksbelagte, de er vist med rød milepælmarkering på planen:

1. Søknadsgrunnlag for rammetillatelse 01.12.2020
2. Detaljert fremdriftsplan fra totalentreprenør 04.01.2020
3. Samlet FDV dokumentasjon 02.08.2021
4. Overtakelsesforretning med ferdigattest 13.08.2021

Vedlegg: Fremdriftsplan
