




NOTODDEN KOMMUNE

18. MAI 2021

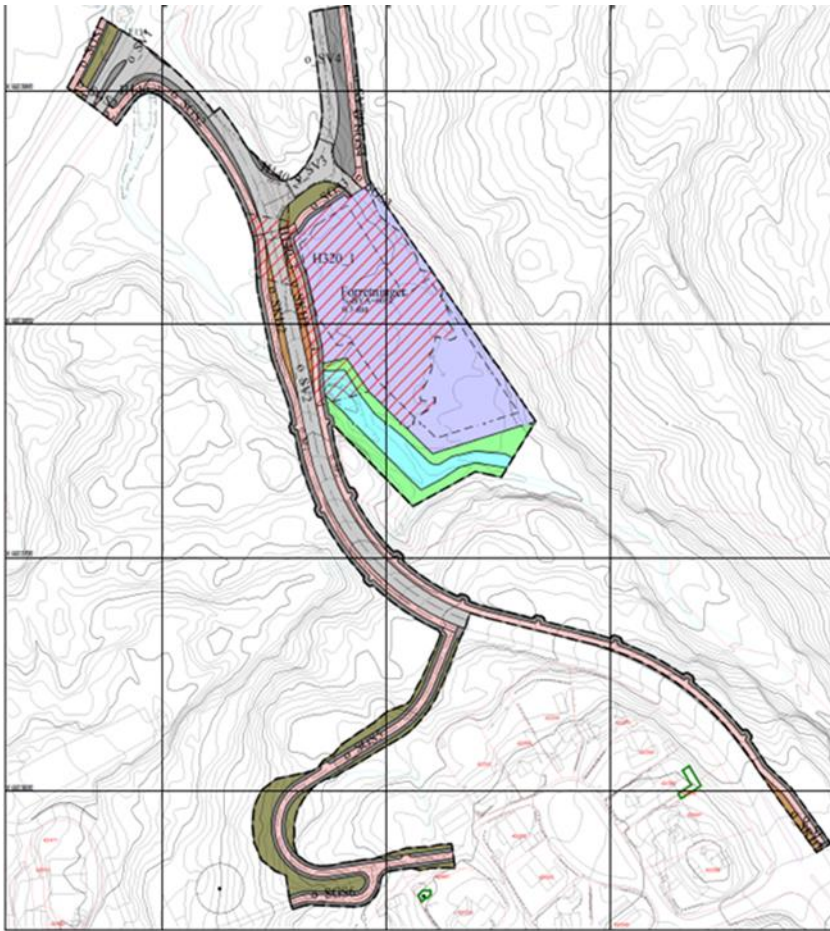

KONKURRANSEGRUNNLAG

FYKERUDSLETTA

GS-VEG / FORTAU, BUSSLOMMER

DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET E. FRISTER OG DAGMULKTER



Dokument	Notodden kommune / Konkurransgrunnlaget del II	Dokumentkategori	Kontraktsgrunnlaget E Frister og Dagmulkter
Opprettet	11.09.2020	Siste revisjon	10.05.2021
		Dokument ansvarlig	Olav Berget

Oppdragsgiver: Notodden kommune
Oppdragsgivers kontaktperson: Olav Berget
Rådgiver: Asplan Viak AS
Oppdragsleder: Frank Jacobsen

Innhold

E	Frister og dagmulkter	3
E.1	Frister	3
	E.1.1 Fysiske Arbeider	3
	E.1.2 Dokumentleveranser	3
E.2	Dagmulkter	4
E.3	Fremdriftsplanlegging	4



Dokument	Notodden kommune / Konkurransgrunnlaget del II	Dokumentkategori	Kontraktsgrunnlaget E Frister og Dagmulkt
Opprettet	11.09.2020	Siste revisjon	10.05.2021
		Dokument ansvarlig	Olav Berget

E Frister og dagmulkt

E.1 Frister

Entreprenørene skal forplikte seg til å utføre sine kontraktsforpliktelser innenfor sine rammer i etter godkjent fremdriftsplan. Entreprenørene vil bli erstatningspliktig for eventuelle forsinkelser i sine kontraktsforpliktelser som medfører krav om ventetid eller andre kostnader for byggherren.

E.1.1 Fysiske Arbeider

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

Frist (nr.)	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	Oppstart	Avtales, se konkurransegrunnlag del 1	
2.	Ferdigstillelse: Ferdig bærelag uten asfalt.	15 desember 2021	Ja
3.	Ferdigstillelse: Asfalt, jord, skilting og oppmerking.	01 Juni 2022	Ja

E.1.2 Dokumentleveranser

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

Frist (nr.)	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	Kvalitetsplan	14. dager etter kontrakt	
2.	Detaljert fremdriftsplan	14. dager etter kontrakt	
3.	14. dagers rapporter	Framlegges på byggemøter	
4.	Som bygget dokumentasjon	Ved overtakelse	Ja
5.	FDVU-dokumentasjon, sluttdokumentasjon	Ved overtakelse	Ja



Dokument	Notodden kommune / Konkurransgrunnlaget del II	Dokumentkategori	Kontraktgrunnlaget E Frister og Dagmulker
Opprettet	11.09.2020	Siste revisjon	10.05.2021
		Dokument ansvarlig	Olav Berget

E.2 Dagmulker

Det vises til NS 8406, pkt. 26

Frist for ferdigstillelse er dagmulktbelagt

Størrelsen på dagmulkt er i henhold til NS 8406 pkt 26.3

E.3 Fremdriftsplanlegging

Entreprenøren skal utarbeide framdriftsplan for utførelsesperioden. Denne skal godkjennes av byggherre før oppstart. Omforent fremdriftsplan vil bli kontraktmessig bindende. Endringer av fremdriftsplanen kan i utgangspunktet ikke påregnes. Tilbyder erklærer videre å delta lojalt og samarbeidsvillig med byggherren og de øvrige kontraherte leverandører med løpende samordning og koordinering av framdrift på byggeplass.

Avvik fra vedlagt fremdriftsplan skal begrunnes. Kapasitet/bemanning er ikke akseptert årsak til eventuelle avvik fra fremdriftsplanen.
