ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
1		Anskaffelse prosjetkeringsgruppe	31 dager	ma 15.10.18	ma 26.11.18	
2		Skisse- og forprosjekt	183 dager	ma 03.12.18	on 14.08.19	
3		Konkurransegrunnlag	59 dager	ma 17.06.19	to 05.09.19	
4		Anbudskonkurranse	45 dager	ma 23.09.19	fr 22.11.19	3
5		Evaluering	15 dager	ma 25.11.19	fr 13.12.19	4
6		Karensperiode	10 dager	ma 16.12.19	fr 27.12.19	5
7		Kontraktsinngåelse	0 dager	fr 03.01.20	fr 03.01.20	
8		Detaljprosjektering	48 dager	fr 03.01.20	ti 10.03.20	7
9		Bygging barnehage inkl. riving	12 mndr	on 11.03.20	ti 09.02.21	8
10		Innflytting	25 dager	on 10.02.21	ti 16.03.21	9

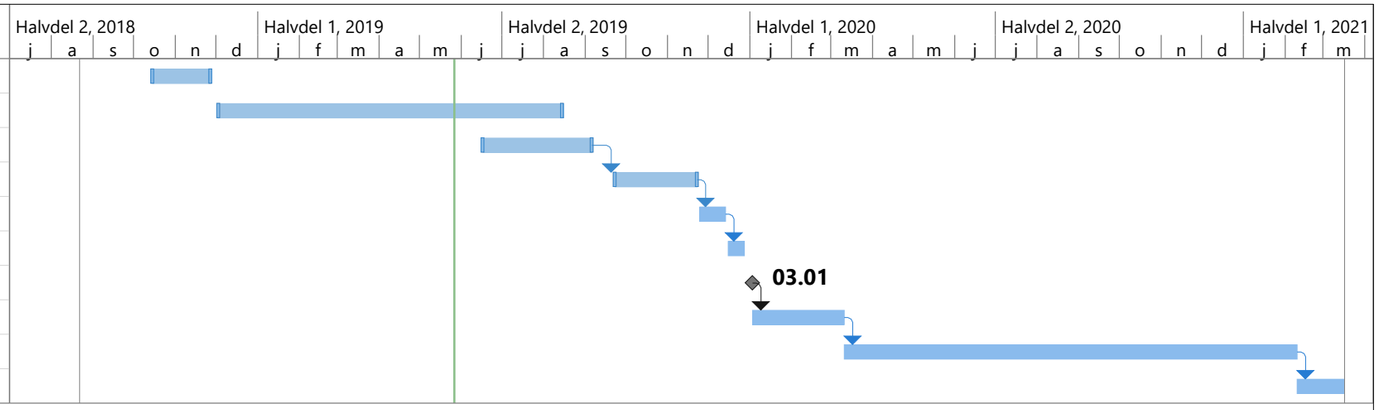

Prosjekt: 5 - Hovedfremdriftspla
Dato: ma 27.05.19

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	
