ASH - Hovedfremdriftsplan

ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
1	**Prosjekteringsplan**	**ti 02.06.20**	**to 16.02.23**
2072	**Produksjonsplan**	**ma 14.12.20**	**on 11.09.24**
2073	**Pakke 1 - Forberedende arbeider**	**ma 14.12.20**	**ma 12.04.21**
2075	**Pakke 2 + fundament bygg 90**	**ma 01.02.21**	**ti 04.05.21**
2081	**Råbyggsfase**	**ma 03.05.21**	**to 30.03.23**
2082	**Fundamentering_Bygg 50-70**	**ma 03.05.21**	**on 11.08.21**
2086	**Råbygg, fasade og tak_Bygg 90**	**on 05.05.21**	**fr 06.08.21**
2089	Tett bygg 90	fr 03.09.21	fr 03.09.21
2090	**Råbygg, fasade og tak_Bygg 70**	**to 01.07.21**	**on 08.12.21**
2097	Tett bygg 70	on 22.12.21	on 22.12.21
2098	**Råbygg, fasade og tak_Bygg 60**	**to 08.07.21**	**ma 04.04.22**
2109	Tett bygg 60	ti 26.04.22	ti 26.04.22
2110	**Råbygg, fasade og tak_Bygg 50**	**to 12.08.21**	**fr 06.05.22**
2121	Tett bygg 50	ma 23.05.22	ma 23.05.22
2122	**Råbygg, fasade og tak_Bygg 40**	**ma 13.06.22**	**to 16.03.23**
2128	Tett bygg 40	to 30.03.23	to 30.03.23
2129	**Innvendig arbeider**	**ma 06.09.21**	**fr 23.02.24**
2130	**Innvendig arbeider_Bygg 90**	**ma 06.09.21**	**fr 16.09.22**
2133	**Innvendig arbeider_Bygg 70**	**ti 19.10.21**	**fr 14.04.23**
2142	**Innvendig arbeider_Bygg 60**	**ti 26.10.21**	**ma 13.11.23**
2169	**Innvendig arbeider_Bygg 50**	**ma 22.11.21**	**fr 23.02.24**
2193	**Innvendig arbeider_Bygg 40**	**fr 31.03.23**	**to 30.11.23**
2202	**Testfase**	**ma 17.10.22**	**on 11.09.24**
2203	**Testfase_Bygg 90**	**ma 17.10.22**	**ma 17.04.23**
2207	**Testfase_Bygg 70**	**ma 17.04.23**	**to 26.10.23**
2211	**Testfase_Bygg 60**	**ti 14.11.23**	**ti 21.05.24**
2215	**Testfase_Bygg 50**	**to 22.02.24**	**on 11.09.24**
2219	**Testfase_Bygg 40**	**ma 08.01.24**	**fr 05.07.24**
2223	Overlevering	on 11.09.24	on 11.09.24

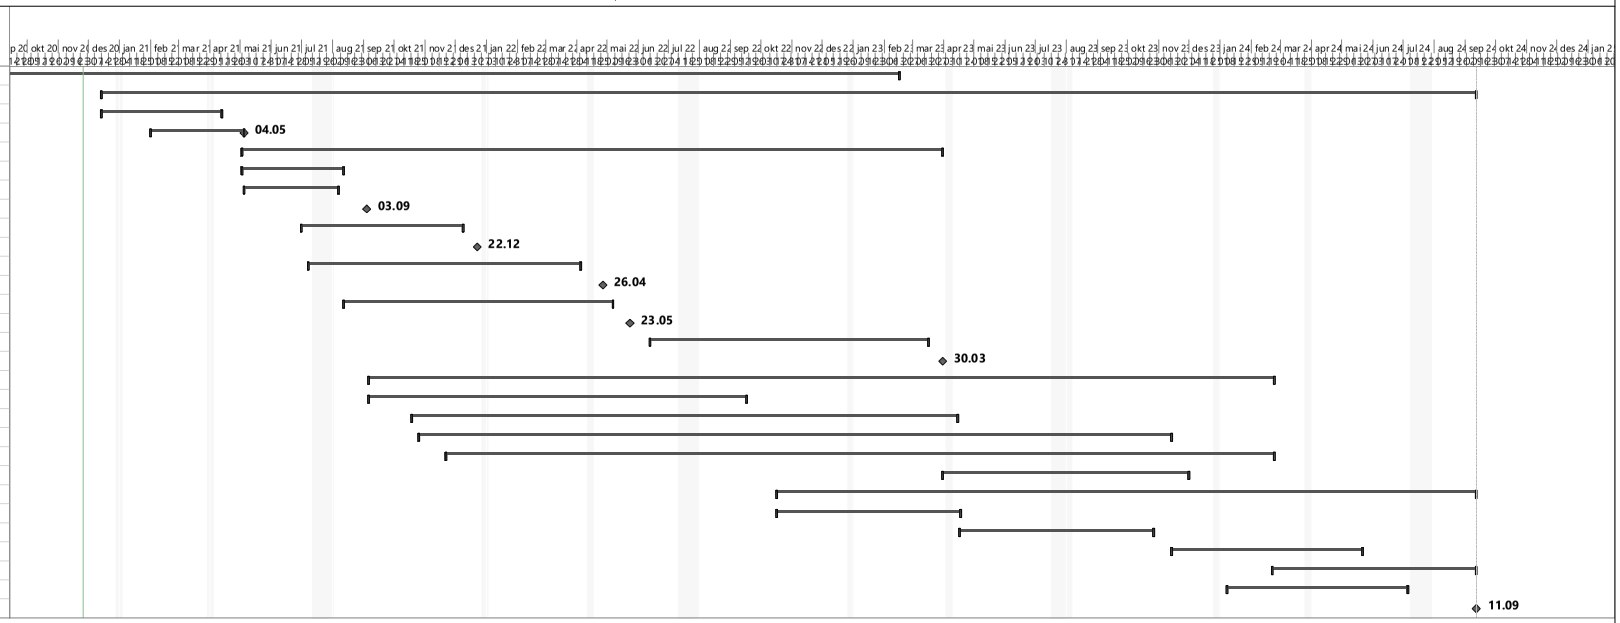

Prosjekt: ASH
Dato: to 26.11.20

Aktivitet | Sammendrag | Inaktiv milepæl | Bare varighet | Bare start | Ekstern milepæl | Manuell fremdrift
Deling | Prosjektsammendrag | Inaktivt sammendrag | Manuell sammendragsfremheving | Bare slutt | Tidsfrist
Milepæl | Inaktiv aktivitet | Manuell aktivitet | Manuelt sammendrag | Eksterne aktiviteter | Fremdrift

SYKEHUSBYGG
