ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1					
2					
3		**Ny Brannstasjon**			
4					
5		**Halden**			
6					
7		**Orienterende Fremdriftsplan**			
8		26.05.21			
9					
10		**Politisk behandling**	**403 dager**	**ti 10.12.19**	**to 24.06.21**
11		Aksept i Komm.sryre om kjøp tomt	1 dag	ti 10.12.19	ti 10.12.19
12		Godkj. Reg.plan	1 dag	to 06.05.21	to 06.05.21
13		Vedtak investering	1 dag	to 24.06.21	to 24.06.21
14		**Regulering**	**481 dager**	**to 24.10.19**	**to 26.08.21**
15		Opphandle konsulent	12 dager	to 24.10.19	fr 08.11.19
16		Utarbeidelse	375 dager	ma 11.11.19	fr 16.04.21
17		1.gangs behandl. Hovedutvalg	1 dag	on 09.06.21	on 09.06.21
18		Høringsperiode	46 dager	on 09.06.21	on 11.08.21
19		Høringsfrist	1 dag	on 11.08.21	on 11.08.21
20		Saksfremlegg ferdig	1 dag	fr 20.08.21	fr 20.08.21
21		2.gangs behandl. Hovedutvalg	1 dag	on 25.08.21	on 25.08.21
22		2.gangs behandl. Kommunestyret	1 dag	to 26.08.21	to 26.08.21
23		**Akitekt**	**1 dag**	**on 21.10.20**	**on 21.10.20**
24		Avtale Aart	1 dag	on 21.10.20	on 21.10.20
25		**Arkeologi**	**403 dager**	**on 06.05.20**	**fr 19.11.21**
26		Spadestikk	1 dag	on 06.05.20	on 06.05.20
27		Utvidet undersøkelse	2 dager	to 04.06.20	fr 05.06.20
28		Arkeologisk utgraving	55 dager	ma 06.09.21	fr 19.11.21
29		**Prosjekteringsteam**	**60 dager**	**ma 26.10.20**	**fr 15.01.21**
30		Til.konkurranse	30 dager	ma 26.10.20	fr 04.12.20
31		Tildeling	1 dag	fr 15.01.21	fr 15.01.21
32		**Forprosjekt**	**90 dager**	**ma 07.12.20**	**fr 09.04.21**
33		Prosjektering	61 dager	fr 15.01.21	fr 09.04.21
34		**Bygging**	**397 dager**	**ma 14.06.21**	**ti 20.12.22**
35		Tilb.kunkurranse	60 dager	ma 14.06.21	fr 03.09.21
36		Tilbudsbefaring	1 dag	ma 28.06.21	ma 28.06.21
37		Evaluering og tildeling	15 dager	ma 06.09.21	fr 24.09.21
38		Karensperiode	10 dager	ma 27.09.21	fr 08.10.21
39		Kontrakt tot.entreprenør	1 dag	ma 11.10.21	ma 11.10.21
40		Mobilisering	30 dager	ti 12.10.21	ma 22.11.21
41		Byggeperiode	272 dager	ma 22.11.21	ti 06.12.22
42		FDV	1 dag	ti 13.12.22	ti 13.12.22
43		Overtakelse	1 dag	ti 20.12.22	ti 20.12.22

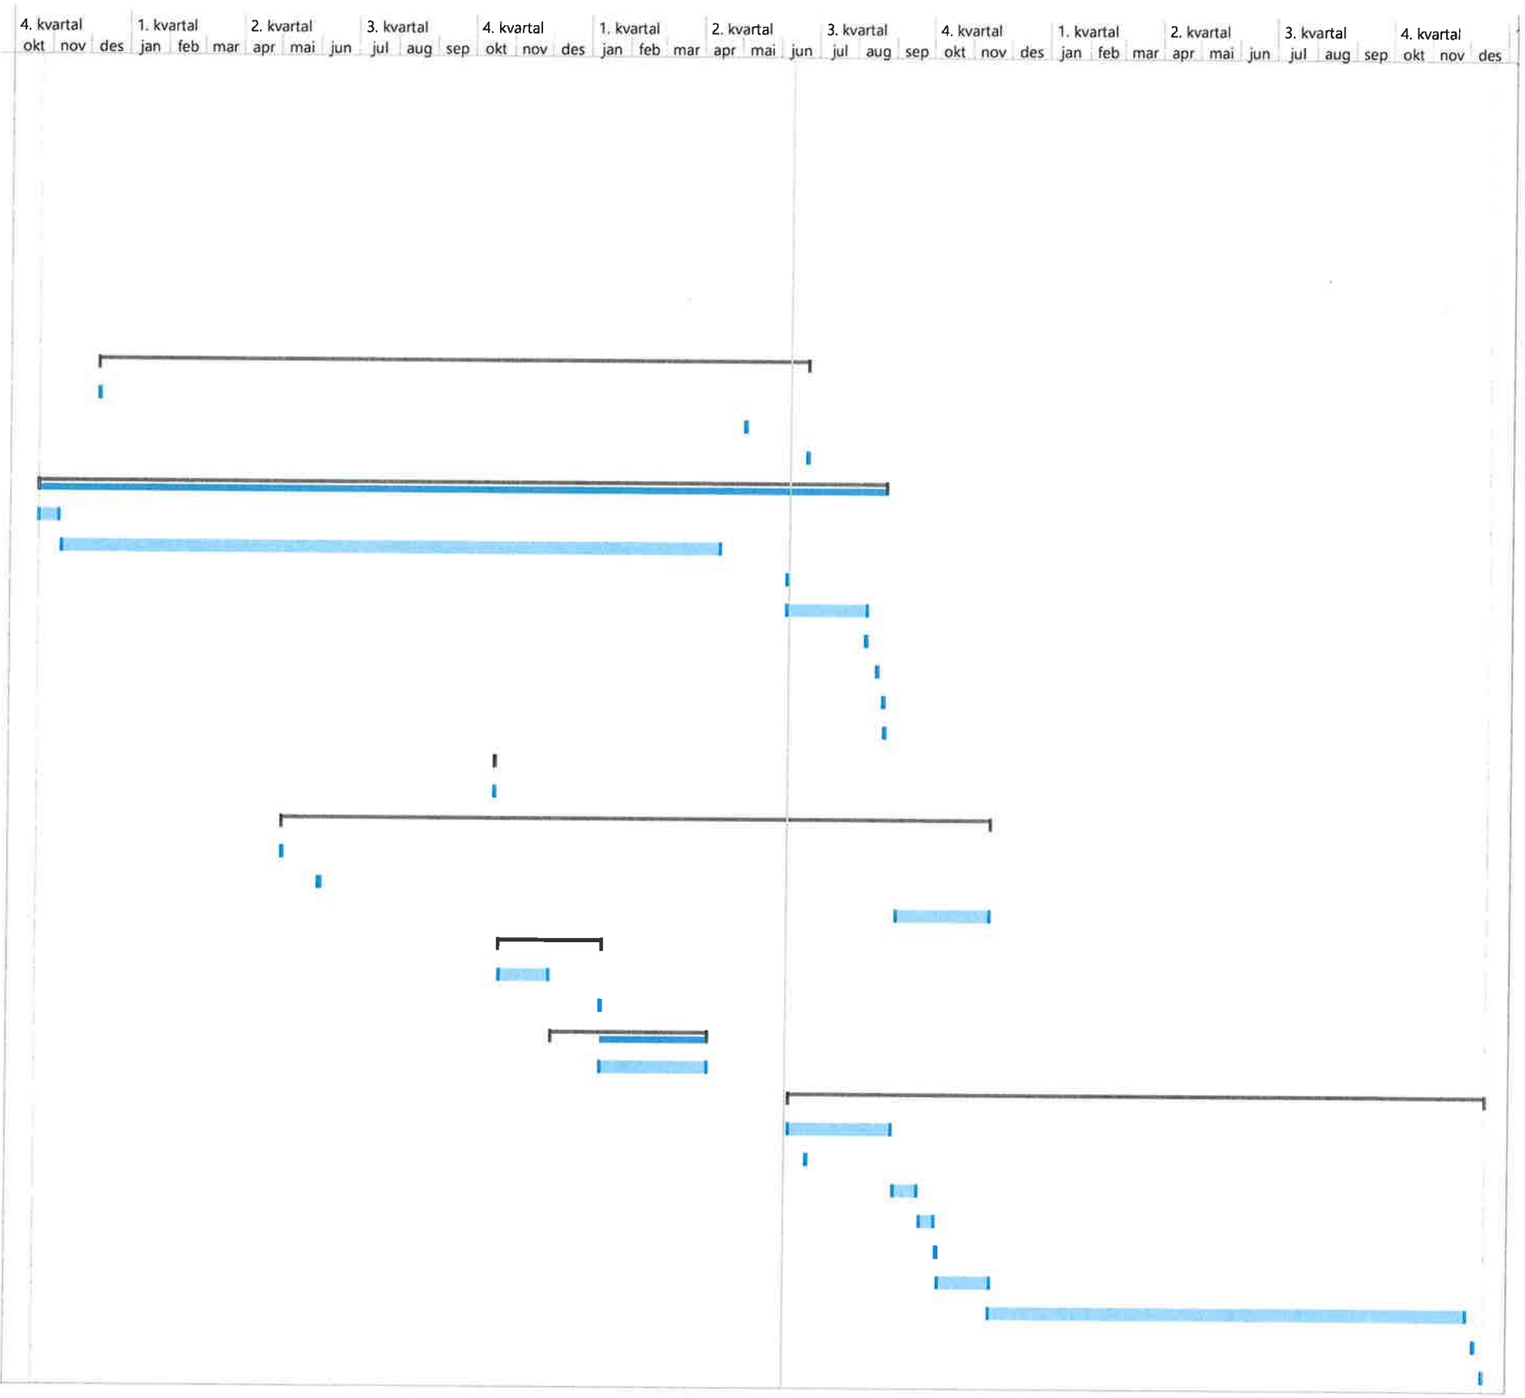

Prosjekt: Fremdrift prosess
Dato: fr 11.06.21

Aktivitet	Prosjektsammendrag	Manuell aktivitet	Bare start	Tidsfrist
Deling	Inaktiv aktivitet	Bare varighet	Bare slutt	Fremdrift
Milepæl	Inaktiv milepæl	Manuell sammendragsfremheving	Eksterne aktiviteter	Manuell fremdrift
Sammendrag	Inaktivt sammendrag	Manuelt sammendrag	Ekstern milepæl	
