Fremdriftsplan - Ingeberg

ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1		**Utbyggingsavtaler**	**86 dager**	**ma 27.06.22**	**ti 15.11.22**
2		Utbyggingsavtaler private parter - signert av alle grunneiere	0 dager	ma 27.06.22	ma 27.06.22
3		Behandling utbyggingsavtaler FSK	1 dag	on 17.08.22	to 18.08.22
4		Behandling i KS	1 dag	on 31.08.22	to 01.09.22
5		Høring utbyggingsavtaler	30 dager	to 01.09.22	to 13.10.22
6		Merknadsbehandling	8 dager	to 13.10.22	ti 25.10.22
7		Godkjenning Utbyggingsavtaler KS	0 dager	on 26.10.22	on 26.10.22
8		Tinglysning av pant	14 dager	on 26.10.22	ti 15.11.22
9		Frist for garantistillelse fra utbyggere	0 dager	ti 15.11.22	ti 15.11.22
10		**Konkurransegrunnlag**	**41,13 dage**	**fr 03.06.22**	**ma 22.08.22**
11		Oppdatering konkurransegrunnlag - Totalentreprise	20 dager	fr 03.06.22	to 30.06.22
12		Høring konkurransegrunnlag IFK	20 dager	fr 01.07.22	to 18.08.22
13		Høring konkurransegrunnlag utbyggere	6 dager	fr 12.08.22	ma 22.08.22
14		**Gjennomføringsavtale IFK**	**50 dager**	**on 01.06.22**	**on 31.08.22**
15		Bearbeidelse gjennomføringsavtale	50 dager	on 01.06.22	on 31.08.22
16		Signering gjennomføringsavtale	0 dager	on 31.08.22	on 31.08.22
17		**Rammesøknad**	**66 dager**	**to 01.09.22**	**fr 02.12.22**
18		Søknad om rammetillatelse	6 dager	to 01.09.22	fr 09.09.22
19		Behandling rammesøknad	60 dager	fr 09.09.22	fr 02.12.22
20		**Anskaffelse Totalentreprenør**	**88 dager**	**ma 15.08.22**	**to 15.12.22**
21		Klargjøring og utlysning	10 dager	ma 15.08.22	ma 29.08.22
22		Tilbudsregning	43 dager	ma 29.08.22	to 27.10.22
23		Tilbudsbefaring	0 dager	to 22.09.22	to 22.09.22
24		Tilbudsfrist	0 dager	to 27.10.22	to 27.10.22
25		Evaluering og tildeling	25 dager	to 27.10.22	to 01.12.22
26		Karentsperiode	10 dager	to 01.12.22	to 15.12.22
27		**Detaljprosjektering TE**	**325 dager**	**fr 16.12.22**	**fr 15.03.24**
28		Detaljprosjektering og godkjenninger	325 dager	fr 16.12.22	fr 15.03.24
29		**Utførelse**	**407 dager**	**fr 20.01.23**	**ti 13.08.24**
30		Fase 1	180 dager	fr 20.01.23	fr 29.09.23
31		Fase 2	205 dager	ti 01.08.23	ti 14.05.24
32		Fase 3	100 dager	ti 26.03.24	ti 13.08.24

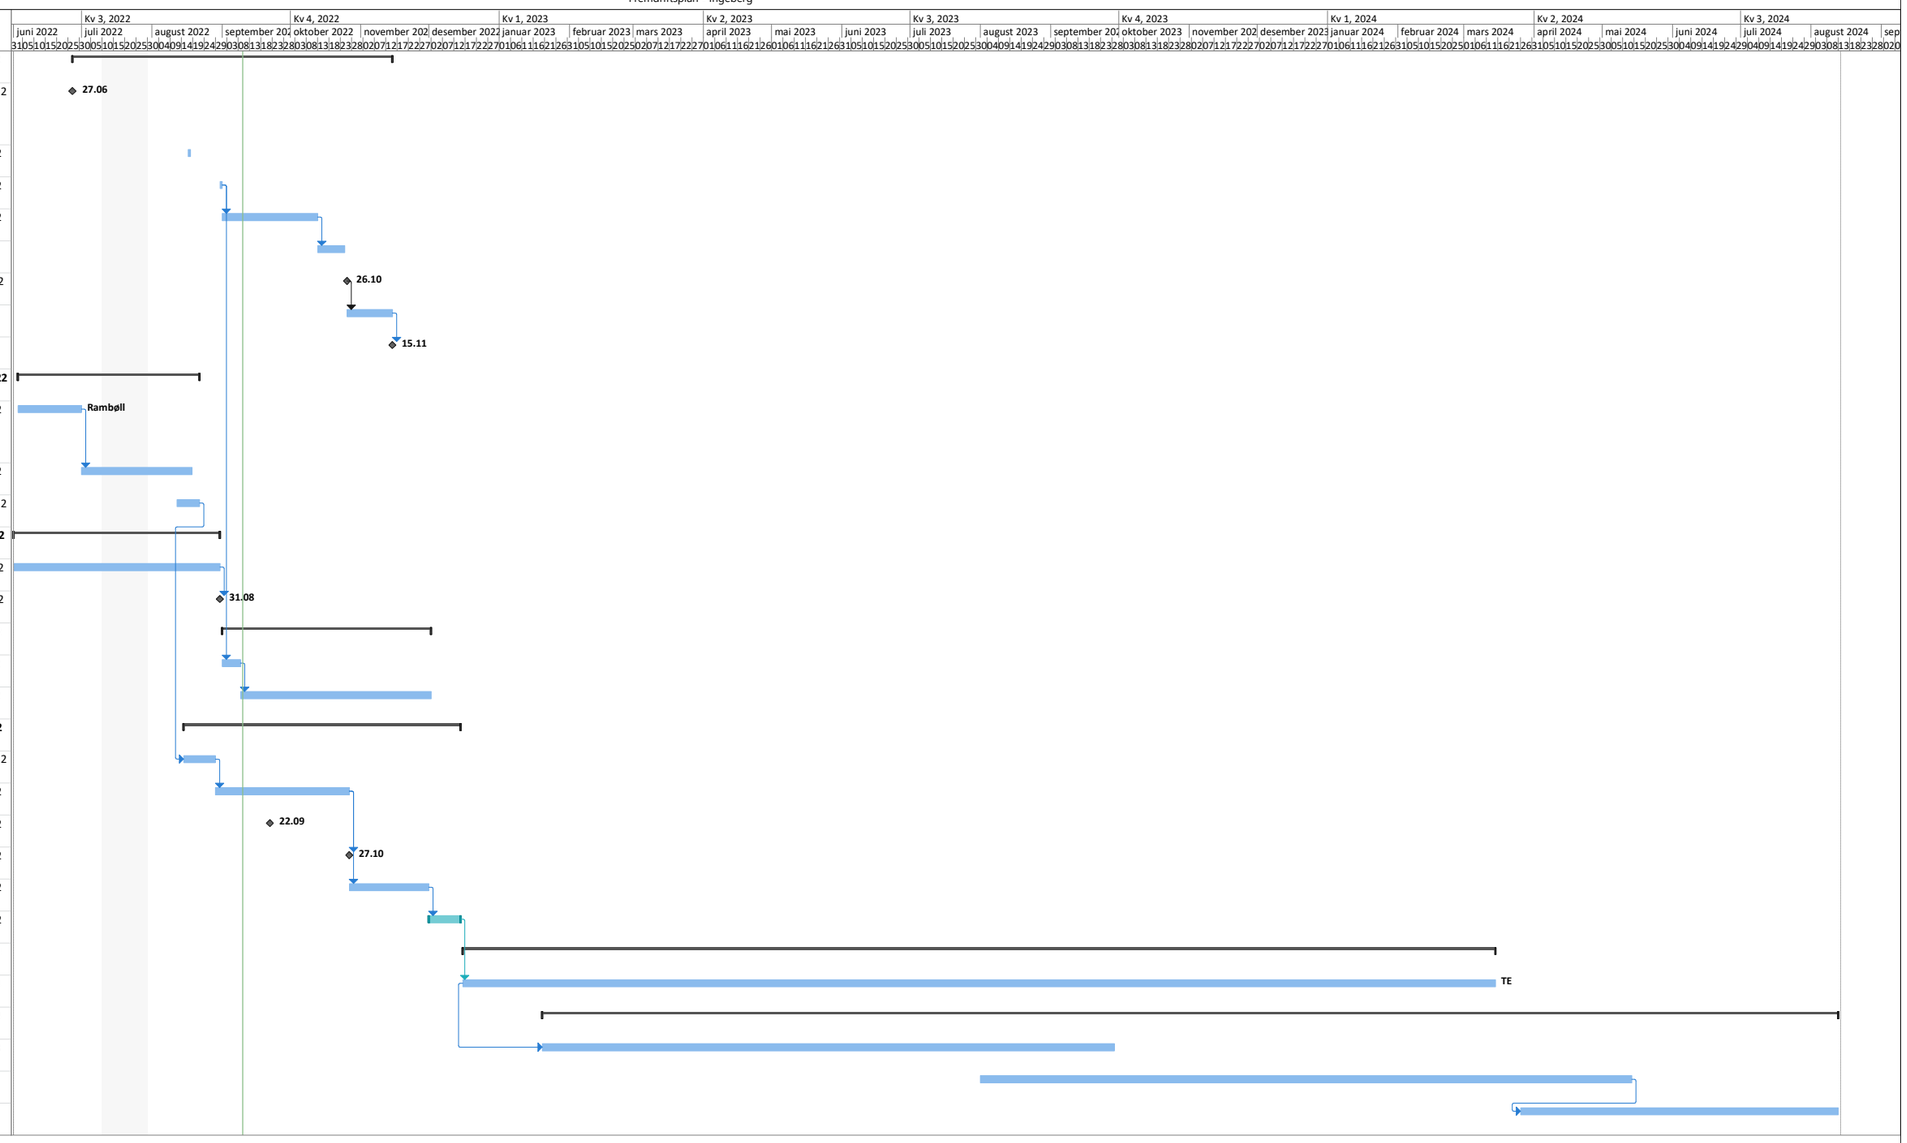

Prosjekt: msproj11
Dato: lø 10.09.22

Aktivitet		Sammendrag		Ekstern milepæl		Inaktivt sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Bare slutt		Manuell fremdrift			
Deling		Prosjektsammendrag		Inaktiv aktivitet		Manuell aktivitet		Manuelt sammendrag		Tidsfrist					
Milepæl		Eksterne aktiviteter		Inaktiv milepæl		Bare varighet		Bare start		Fremdrift					
