ID		Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1			**Bergen Inkluderingssenter - Paviljong**	**301 dager**	**fr 06.10.23**	**fr 29.11.24**
2	✓		**Avklare bestilling**	**6 dager**	**fr 06.10.23**	**fr 13.10.23**
6	✓		**Etablere prosjekt**	**6 dager**	**ma 16.10.23**	**ma 23.10.23**
11			**Skisse/forprosjekt**	**91 dager**	**on 15.11.23**	**on 20.03.24**
12			Intern arbeidsgruppe	4 dager	on 15.11.23	ma 20.11.23
13	✓		Avrop rådgivere SØK/ARK/RIBr/RIV/BHO/UK/SHA-KP	5 dager	ti 21.11.23	ma 27.11.23
14			Prosjektering Konkurransegrunnlage	82 dager	ti 28.11.23	on 20.03.24
15			**Anskaffelse**	**48 dager**	**to 21.03.24**	**ma 27.05.24**
16			Utlysning	1 dag	to 21.03.24	to 21.03.24
17			Konkurranse (35 Kalenderdager)	32 dager	fr 22.03.24	ma 06.05.24
18			Tilbudsbefaring	0 dager	to 04.04.24	to 04.04.24
19			Evaluering	5 dager	ti 07.05.24	ma 13.05.24
20			Tildeling	0 dager	ma 13.05.24	ma 13.05.24
21			Karensfrist	10 dager	ti 14.05.24	ma 27.05.24
22			Kontrahering	0 dager	ma 27.05.24	ma 27.05.24
23			BP5 og BP6	0 dager	ma 27.05.24	ma 27.05.24
24			**Offentlig myndighet**	**138 dager**	**on 01.11.23**	**fr 10.05.24**
25	✓		Bestille forhåndskonferanse	5 dager	on 01.11.23	ti 07.11.23
26	✓		Forhåndskonferanse	0 dager	ti 07.11.23	ti 07.11.23
27			Sende inn vedtak (1 uke)	0 dager	ma 06.05.24	ma 06.05.24
28			Vedtak	0 dager	fr 10.05.24	fr 10.05.24
29			**Produksjon og leveranser**	**134 dager**	**ti 28.05.24**	**fr 29.11.24**
30			Totalentreprise (Flytting Ombygging	114 dager	ti 28.05.24	fr 01.11.24
31			Mekanisk Ferdigstillelse	0 dager	fr 01.11.24	fr 01.11.24
32			Sluttfase	10 dager	ma 04.11.24	fr 15.11.24
33			Fullskalatest	0 dager	to 14.11.24	to 14.11.24
34			Overtakelsesforretning	0 dager	ma 18.11.24	ma 18.11.24
35			Overlevering til EBE	0 dager	on 20.11.24	on 20.11.24
36			Byggherreleveranser	7 dager	to 21.11.24	fr 29.11.24
37			Overlevering til bruker	0 dager	fr 29.11.24	fr 29.11.24

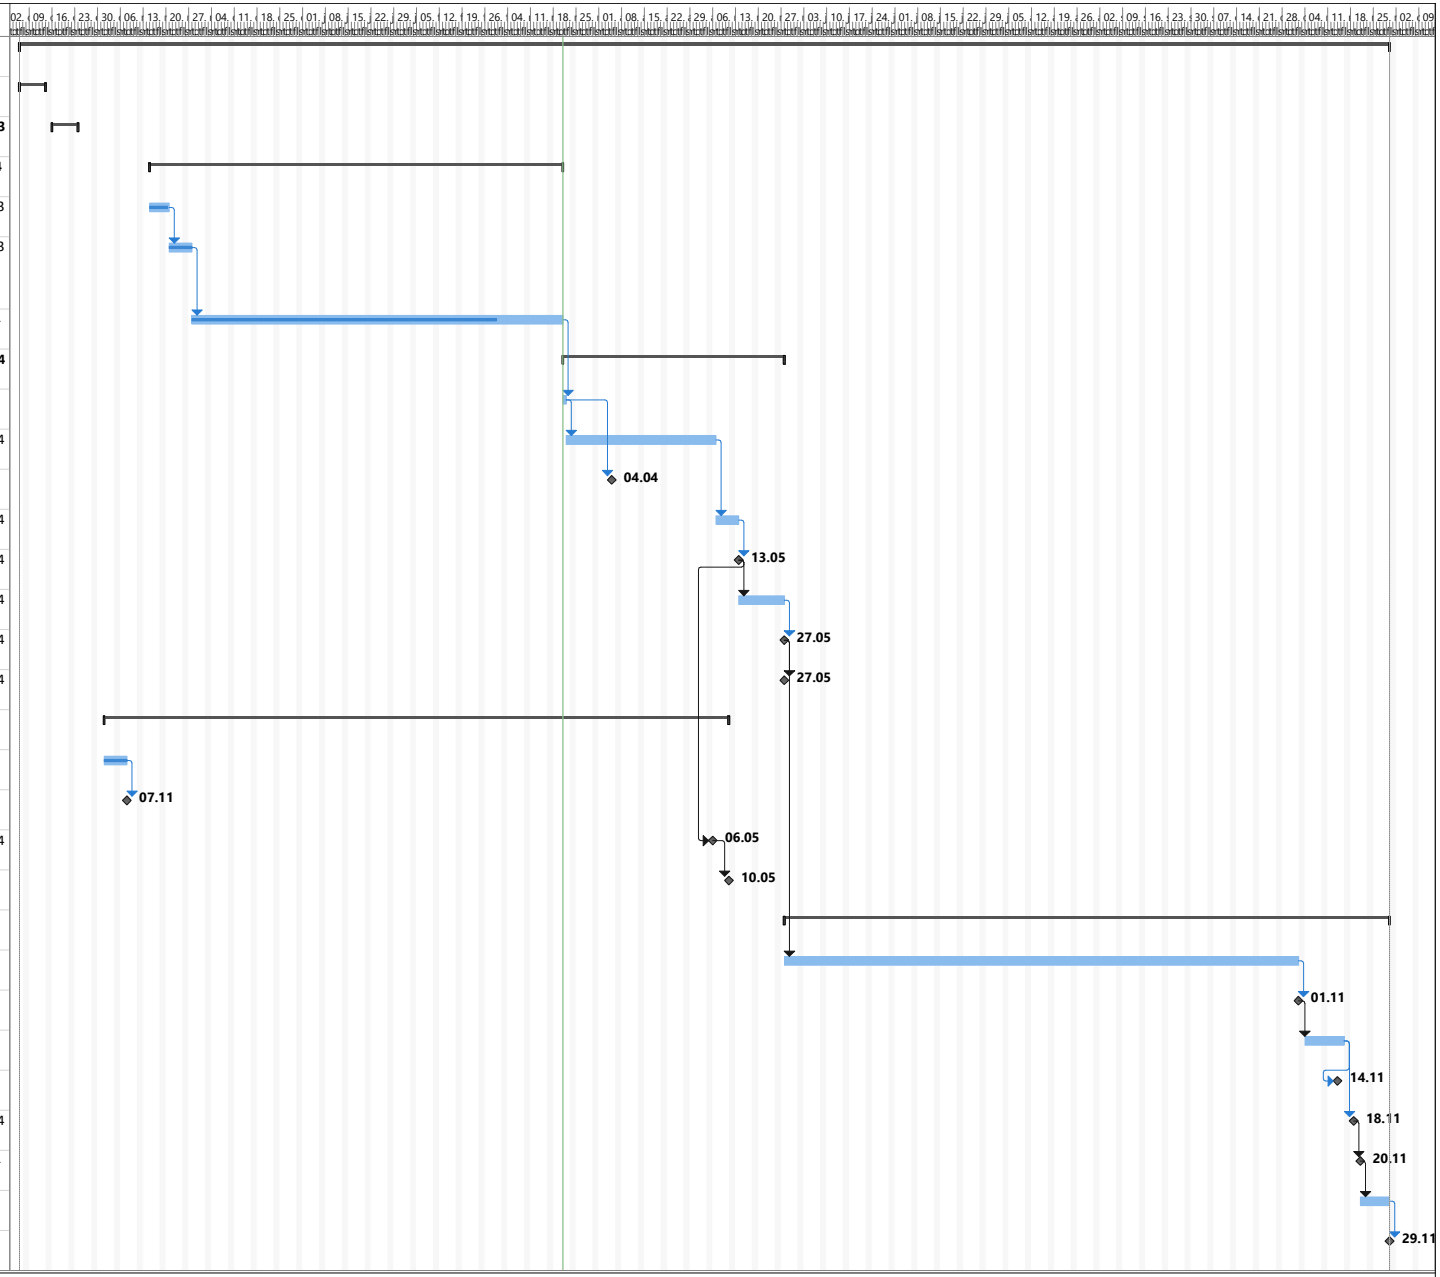

Prosjekt: A0650
Dato: to 21.03.24

Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist	
Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	
Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl			
