ID	Aktivitetsnavn
1	**Foreløpig fremdriftsplan**
2	
3	**Superparken byggetrinn 1**
4	**Rigg og drift/permanent byggegjerde**
5	Montering
6	Demontering
7	**Rivearb. inkl. midlert.byggegjerde**
8	Riveperiode Soppen (bygg B)
9	Soppen ferdig sannert
10	Riveperiode treet
11	**Energibrønner**
12	Brønnboring
13	Ferdigstillelse innenfor ringmur
14	**Grunn og fundamentarbeider, VA**
15	Byggeperiode
16	**Betongarbeider ringmur /plate**
17	Byggeperiode
18	**Stålarbeider**
19	Byggeperiode
20	**Betongarbeider vegger /trapper**
21	Byggeperiode
22	**Betongelementer**
23	Byggeperiode
24	**Murerarbeider**
25	Byggeperiode
26	**Tømrerarbeider**
27	Byggeperiode
28	**Snekkerarbeider**
29	Byggeperiode
30	**Sprinklerarbeider**
31	Byggeperiode 1
32	Byggeperiode 2
33	**Rørleggerarbeider grunn**
34	Byggeperiode
35	**Ventilasjonsarbeider**
36	Byggeperiode 1

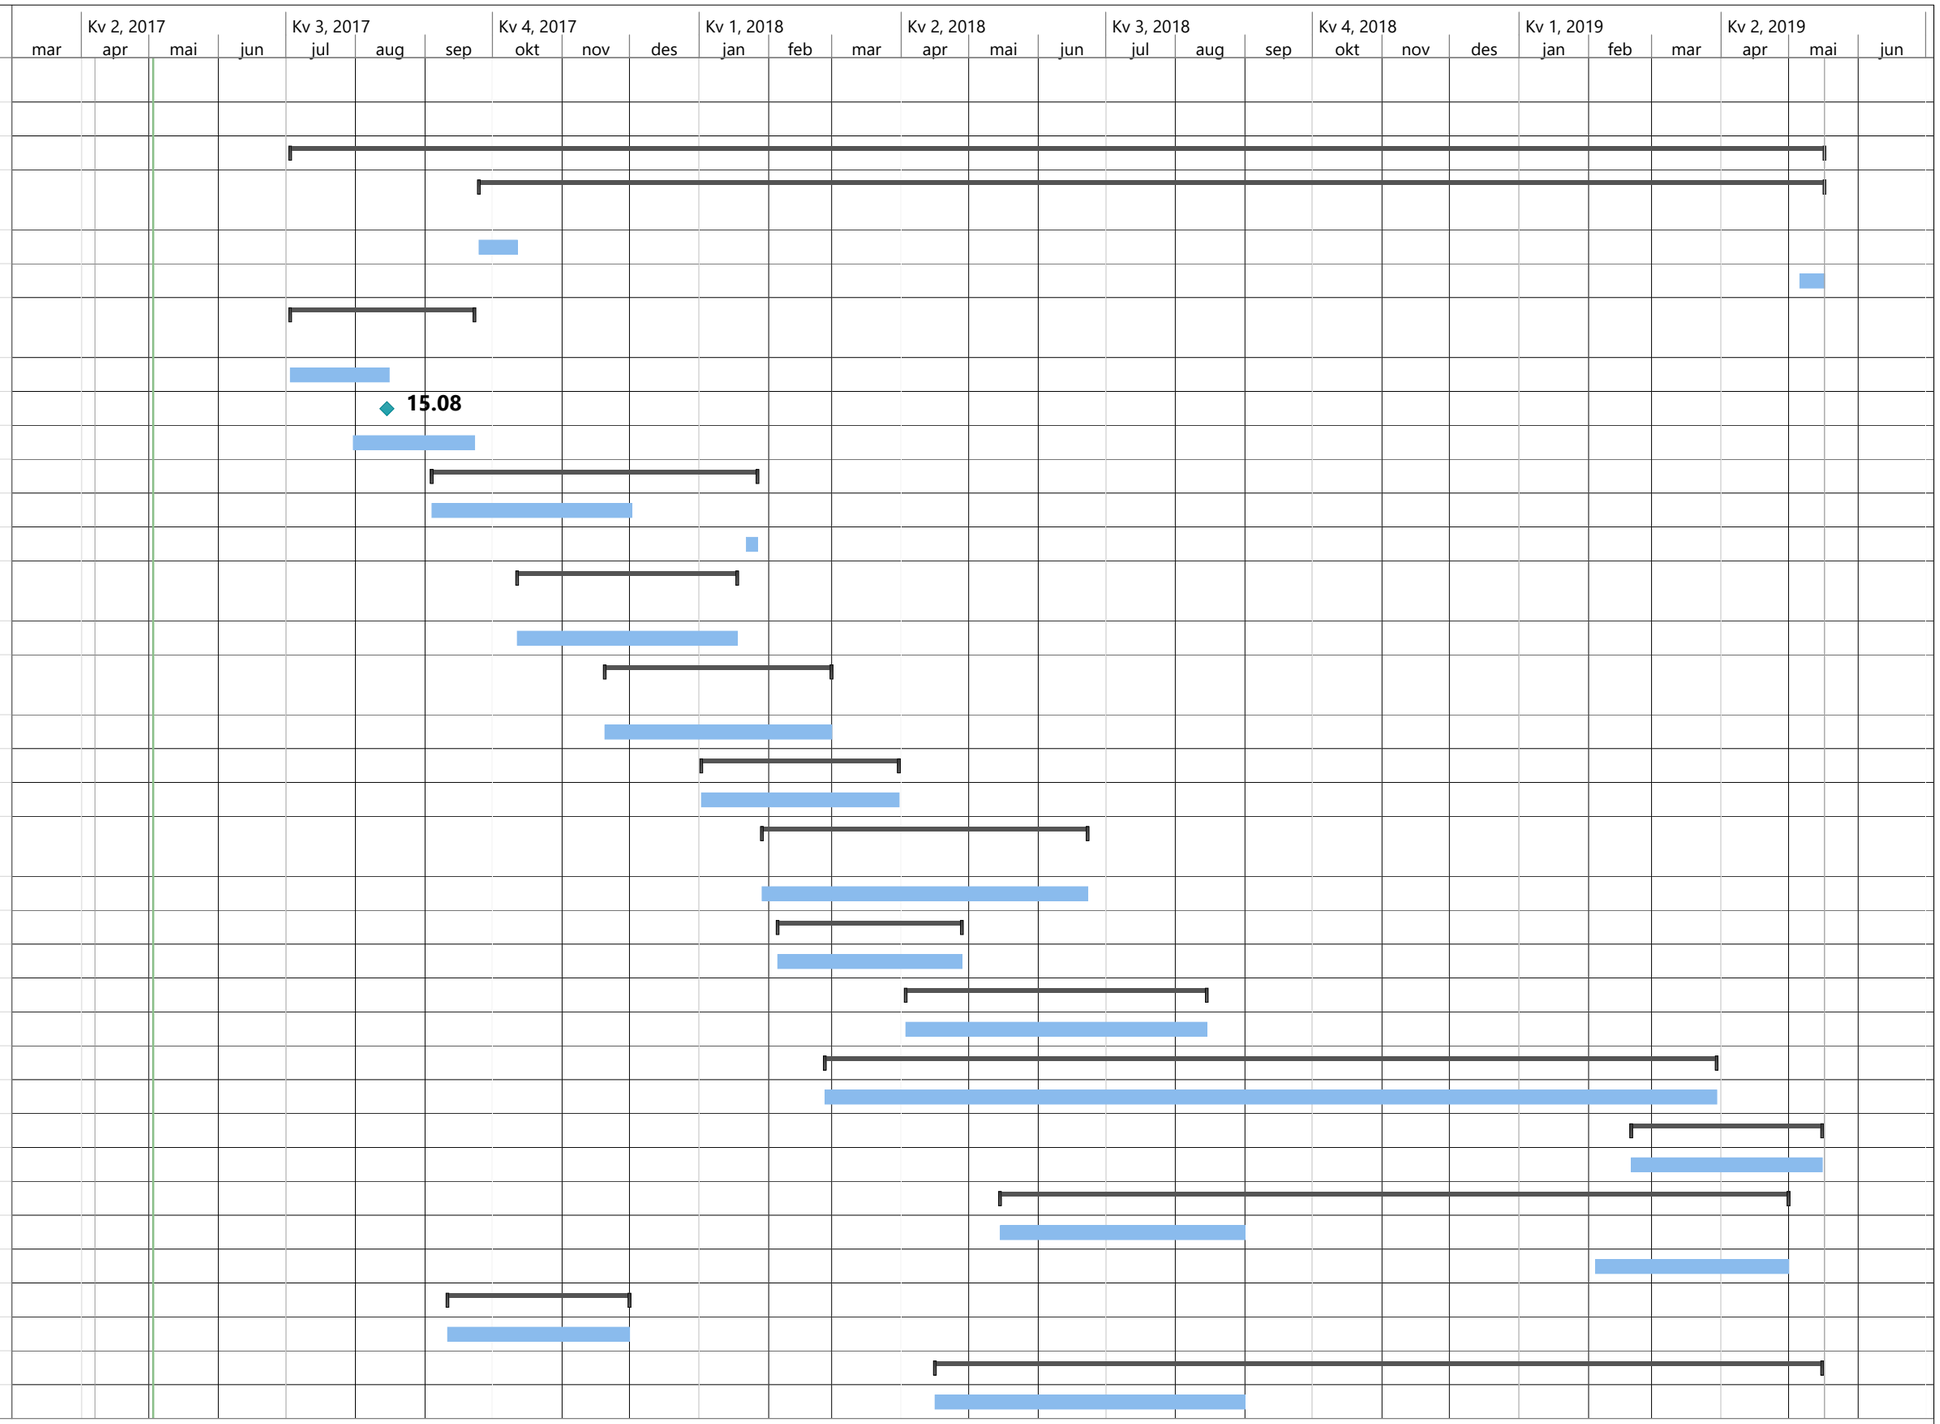

Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: on 03.05.17

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	

ID	Aktivitetsnavn
37	Byggeperiode 2
38	**Taktekkerarbeider**
39	Byggeperiode
40	Tett bygg
41	**Rørleggerarbeider innv.**
42	Byggeperiode 1
43	Byggeperiode 2
44	**Maler og gulvleggerarbeider**
45	Klar for maler
46	Byggeperiode
47	**Lås og automatikk**
48	Byggeperiode
49	**Elektrikerarbeider**
50	Byggeperiode
51	**SD-anlegg**
52	Byggeperiode 1
53	Byggeperiode 2
54	**Blikkenslagerarbeider**
55	Byggeperiode
56	**Heis**
57	Byggeperiode
58	**Branntetting**
59	Byggeperiode
60	**Fast innredning**
61	Byggeperiode
62	**Utomhusarbeider**
63	Byggeperiode 1
64	Byggeperiode 2
65	Byggeperiode 3
66	**Overlevering**

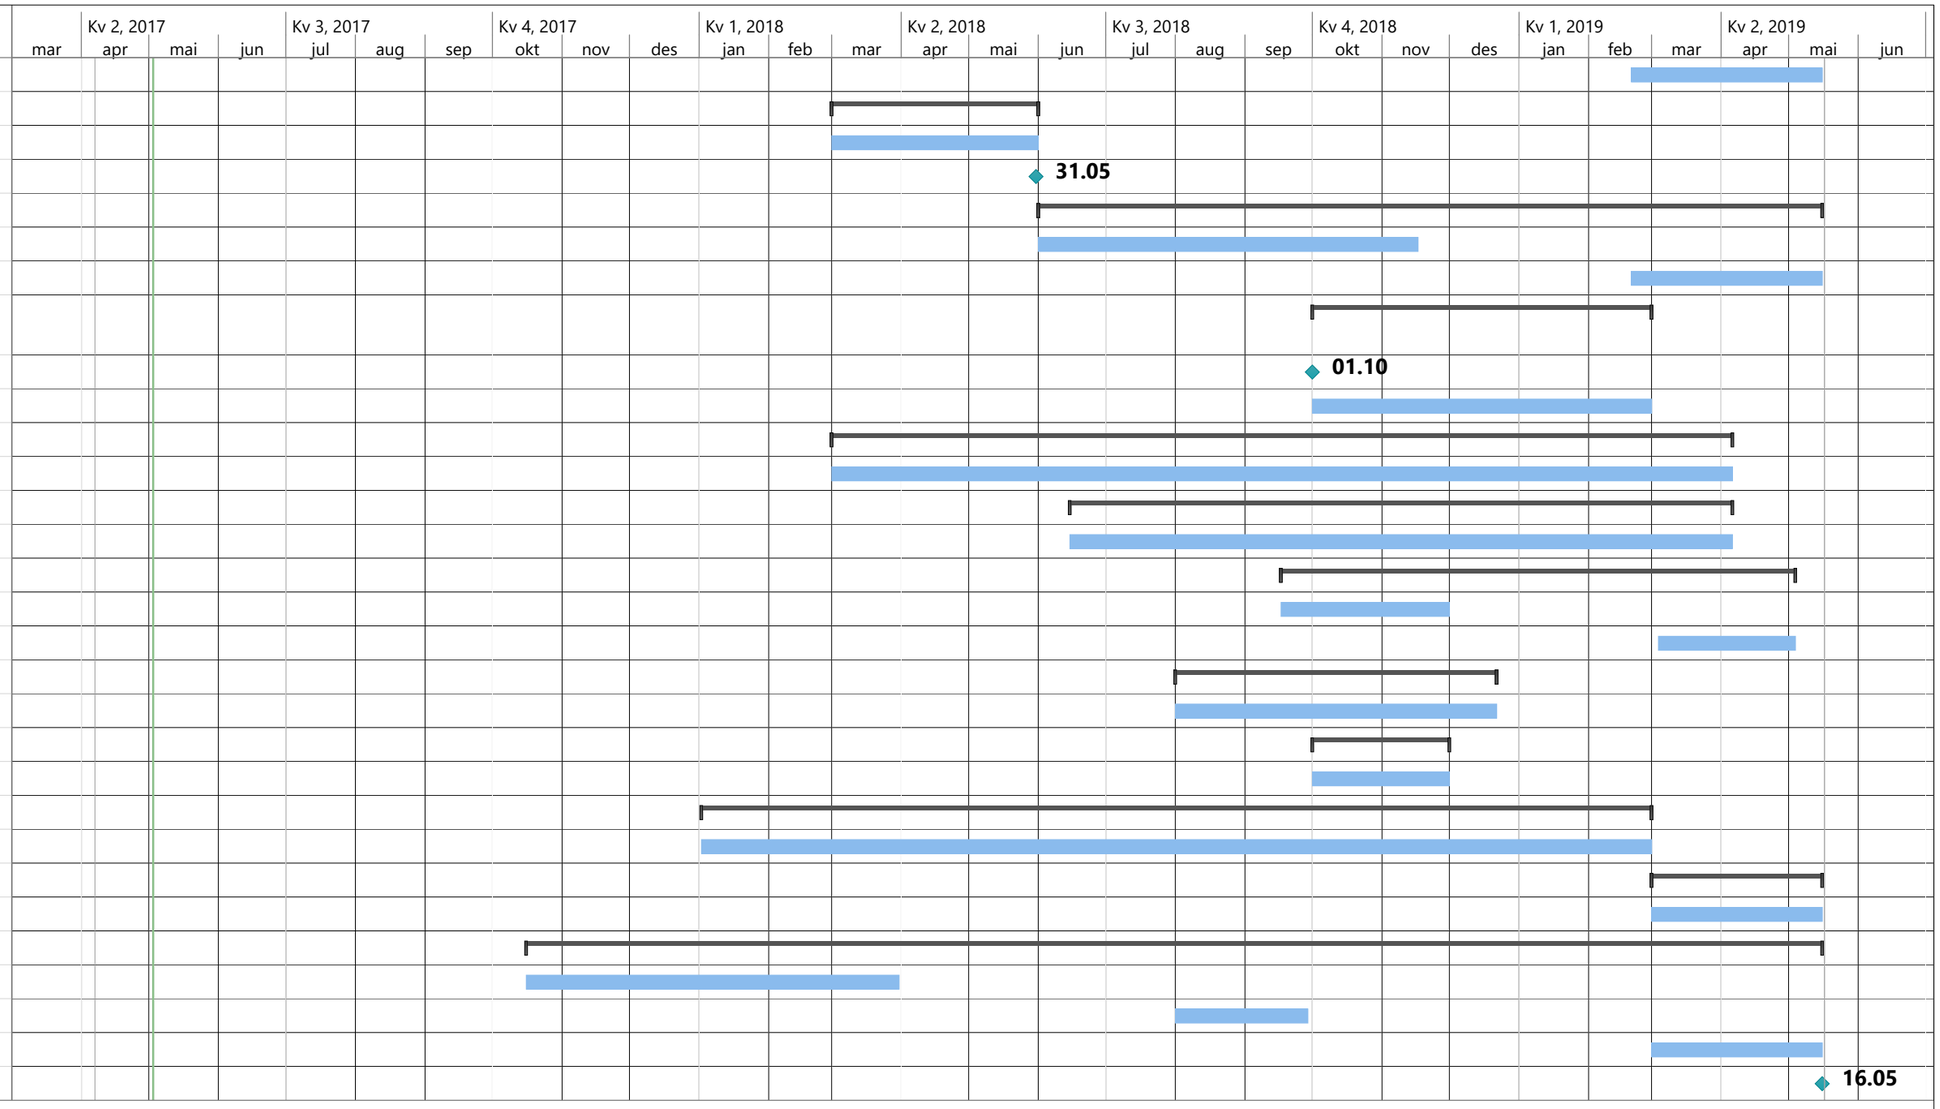

Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: on 03.05.17

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	
