ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
1		**Foreløpig fremdriftsplan**		
2				
3		**Superparken byggetrinn 1**	**ma 03.07.17**	**to 16.05.19**
4		**Rigg og drift/permanent byggegjerde**	**ma 25.09.17**	**to 16.05.19**
5		Montering	ma 25.09.17	on 11.10.17
6		Demontering	ma 06.05.19	to 16.05.19
7		**Rivearb. inkl. midlert.byggegjerde**	**ma 03.07.17**	**fr 22.09.17**
8		Riveperiode Soppen (bygg B)	ma 03.07.17	ti 15.08.17
9		Soppen ferdig sannert	ti 15.08.17	ti 15.08.17
10		Riveperiode treet	ma 31.07.17	fr 22.09.17
11		**Energibrønner**	**ma 04.09.17**	**fr 26.01.18**
12		Brønnboring	ma 04.09.17	fr 01.12.17
13		Ferdigstillelse innenfor ringmur	ma 22.01.18	fr 26.01.18
14		**Grunn og fundamentarbeider, VA**	**ma 25.09.17**	**fr 16.03.18**
15		Oppstart graving / rensking	ma 25.09.17	fr 13.10.17
16		Utgraving byggegrop	ma 16.10.17	fr 10.11.17
17		Inntilfylling	ma 20.11.17	fr 22.12.17
18		Øvrige gravearbeider	fr 22.12.17	fr 16.03.18
19		**Betongarbeider ringmur /plate**	**ma 20.11.17**	**on 28.02.18**
20		Byggeperiode	ma 20.11.17	on 28.02.18
21		**Stålarbeider**	**ti 02.01.18**	**fr 30.03.18**
22		Byggeperiode	ti 02.01.18	fr 30.03.18
23		**Betongarbeider vegger /trapper**	**ma 29.01.18**	**fr 22.06.18**
24		Byggeperiode	ma 29.01.18	fr 22.06.18
25		**Betongelementer**	**ma 05.02.18**	**fr 27.04.18**
26		Byggeperiode	ma 05.02.18	fr 27.04.18
27		**Murerarbeider**	**ti 03.04.18**	**ti 14.08.18**
28		Byggeperiode	ti 03.04.18	ti 14.08.18
29		**Tømrerarbeider**	**ma 26.02.18**	**fr 29.03.19**
30		Byggeperiode	ma 26.02.18	fr 29.03.19
31		**Snekkerarbeider**	**on 20.02.19**	**on 15.05.19**
32		Byggeperiode	on 20.02.19	on 15.05.19

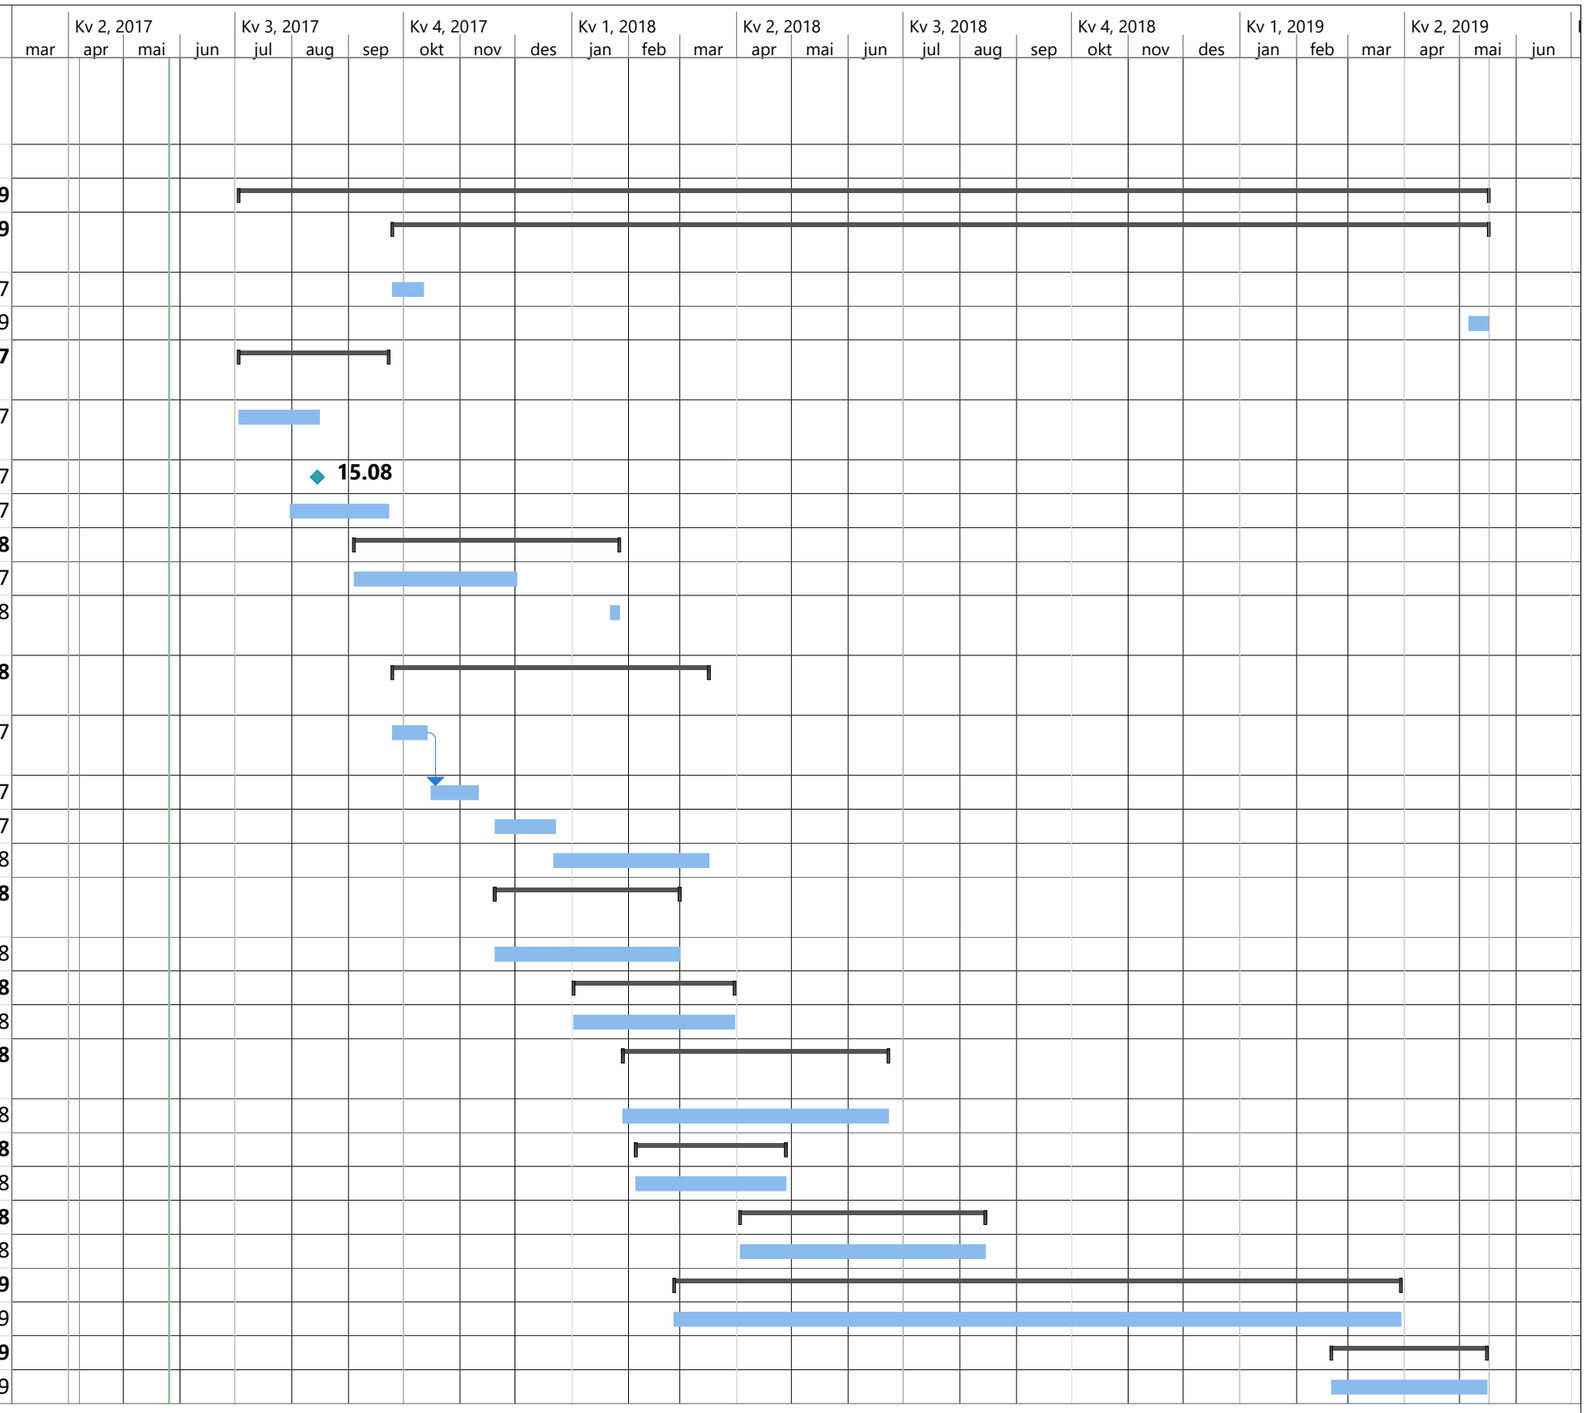

Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: fr 26.05.17

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
33		**Sprinklerarbeider**	**ti 15.05.18**	**ti 30.04.19**
34		Byggeperiode 1	ti 15.05.18	fr 31.08.18
35		Byggeperiode 2	ma 04.02.19	ti 30.04.19
36		**Rørleggerarbeider grunn**	**ma 11.09.17**	**to 30.11.17**
37		Byggeperiode	ma 11.09.17	to 30.11.17
38		**Ventilasjonsarbeider**	**ma 16.04.18**	**on 15.05.19**
39		Byggeperiode 1	ma 16.04.18	fr 31.08.18
40		Byggeperiode 2	on 20.02.19	on 15.05.19
41		**Taktekkerarbeider**	**to 01.03.18**	**to 31.05.18**
42		Byggeperiode	to 01.03.18	to 31.05.18
43		Tett bygg	to 31.05.18	to 31.05.18
44		**Rørleggerarbeider innv.**	**fr 01.06.18**	**on 15.05.19**
45		Byggeperiode 1	fr 01.06.18	fr 16.11.18
46		Byggeperiode 2	on 20.02.19	on 15.05.19
47		**Maler og gulvleggerarbeider**	**ma 01.10.18**	**to 28.02.19**
48		Klar for maler	ma 01.10.18	ma 01.10.18
49		Byggeperiode	ma 01.10.18	to 28.02.19
50		**Lås og automatikk**	**to 01.03.18**	**fr 05.04.19**
51		Byggeperiode	to 01.03.18	fr 05.04.19
52		**Elektrikerarbeider**	**fr 15.06.18**	**fr 05.04.19**
53		Byggeperiode	fr 15.06.18	fr 05.04.19
54		**SD-anlegg**	**ma 17.09.18**	**fr 03.05.19**
55		Byggeperiode 1	ma 17.09.18	fr 30.11.18
56		Byggeperiode 2	ma 04.03.19	fr 03.05.19
57		**Blikkenslagerarbeider**	**on 01.08.18**	**fr 21.12.18**
58		Byggeperiode	on 01.08.18	fr 21.12.18
59		**Heis**	**ma 01.10.18**	**fr 30.11.18**
60		Byggeperiode	ma 01.10.18	fr 30.11.18
61		**Branntetting**	**ti 02.01.18**	**to 28.02.19**
62		Byggeperiode	ti 02.01.18	to 28.02.19
63		**Fast innredning**	**fr 01.03.19**	**on 15.05.19**
64		Byggeperiode	fr 01.03.19	on 15.05.19
65		**Utomhusarbeider**	**ma 16.10.17**	**on 15.05.19**
66		Byggeperiode 1	ma 16.10.17	fr 30.03.18
67		Byggeperiode 2	on 01.08.18	fr 28.09.18
68		Byggeperiode 3	fr 01.03.19	on 15.05.19
69		**Overlevering**	to 16.05.19	to 16.05.19

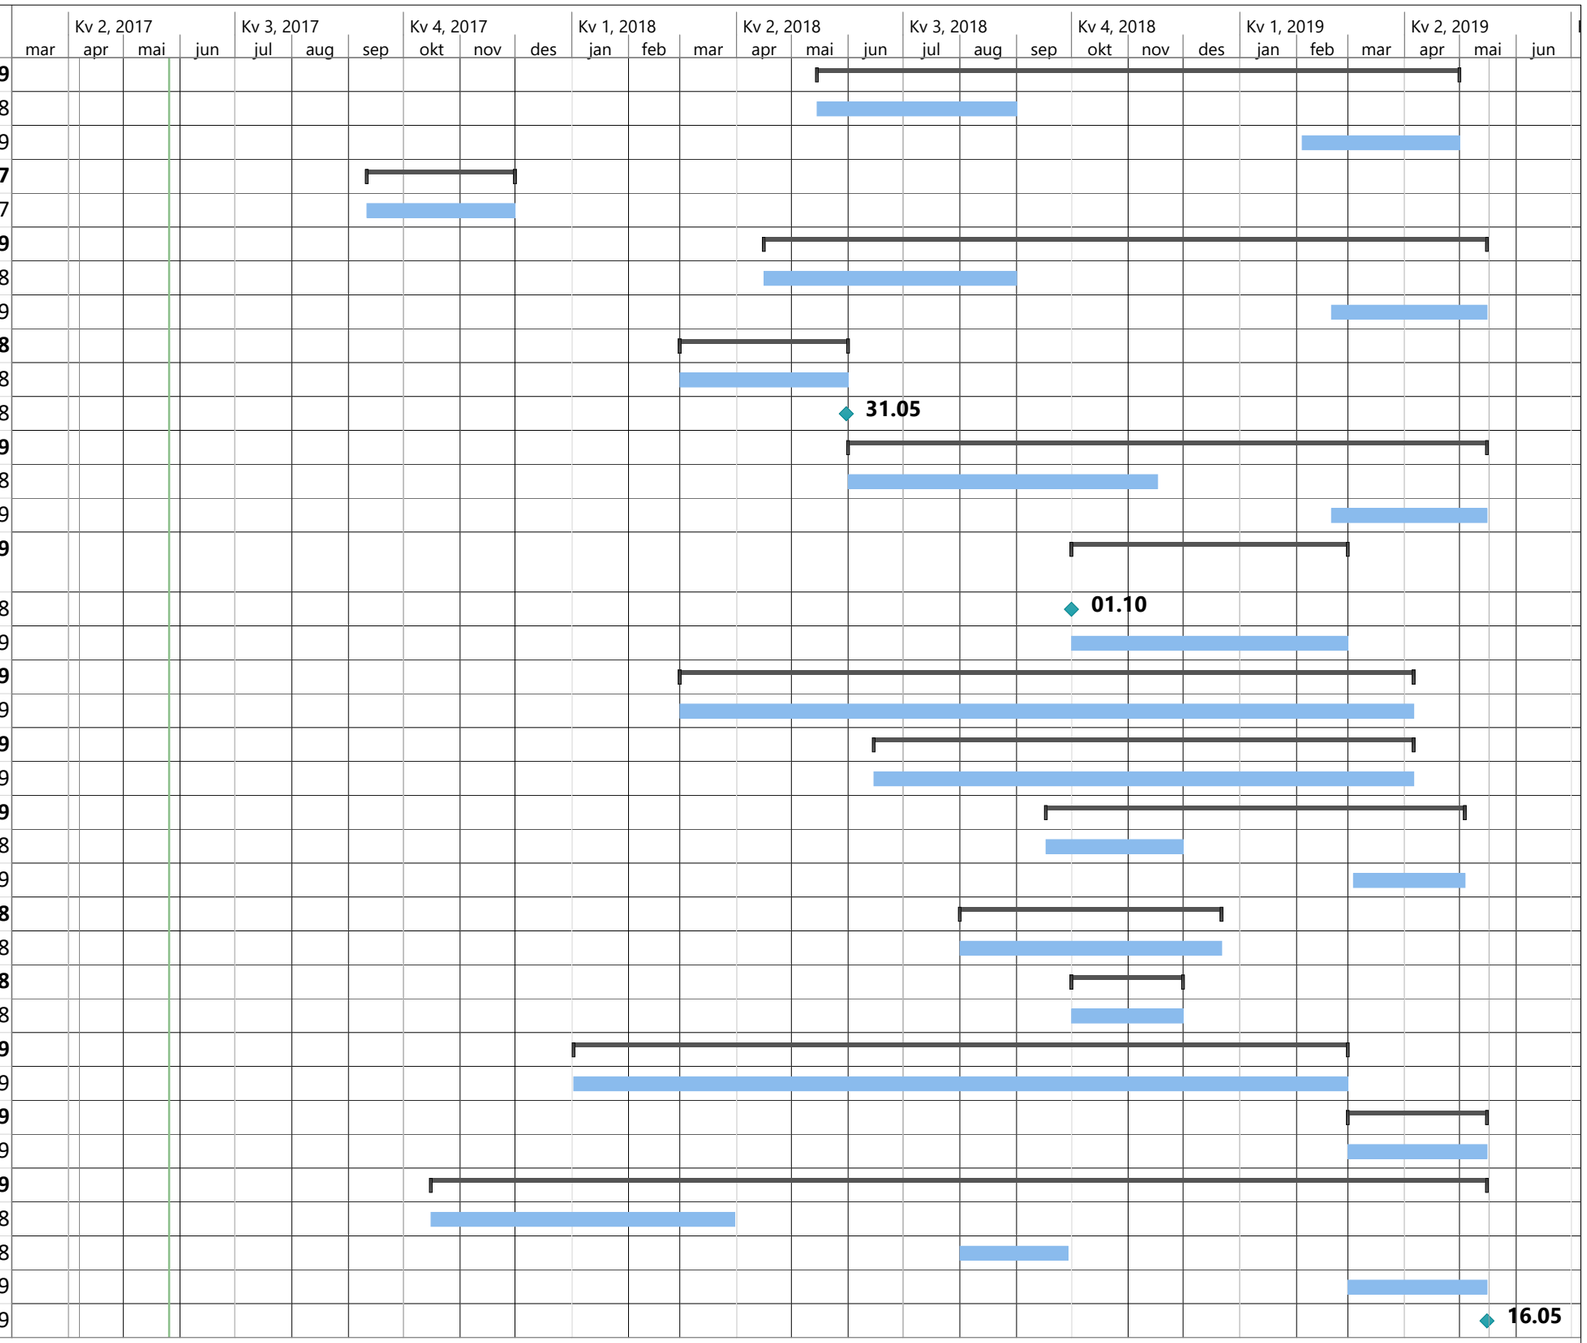

Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: fr 26.05.17

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
