ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
1		**Foreløpig fremdriftsplan**		
2				
3		**Superparken byggetrinn 1**	**ma 03.07.17**	**fr 28.06.19**
4		**Rigg og drift/permanent byggegjerde**	**ma 25.09.17**	**to 16.05.19**
5		Montering	ma 25.09.17	on 11.10.17
6		Demontering	ma 06.05.19	to 16.05.19
7		**Rivearb. inkl. midlert.byggegjerde**	**ma 03.07.17**	**fr 22.09.17**
8		Riveperiode Soppen (bygg B)	ma 03.07.17	ti 15.08.17
9		Soppen ferdig sannert	ti 15.08.17	ti 15.08.17
10		Riveperiode treet	ma 31.07.17	fr 22.09.17
11		**Energibrønner**	**ma 04.09.17**	**fr 26.01.18**
12		Brønnboring	ma 04.09.17	fr 01.12.17
13		Ferdigstillelse innenfor ringmur	ma 22.01.18	fr 26.01.18
14		**Grunn og fundamentarbeider, VA**	**ma 25.09.17**	**fr 16.03.18**
15		Oppstart graving / rensking	ma 25.09.17	fr 13.10.17
16		Utgraving byggegrop	ma 16.10.17	fr 10.11.17
17		Inntilfylling	ma 20.11.17	fr 22.12.17
18		Øvrige gravearbeider	fr 22.12.17	fr 16.03.18
19		**Betongarbeider ringmur /plate**	**ma 13.11.17**	**fr 01.06.18**
20		Ringmur, plat i grunn, radonduk	ma 13.11.17	fr 15.12.17
21		Stedstøpte vegger A-bygg	on 27.12.17	fr 09.02.18
22		Stedstøpte vegger B-bygg	on 27.12.17	fr 19.01.18
23		Sandwich elementer	ma 22.01.18	fr 02.02.18
24		Dekke over U-etg.	ma 15.01.18	fr 23.02.18
25		Øvrige betongarbeider	fr 23.02.18	fr 01.06.18
26		**Stålarbeider**	**ma 05.02.18**	**fr 02.03.18**
27		Søyler / dragere for hulldekke	ma 26.02.18	fr 02.03.18
28		Stål / gitterdragere idrettshall	ma 05.02.18	fr 16.02.18
29		Stålplatetak idrettshall	ma 19.02.18	fr 23.02.18
30		**Betongarbeider vegger /trapper**	**ma 29.01.18**	**fr 22.06.18**
31		Byggeperiode	ma 29.01.18	fr 22.06.18
32		**Betongelementer**	**ma 05.02.18**	**fr 27.04.18**

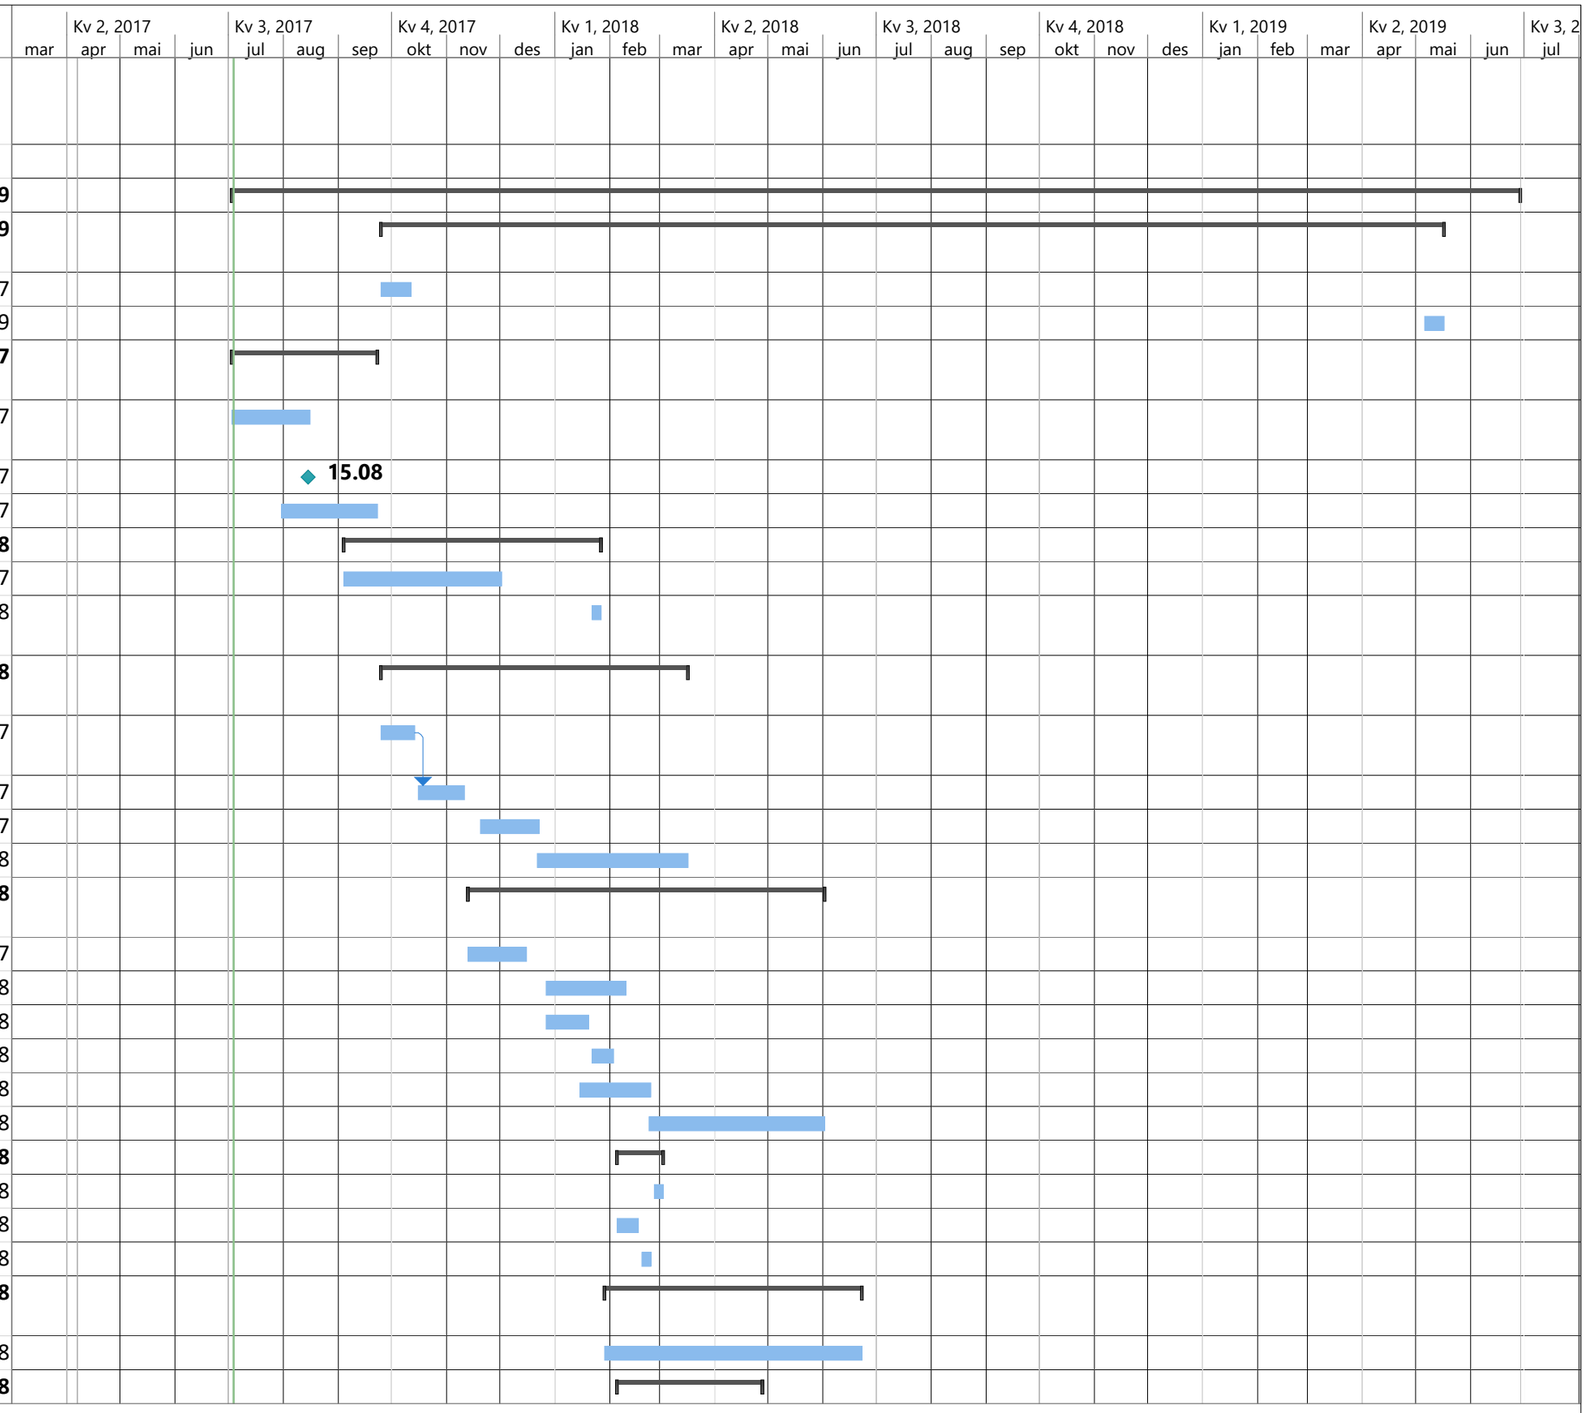

Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: ti 04.07.17

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
33		Byggeperiode	ma 05.02.18	fr 27.04.18
34		**Murerarbeider**	**ti 03.04.18**	**ti 14.08.18**
35		Byggeperiode	ti 03.04.18	ti 14.08.18
36		**Tømrerarbeider**	**ma 26.02.18**	**fr 28.06.19**
37		Klargjøring for taktekking idrettshall	ma 26.02.18	fr 02.03.18
38		Klargjøring for tatekking A-og B bygg	ma 30.04.18	fr 18.05.18
39		Montering yttervegg ferdig utv. Inkl. vinduer	ma 30.04.18	fr 01.06.18
40		Montering innv.vegger (reisverk	ma 30.04.18	fr 08.06.18
41		Montering platter yttervegger og innervegger	ma 18.06.18	fr 16.11.18
42		Montering systemhimling	ma 19.11.18	fr 15.02.19
43		Øvrige tømmerarbeider	fr 15.02.19	fr 28.06.19
44		**Snekkerarbeider**	**on 20.02.19**	**on 15.05.19**
45		Byggeperiode	on 20.02.19	on 15.05.19
46		**Sprinklerarbeider**	**ma 09.07.18**	**ti 30.04.19**
47		Byggeperiode 1	ma 09.07.18	fr 21.12.18
48		Byggeperiode 2	ma 04.02.19	ti 30.04.19
49		**Rørleggerarbeider i grunn**	**ma 20.11.17**	**on 15.05.19**
50		Bunnledninger	ma 20.11.17	fr 22.12.17
51		**Rørleggerarbeider innv.**	**fr 01.06.18**	**on 15.05.19**
52		Byggeperiode 1	fr 01.06.18	fr 16.11.18
53		Byggeperiode 2	on 20.02.19	on 15.05.19
54		**Ventilasjonsarbeider**	**ma 16.04.18**	**on 15.05.19**
55		Byggeperiode 1	ma 16.04.18	fr 31.08.18
56		Byggeperiode 2	on 20.02.19	on 15.05.19
57		**Taktekkerarbeider**	**ma 05.03.18**	**fr 08.06.18**
58		Idrettshall	ma 05.03.18	fr 16.03.18
59		vestibyle	ti 22.05.18	fr 01.06.18
60		Bygg B	ma 14.05.18	fr 25.05.18
61		Bygg A	ti 22.05.18	fr 08.06.18
62		Tett bygg	fr 08.06.18	fr 08.06.18
63		**Maler og gulvleggerarbeider**	**ma 01.10.18**	**to 28.02.19**
64		Klar for maler	ma 01.10.18	ma 01.10.18
65		Byggeperiode	ma 01.10.18	to 28.02.19
66		**Lås og beslag**	**ma 04.06.18**	**fr 07.06.19**
67		Byggeperiode	ma 04.06.18	fr 07.06.19
68		**Elektrikerarbeider**	**fr 15.06.18**	**fr 05.04.19**

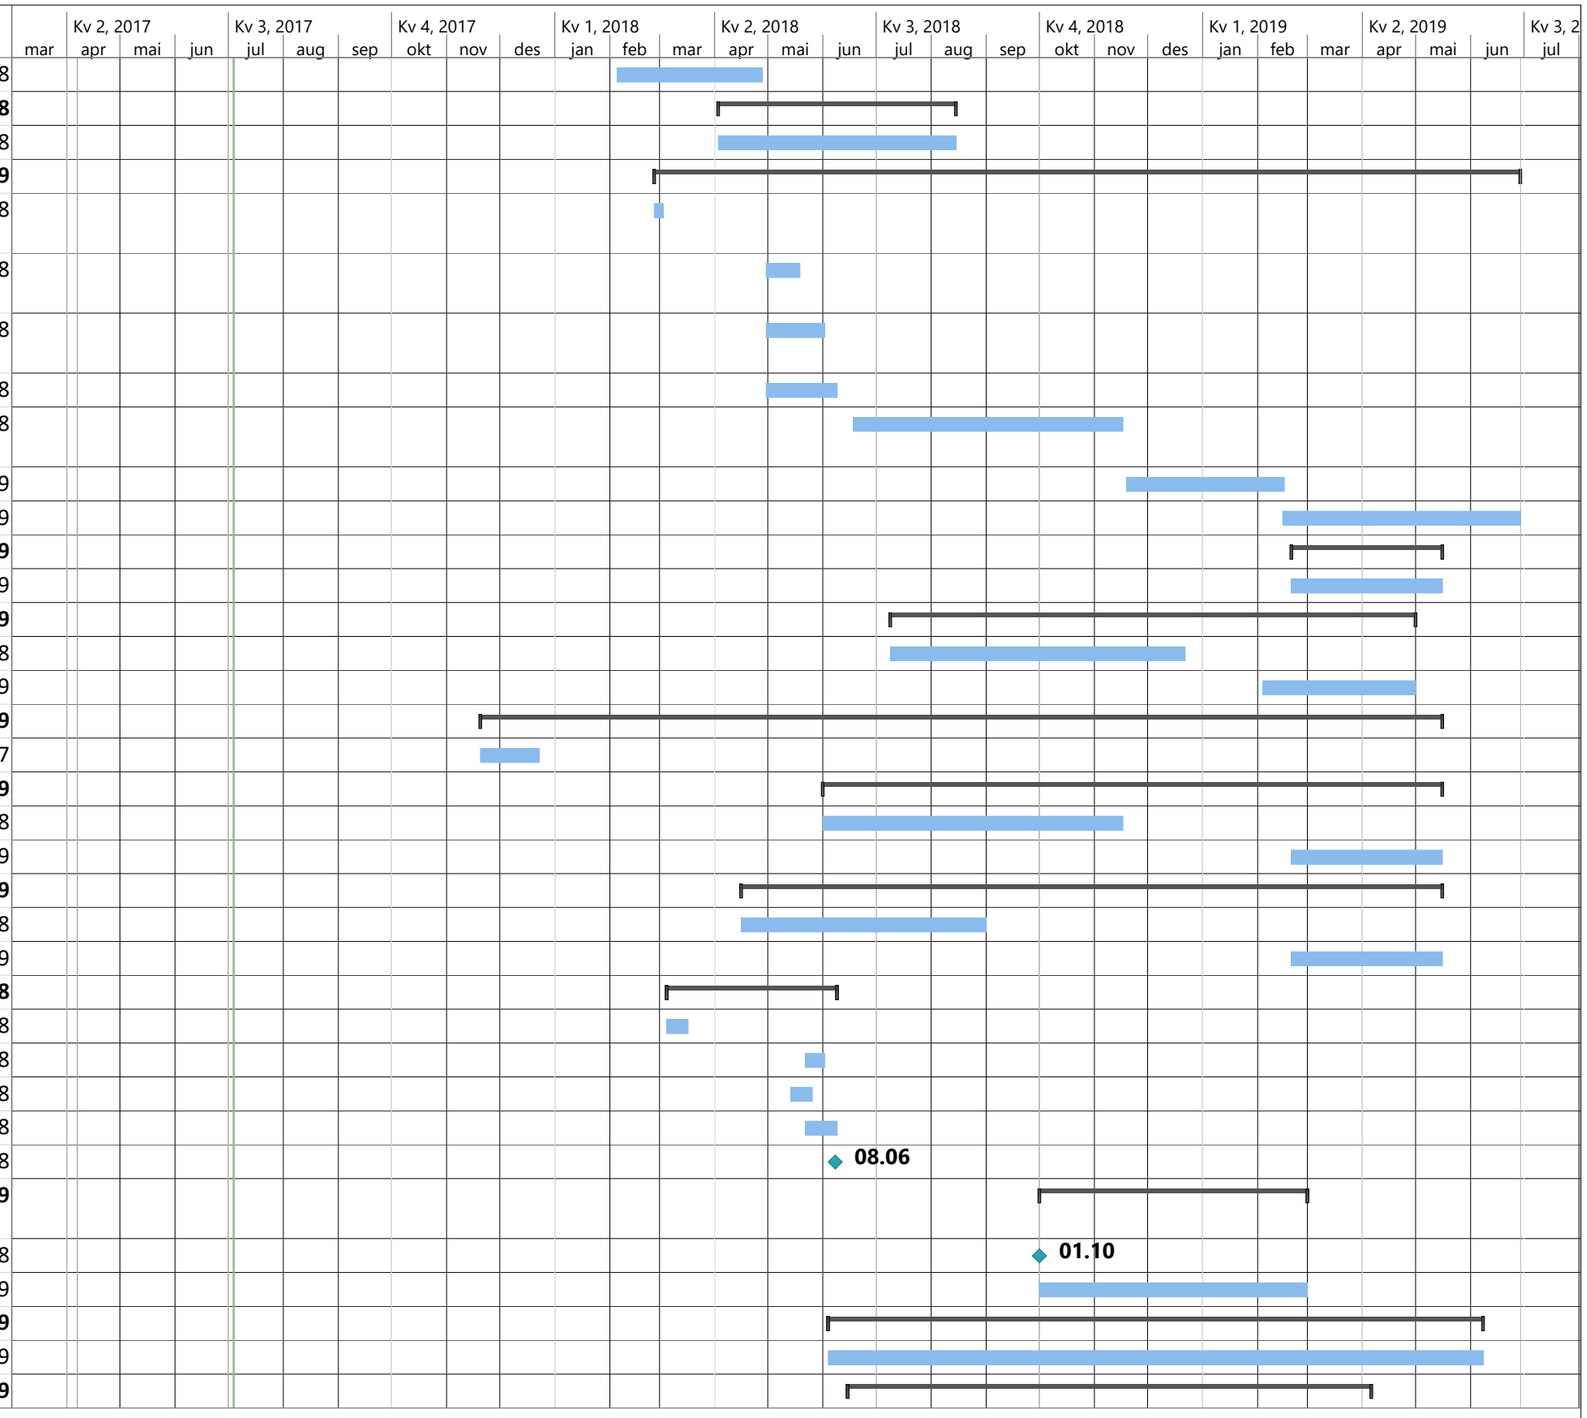

Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: ti 04.07.17

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
69		Byggeperiode	fr 15.06.18	fr 05.04.19
70		**SD-anlegg**	**ma 17.09.18**	**fr 03.05.19**
71		Byggeperiode 1	ma 17.09.18	fr 30.11.18
72		Byggeperiode 2	ma 04.03.19	fr 03.05.19
73		**Blikkenslagerarbeider**	**ma 30.04.18**	**fr 28.06.19**
74		Byggeperiode	ma 30.04.18	fr 28.06.19
75		**Heis**	**ma 01.10.18**	**fr 30.11.18**
76		Byggeperiode	ma 01.10.18	fr 30.11.18
77		**Branntetting**	**ti 02.01.18**	**to 28.02.19**
78		Byggeperiode	ti 02.01.18	to 28.02.19
79		**Fast innredning**	**fr 01.03.19**	**on 15.05.19**
80		Byggeperiode	fr 01.03.19	on 15.05.19
81		**Utomhusarbeider**	**ma 16.10.17**	**on 15.05.19**
82		Byggeperiode 1	ma 16.10.17	fr 30.03.18
83		Byggeperiode 2	on 01.08.18	fr 28.09.18
84		Byggeperiode 3	fr 01.03.19	on 15.05.19
85		**Overlevering**	to 16.05.19	to 16.05.19

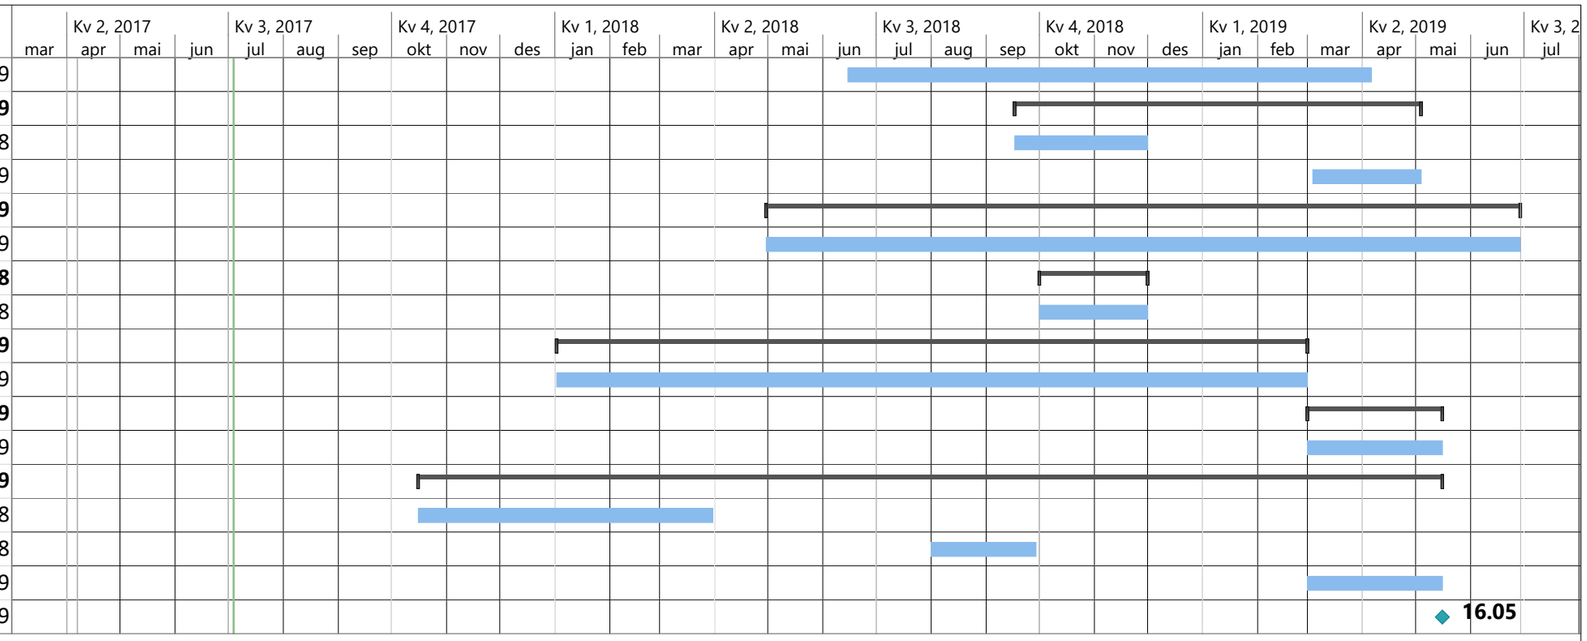

Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: ti 04.07.17

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
