ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Fo akt
0	**Holte skole nybygg og ombygging**	**on 16.11.16**	**to 15.08.19**	
1	**1 Tidligfase prosjektering**	**ma 02.01.17**	**lø 19.08.17**	
2	1.1 Prosjektstart bestilling	on 16.11.16	on 16.11.16	
3	1.2 Kontraktsinngåelse av arkitekt	ma 02.01.17	ma 02.01.17	
4	1.3 Skisseprosjekt	ma 02.01.17	ma 13.03.17	
5	1.4 Prosjektgranskning fase 1	ma 13.03.17	ma 13.03.17	4
6	1.5 Ajourført skisseprosjekt	ti 14.03.17	fr 14.04.17	5
7	1.6 Kostnadskalkyle	ma 15.05.17	ma 15.05.17	6
8	**2 Utarbeidelse av anbudsunderlag**	**ma 03.04.17**	**on 22.11.17**	
9	2.1 Totalentreprisegrunnlag	ti 14.03.17	on 12.07.17	5
10	2.2 Rammetillatelse	to 15.06.17	to 15.06.17	
11	2.3 Prosjektgranskning fase 2	ma 05.06.17	ma 05.06.17	
12	2.4 Ajourført hovedprosjekt med konkurransegrunnlag	ma 21.08.17	ma 21.08.17	11
13	2.5 Utlysning av totalentreprise	to 31.08.17	to 31.08.17	12
14	2.6 Kontraktsinngåelse av totalentreprise - bygg	on 01.11.17	on 01.11.17	13
15	**3 Byggefase**	**on 01.11.17**	**to 15.08.19**	
16	3.1 Prosjektering Entreprenør.	on 01.11.17	to 01.02.18	14
17	**4 Fløy D undervisning**	**ti 02.01.18**	**ma 13.08.18**	
18	4.1 Grunnarbeider fløy D	ti 02.01.18	to 01.02.18	
19	4.2 Byggearbeider fløy D	ma 05.02.18	ma 13.08.18	
20	4.3 Utomhus fløy D	ma 05.02.18	ma 13.08.18	
21	4.4 VVS fløy D	ma 05.02.18	ma 13.08.18	
22	4.5 Elektroarbeider	ma 05.02.18	ma 13.08.18	
23	**5 Fløy C undervisning**	**ma 18.06.18**	**fr 21.12.18**	
24	5.1 Byggearbeider fløy C	ma 18.06.18	fr 21.12.18	
25	5.2 Utomhus fløy C	ma 18.06.18	fr 21.12.18	
26	5.3 VVS fløy C	ma 18.06.18	fr 21.12.18	
27	5.4 Elektroarbeider	ma 18.06.18	fr 21.12.18	
28	**6 Fløy B undervisning**	**ti 02.01.18**	**to 15.08.19**	
29	6.1 Byggearbeider fløy B	on 02.01.19	to 01.08.19	
30	6.2 Utomhus fløy B	on 02.01.19	to 01.08.19	
31	6.3 VVS fløy B	on 02.01.19	to 01.08.19	
32	6.4 Elektroarbeider	on 02.01.19	to 01.08.19	
33	**6.5 Innvendig ombygging fløy A adm og gymsal**	**fr 15.06.18**	**fr 28.09.18**	
34	6.5.1 Ventilasjonsrom del A	fr 15.06.18	fr 28.09.18	
35	6.5.2 Innvendige arbeider, ventilasjon og bygg	fr 15.06.18	fr 28.09.18	
36	6.5.3 VVS	fr 15.06.18	fr 28.09.18	
37	6.5.4 Elektroarbeider	fr 15.06.18	fr 28.09.18	
38	**6.6 Utvidelse mat- og husstell**	**ma 13.05.19**	**to 15.08.19**	
39	6.6.1 Byggearbeider	ma 13.05.19	to 15.08.19	
40	6.6.2 VVS	ma 13.05.19	to 15.08.19	
41	6.6.3 Elektroarbeider	ma 13.05.19	to 15.08.19	
42	**6.7 Utomhus**	ti 02.01.18	to 15.08.19	

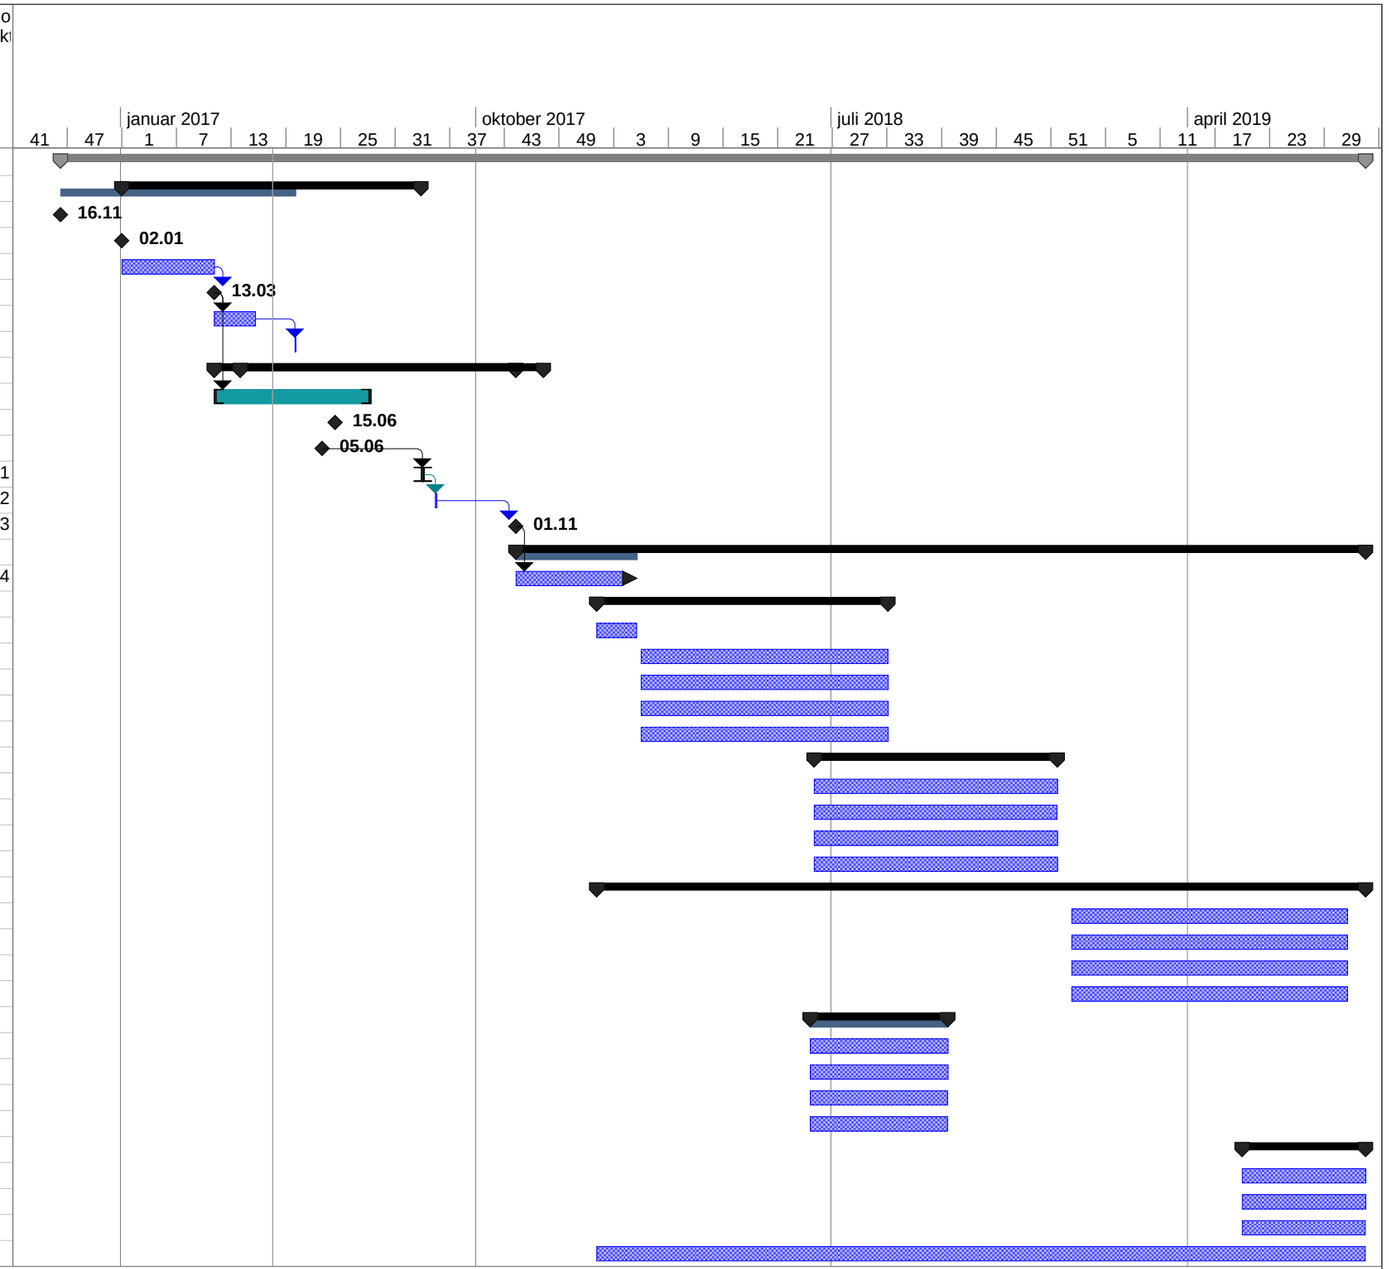

Prosjekt: Holte skole nybygg og o
Dato: fr 28.04.17

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Inaktivt sammendrag		Bare start	
Deling		Ekstern milepæl		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Tidsfrist	
Prosjektsammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
