ID	Aktivitetsn	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
0		**Rutebilstasjonen - overordnet plan 2017-11-20**	**296 dager**	**on 22.11.17**	**fr 22.02.19**
1		**Kontrahering**	**61 dager**	**on 22.11.17**	**to 22.02.18**
2		Anbudsutsendelse	0 dager	on 22.11.17	on 22.11.17
3		Regnetid	40 dager	on 22.11.17	on 24.01.18
4		Evaluering	10 dager	to 25.01.18	on 07.02.18
5		Intensjonserklæring	0 dager	on 07.02.18	on 07.02.18
6		Karensperiode (10 dager)	8 dager	to 08.02.18	ma 19.02.18
7		Kontrakt	3 dager	ti 20.02.18	to 22.02.18
8		**Planlegging**	**40 dager**	**fr 23.02.18**	**fr 27.04.18**
9		Prosjektering	40 dager	fr 23.02.18	fr 27.04.18
10		IG Grunnarbeider	20 dager	fr 09.03.18	fr 13.04.18
11		IG nytt bygg, utomhus og riving	20 dager	fr 23.03.18	fr 27.04.18
12		**Bygge- og anleggsvirksomhet**	**200 dager**	**ma 16.04.18**	**fr 15.02.19**
13		Grunnarbeider inkl. riving taxibu	15 dager	ma 16.04.18	fr 04.05.18
14		Bygging nybygg	120 dager	ma 07.05.18	fr 16.11.18
15		**Tett bygg**	0 dager	fr 29.06.18	fr 29.06.18
16		Utomhus eks. rivetomt/park	20 dager	ma 22.10.18	fr 16.11.18
17		Rivearbeider	30 dager	ma 10.12.18	fr 18.01.19
18		Opparbeidelse rivetomt/park	20 dager	ma 21.01.19	fr 15.02.19
19		**FDV**	**25 dager**	**ma 01.10.18**	**ma 05.11.18**
20		FDV innsendelse til godkjenning (eks. innmåling og "as-buildt")	0 dager	ma 01.10.18	ma 01.10.18
21		FDV til godkjenning av BH	10 dager	ma 01.10.18	ma 15.10.18
22		Innjusteringer tekniske anlegg	5 dager	ma 15.10.18	ma 22.10.18
23		FDV komplett m/samsvarserklæringer	10 dager	ma 22.10.18	ma 05.11.18
24		**Ferdigstillelse**	**80 dager**	**ma 05.11.18**	**fr 22.02.19**
25		Ferdigmelding nytt bygg	15 dager	ma 05.11.18	fr 23.11.18
26		Overtakelsesbefaringer	5 dager	ma 19.11.18	fr 23.11.18
27		**Overtakelse nytt bygg og utomhus**	0 dager	fr 23.11.18	fr 23.11.18
28		Innflytting og idriftsettelse nytt bygg	10 dager	ma 26.11.18	fr 07.12.18
29		Ferdigmelding park	15 dager	ma 04.02.19	fr 22.02.19
30		Overtakelsesbefaringer	5 dager	ma 18.02.19	fr 22.02.19
31		**Overtakelse park**	0 dager	fr 22.02.19	fr 22.02.19
32		Sluttfaktura kan sendes	0 dager	fr 22.02.19	fr 22.02.19
33		Start prøveperiode	0 dager	fr 22.02.19	fr 22.02.19

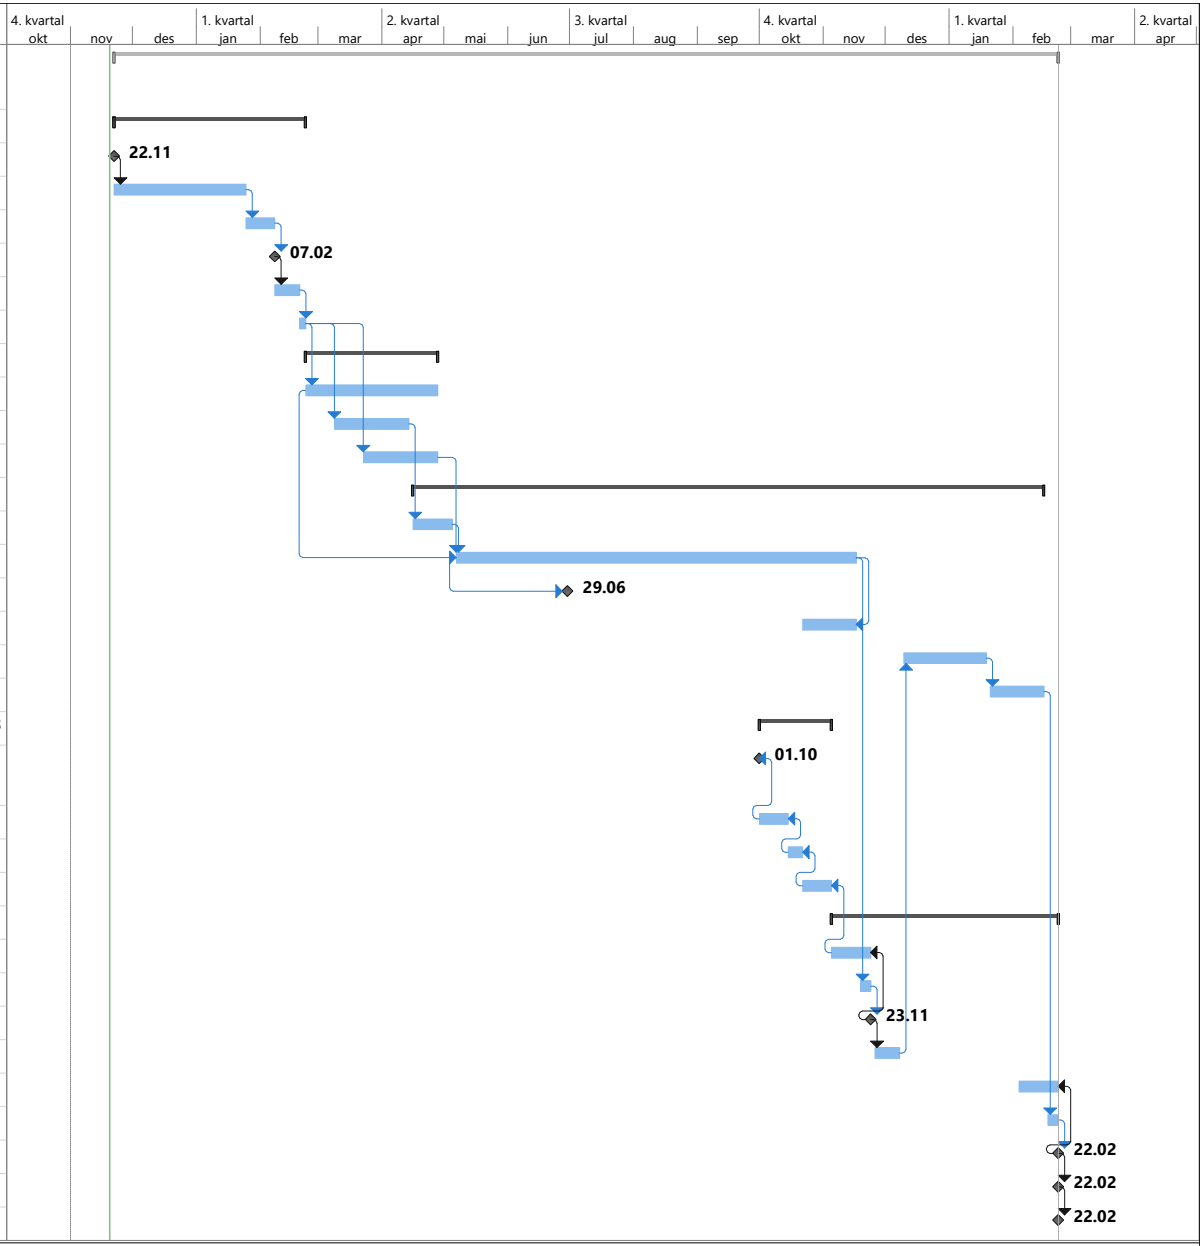

Prosjekt: Rutebilstasjonen - ove
Dato: ma 20.11.17

Aktivitet	Prosjektsammendrag	Manuell aktivitet	Bare start	Tidsfrist
Deling	Inaktiv aktivitet	Bare varighet	Bare slutt	Fremdrift
Milepæl	Inaktiv milepæl	Manuell sammendragsfremheving	Eksterne aktiviteter	Manuell fremdrift
Sammendrag	Inaktivt sammendrag	Manuelt sammendrag	Ekstern milepæl	
