K260 FELLESBYGGET

Plan A : ØNSKET FRAMDRIFTSPLAN

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1	**Kontrahering av TE**	**122 dager**	**fr 16.03.18**	**ma 03.09.18**
2	Statsbygg - Klargjøring av dokumenter for tilbudskonkurranse totalentreprise.	6 dager	fr 16.03.18	fr 23.03.18
3	Tilbudskonkurranse	45 dager	ma 26.03.18	fr 25.05.18
4	Riving av Verkstedsbygget - Forutsetter at dette utføres før TE kommer på plass.	20 dager	on 01.08.18	ti 28.08.18
5	Vurdering av mottatte tilbud	50 dager	ma 28.05.18	fr 03.08.18
6	Klagefrist 10 dager ift tilbudskonkurranse	21 dager	ma 06.08.18	ma 03.09.18
7	Kontrakt TE	0 dager	ma 03.09.18	ma 03.09.18
8	**Gjennomføringsfase**	**389 dager**	**ti 04.09.18**	**fr 28.02.20**
9	Detaljprosjektering Grunn og fundamenter	42 dager	ti 04.09.18	on 31.10.18
10	IG - Grunn og fundamenter	20 dager	to 01.11.18	on 28.11.18
11	Grunnarbeider og betongarbeider	120 dager	to 29.11.18	on 15.05.19
12	TE - Detaljprosjektering Bygg	100 dager	ti 04.09.18	ma 21.01.19
13	IG - Bygg	20 dager	ti 22.01.19	ma 18.02.19
14	Råbygg	70 dager	ti 19.02.19	ma 27.05.19
15	Tett-bygg-arbeider	60 dager	ti 28.05.19	ma 19.08.19
16	**Tett bygg**	0 dager	ma 22.07.19	ma 22.07.19
17	Innredning og tekniske anlegg	160 dager	ma 22.07.19	fr 28.02.20
18	**Sluttfase / Testing**	**131 dager**	**fr 01.11.19**	**fr 01.05.20**
19	TE oversender testplaner til Statsbygg for godkjennelse (MC - 4 mnd)	0 dager	fr 01.11.19	fr 01.11.19
20	**Mekanisk Ferdigstillelse (MC)**	0 dager	fr 28.02.20	fr 28.02.20
21	Systemtester	25 dager	ma 02.03.20	fr 03.04.20
22	Byggherrens tester	20 dager	ma 06.04.20	fr 01.05.20
23	**Oppstart prøvedrift**	**0 dager**	**fr 01.05.20**	**fr 01.05.20**
24	12 mnd. Prøvedrift	262 dager	fr 01.05.20	ma 03.05.21
25	**Teknisk overtakelse**	0 dager	ma 03.05.21	ma 03.05.21

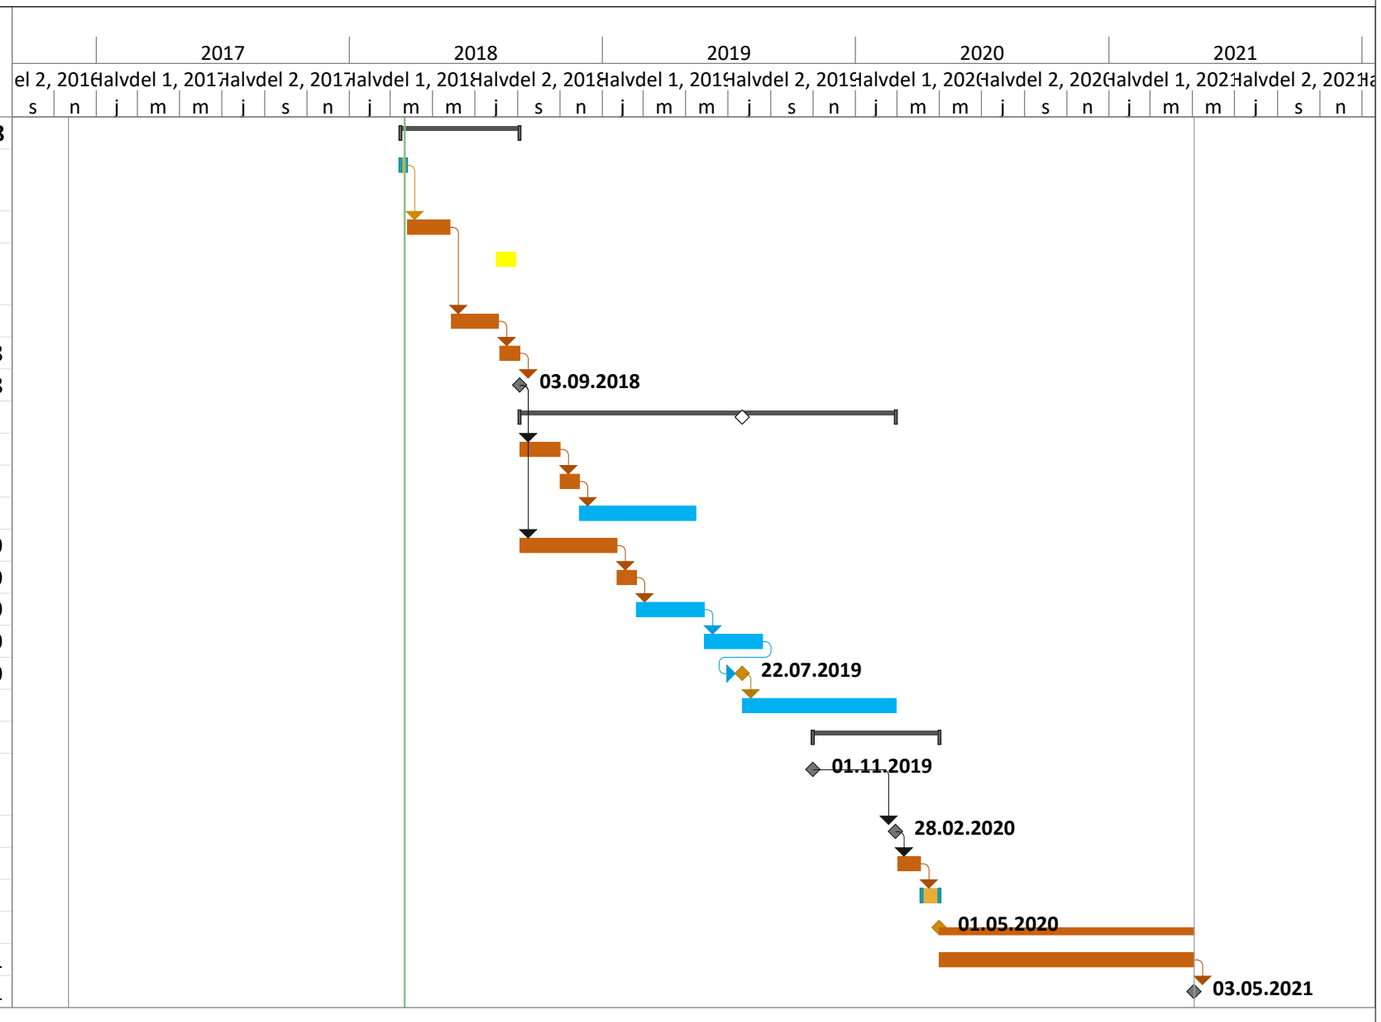

Prosjekt: K260 Fellesbygg - Tentat
Dato: to 22.03.18

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			
