1127001 - NHH Rehabilitering av hovedbygget

Byggeledelse - ressursestimat

18.10.2018 - Egil Instefjord

Hovedframdriftsplan pr 09.06.2017

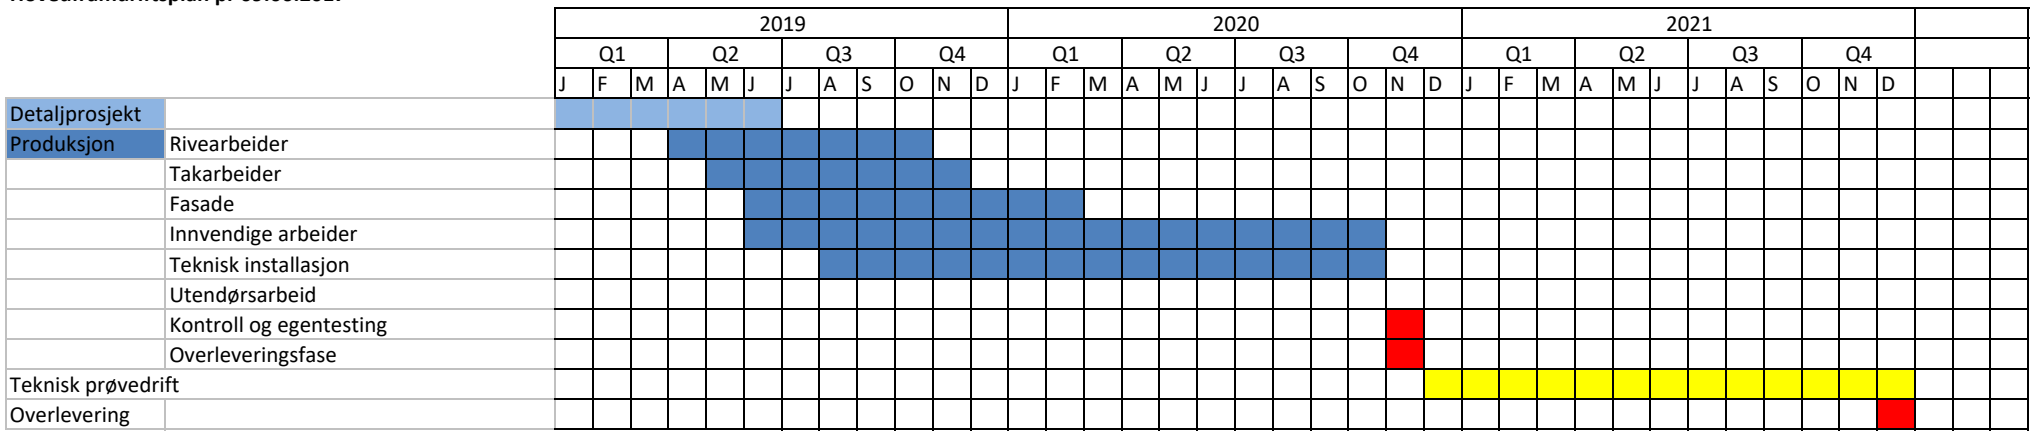

Ressursestimat byggeledelse (angitt som %)

		2019												2020												2021												2022		
		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1		
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
H-BHO	Ansvarlig byggherreombud	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
BHO-1	Teknisk byggherreombud #1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	40	20	20	20	20	20	20	20	20				
BHO-2	Teknisk byggherreombud #2																100	100	100	100	100	100	100	100																
		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300	200	120	80	40	40	40	40	40	40	40	40	20	0		
