

Melhus kirkelige fellestråd

Melhus Kirke – Rehabilitering av tak

Utførelsesentreprise

2. TILBUDSSKJEMA

19.04.2022

Tilbud fra:	
--------------------	--

INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	2
1. HOVEDSAMMENDRAG	3
1.1. Tilbyder og tilbudssum	3
1.2. Forbehold.....	3
2. TILBUDSSUMMER, HOVEDKAPITLER	3
3. LEVERANSE	4
5. REGULERINGER AV KONTRAKTSSUMMEN	4
5. REGNINGSARBEIDER OG ENHETSPRISER	4
6. RIGG	5
7. FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSER	7
8. SAMARBEIDSPARTNERE	7
9. KOMPLETT TILBUD	7
10. UNDERSKRIFTER	7

1. HOVEDSAMMENDRAG

1.1. Tilbyder og tilbudssum

I henhold til komplett tilbudsmateriale slik det er definert i konkurransebestemmelsene tilbyr

Firmaets navn:	
----------------	--

å bistå med utførelse av beskrevne arbeider ved Melhus kirke

GJELDER	BELØP
Tilbudssum eks. mva. overført fra pkt 2:	NOK
+ 25 % mva.:	NOK
Tilbudssum inkl. mva.:	NOK

Ti

Ibudet vedstås i 90 kalenderdager.

1.2. Forbehold

Dette punkt skal krysses ut av tilbyderen, og antallet på eventuelle forbehold skal oppgis. Forbeholdene skal gjentas og beskrives i tilbudsbrevet.

PKT.	KRYSS AV:	ANTALL FORBEHOLD	
1.2.1		INGEN	Det tas ingen forbehold
1.2.2			stk Forbehold tas, og angis i tilbudsbrev i nummerert rekkefølge

2. TILBUDSSUMMER, HOVEDKAPITLER

DEL	GJELDER	BELØP EKS MVA
2.1	01. Rigg og drift	
2.2	02.1 Renner og nedløp	
2.3	02.2 Beslag	
2.4	02.3 Taktekking	
2.5	Regningsarbeider, overført fra pkt 5 nedenfor	
Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 1.1. over)		

En eventuell kontrakt vil bli inngått uten pkt 2.5 som grunnlag for kontraktssum. Aktivisering av eventuelle endringer og tillegg som er omtalt, vil skje med de priser som er tilbudt i pkt 5 nedenfor, kfr pkt 2.5 over.

3. LEVERANSE

Arbeidet omfatter takarbeider iht. beskrivelse.

Byggherren sørger for nødvendige offentlige tillatelser, men entreprenøren skal inkludere nødvendige bidrag knyttet til egne arbeider i sitt tilbud.

5. REGULERINGER AV KONTRAKTSSUMMEN

Denne delen av prosjektet er av kort varighet og det er ikke aktuelt å regulere prisene som følge lønns- og prisendringer. Prisene er således faste.

5. REGNINGSARBEIDER OG ENHETSPRISER

Det kan bli aktuelt med regningsarbeider i ulikt omfang. Byggherren kan bestille slike hos entreprenøren etter retningslinjer gitt i NS 8405 og entreprenøren skal angi priser for slike arbeider. Prisene er faste og reguleres ikke i kontraktstiden.

Satsene gjelder regningsarbeider inklusive selvkost, indirekte kostnader, administrasjon, risiko og fortjeneste, oppgitt som netto for byggherre. Alle beløp oppgis per arbeidstime eks. mva. Generelt rigg- og driftspåslag skal være inkludert i nedenstående satser. Dersom entreprenøren mener seg berettiget til spesielle tillegg for rigg og drift knyttet til det enkelte definerte regningsarbeidet, skal det spesifiseres og dokumenteres for at godtgjørelse av det skal kunne vurderes og eventuelt godkjennes.

KATEGORI		FAGARBEIDER	
A	Takarbeider		
B	Tømrer		
KATEGORI		LÆRLING	
C	Lærling		
KATEGORI		BAS	
L	Ledelse		
KATEGORI		SENIOR MEDARBEIDER	MEDARBEIDER
PL	Prosjektledelse, administrativ støtte		
M	Påslagsprosent materialer. Påslaget skal legges på dokumentert netto kostnad for entreprenøren		%

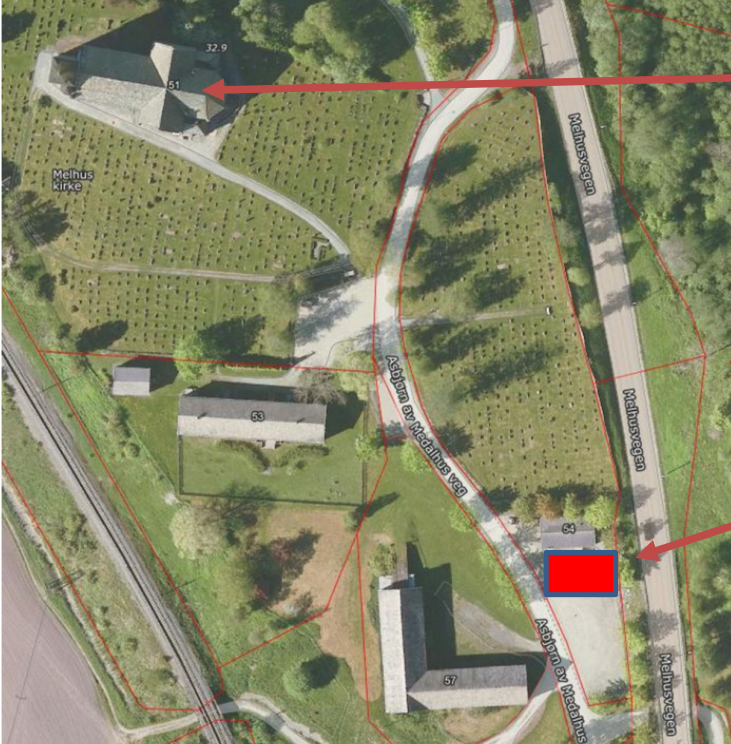
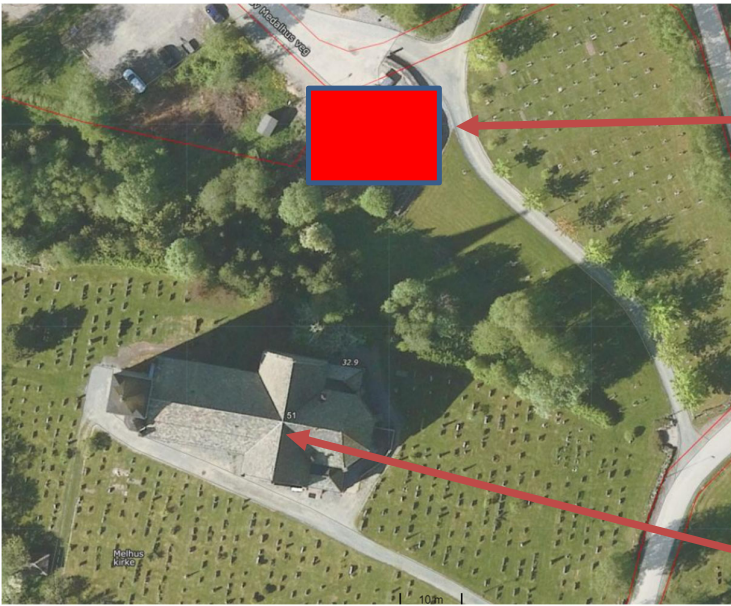
Priskonsekvenser av eventuelle regningsarbeider skal inngå i vurderingen av tilbud som mottas og regnes inn med beløp som angitt nedenfor. Summen føres til sammendrag i pkt 2.6 over.

NR	FAG/PRISELEMENT	MENGDE	SATS	BELØP
NORMAL ARBEIDSTID				
5.1	Regningsarbeider kategori A	150 timer		
5.2	Regningsarbeider kategori B	100 timer		
5.3	Regningsarbeider kategori C	100 timer		
5.4	Regningsarbeider kategori L	100 timer		
5.5	Regningsarbeider kategori PL	100 timer		
ARBEIDSTID UTENFOR NORMALTID				
5.5	Regningsarbeider kategori A	150 timer		
5.6	Regningsarbeider kategori B	100 timer		
5.7	Regningsarbeider kategori C	100 timer		
5.8	Regningsarbeider kategori L	100 timer		
5.9	Regningsarbeider kategori PL	100 timer		
PÅSLAG MATERIALER				
6.0	Påslag materialer kategori M. Selve påslaget angis, ikke grunnlaget	300 000 NOK		
Sum eks. mva, overføres til pkt 2.6 over				

6. RIGG

Det er begrenset med riggplass ved Melhus kirke. Oversikten nedenfor viser områder hvor entreprenørens rigg kan etableres. Det vil være lite plass for lagring av materielle så dette bør tilføres byggeplassen etter behov. Lagring kan være mulig på stillaset hvis entreprenøren til rette legger for dette.

Byggherren vil tilrettelegge for bruk av toalett i eksisterende driftsbygning. Entreprenøren må selv stå for renhold av dette. I tillegg må entreprenøren besørge nødvendig Lomp, spiserom, kjøkken og kontor. Dette må ha en slik kapasitet at byggemøter kan avholdes.

KARTUTSNITT (Flyfoto)	ANMERKINGER
	<ul style="list-style-type: none"> - Melhus kirke - Plassering for lomp, spise-rom og kontorer
	<ul style="list-style-type: none"> - Riggområde; Lagring og rengjøring av skifer. - Melhus kirke

7. FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSER

Tilbyder er forsikret i forsikringsselskap og vil stille få stillet kausjonsgaranti i følgende selskaper:

Forsikringer i henhold til NS 8405 punkt 10 stilles av:	
Sikkerhetsstillelser i henhold til NS 8405 punkt 9 vil bli stillet av:	

Dersom kontrakt inngås, skal tilbyder legge frem attester på at forsikringer er tegnet og bekreftelse fra garantistiller på at de vil stille garanti for kontraktsarbeidene i henhold til NS 8405 punkt 9 og 10. Byggherren stiller ikke garanti.

8. SAMARBEIDSPARTNERE

Samarbeidspartnere som tilbyder har planlagt å benytte prosjektet.

FAGOMRÅDE OG LEVERANSE	FIRMANAVN, ADRESSE OG KONTAKTINFORMASJON

9. KOMPLETT TILBUD

Tilbudet anses ikke komplett med mindre alle punkter i tilbudsskjemaet og mengdefortegnelsen er utfylt.

10. UNDERSKRIFTER

Undertegnede tilbyder erklærer å ha gjennomgått tilbudsdokumentene og kontrollert at prisgrunnlaget er fullstendig.

Tilbyders underskrift:	Sted:		Dato:	
	_____ Forpliktende underskrift			

Kontaktperson for oppfølging av inngitt tilbud:

Navn:	
E-post:	
Mobil/Dir. tlf.	
